



التقرير السنوي

لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا 2018-2023

برسم سنة 2020

التصميم

3	تقديم
4	الإطار المرجعي:
5	منظومة التقييم:
9	منهجية تتبع تقييم برنامج العمل:
11	الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة
24	تقدّم تنفيذ البرنامج
24	المحور الأول: المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والتنمية المستدامة
44	المحور الثاني: تثمين تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة الحقيقة
57	المحور الثالث : التشجيع السياحي والاقتصادي ودعم الاستثمار
63	المحور الرابع: التنمية الثقافية والرياضية ودعم التماستك الاجتماعي
80	المحور الخامس: المشاريع المهيكلة
84	المحور السادس: التدبير الجماعي
91	خلاصة تقدّم تنفيذ مشاريع برنامج عمل جماعة سلا 2018 - 2023
93	الموارد المالية المعنية:
95	الإكراهات:
96	خاتمة

بنهاية سنة 2020 يكون برنامج عمل جماعة سلا 2018 – 2023 أكمل سنته الثانية، في ظل تداعياتجائحة كورونا كوفيد 19 المستجد التي اجتاحت العالم وضمنها المغرب الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية يوم 19 مارس 2020 بموجب مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها، وما صاحبها من اجراءات فرض الحجر الصحي والحد من تحركات المواطنين وتوقف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ظهور فيروس كورونا جعل كل الجهات من قطاعات حكومية وجماعات ترابية تركز على مواجهة تداعيات الوباء والحد من انتشاره من خلال بذل مجهودات كبيرة في قطاع الصحة العمومية وتأمين استغلال المرافق العمومية الضرورية لعيش المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وتميزت سنة 2020 بوضعية خاصة بالنسبة لميزانية الجماعة، فإضافة إلى تداعيات الجائحة على مداخيل الجماعة بسبب حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي وما ترتب عنه من توقف كلي أو جزئي لأنشطة الاقتصادية وخاصة تلك الخاضعة للرسوم الجبائية المحلية، أثرت بعض النفقات الإجبارية خاصة الديون والأحكام القضائية على ميزانية السنة.

كما أن ظروف الجائحة أثرت بشكل سلبي على قدرة الجماعة على الترافع مع الشركاء والفاعلين لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع، إضافة إلى صدور دورية وزارية دعت إلى تدبير أمثل لنفقات الجماعات وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية تماشيا مع الاجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الدعوة إلى تأجيل تنفيذ مشاريع الهيئة الحضرية والأنارة العمومية والمساحات الخضراء التي لم تنطلق بعد. مع الحرص على إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي قيد الانجاز أو المبرمة في إطار اتفاقيات و اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وقد استحضرت جماعة سلا كل هذه المعطيات في سعيها لتنفيذ برنامج عملها حيث التزمت بالعمل على مواصلة المشاريع التي انطلقت قبل الجائحة، كما قامت بتحويل مساهمتها المالية السنوية بخصوص الاتفاقية المتعلقة بتأهيل المدينة العتيقة والبالغة 14 مليون درهم إلى شركة التنمية المحلية الرباط الجهة للتبيئة لضمان استمرارية إنجاز المشاريع المبرمجة في سنة 2020 بالمدينة العتيقة.



وتتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة تميزت بانخراط جماعة سلا في برنامج دعم الجماعات في تحسين أدائها الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات المحلية بتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية والبنك الدولي، يمتد لمرة خمس سنوات 2019 - 2023. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحكامة الجيدة في الجماعات وضمان انخراطها في منطق تطبيع النجاعة والفعالية في الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وللفاعلين الاقتصاديين من جهة، وتمكن رؤساء مجالس الجماعات المعنية من لوحة لقيادة خاصة ب المجالاتصلاحياتهم، وتمكن الجماعات المستجيبة للشروط من دعم مالي. وقد تمكنت الجماعة من الحصول على دعم مالي قارب 9 ملايين درهم خصص جزء منه لتهيئة المكتب الجماعي لحفظ الصحة في إطار مجهودات الجماعة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، وخصص الجزء الثاني لتطوير نظام المعلومات. كما احتلت جماعة سلا الرتبة الأولى في تصنيف أعدته مؤسسة طفرة في مجال تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات والنشر الاستيفائي لها، التصنيف شمل 81 جماعة كبرى من حيث عدد الساكنة في المغرب.

الإطار المرجعي:

يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية التي تهدف إلى توفير خدمات القرب للمواطنات والمواطنين. وقد حددت مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة لمدة ست سنوات ، وتتبعه وتحيئنه وكذا تقييمه، ويشرف رئيس الجماعة على هذه المسطرة خلال كل مراحلها.

كما أن القانون التنظيمي للجماعات نص في مادته 272 على أن الجماعة تقوم تحت إشراف رئيسها ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتراض والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها.

وعملًا بالمادتين 14 و15 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيئنه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده المشار إليه أعلاه، تم إعداد التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة برسم سنة 2020، يتضمن بيانات حول:

-نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج:



الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والإكراهات والصعوبات التي اعترضت إنجازها، مع اقتراح بعض الحلول الكفيلة بتجاوزها.

منظومة التقسيط:

تهدف منظومة التقسيط إلى توضيح وتحديد النسب المئوية المخصصة لكل مرحلة من مراحل المشروع بغرض التمكن من التعرف على نسب تقدم الإنجاز، وتم تحديدها حسب نوعية المشروع وطبيعة المتدخلين فيه، وهي مقسمة كالتالي:

- المشاريع المبرمجة في إطار شراكة وتستدعي تسوية الوعاء العقاري؛
- المشاريع المبرمجة في إطار شراكة ولا تستدعي تسوية الوعاء العقاري؛
- المشاريع الذاتية وتستدعي تسوية الوعاء العقاري؛
- المشاريع الذاتية ولا تستدعي تسوية الوعاء العقاري؛
- مشاريع الدراسات والاقتناءات.

بالنسبة للمشاريع المبرمجة في إطار شراكة وتستدعي تسوية الوعاء العقاري:

- | | |
|-----|--------------------------|
| 10% | التصديق على الاتفاقيات |
| 20% | تسوية الوعاء العقاري |
| 30% | القيام بالدراسات التقنية |
| 40% | إنجاز الأشغال |

ويتم احتساب النسب المذكورة كالتالي:

- | | |
|-----|---|
| 10% | التصديق على الاتفاقيات: |
| 5% | - مرحلة الترافع والتفاوض على المشروع |
| 5% | - موافقة المجلس الجماعي وتوقيع الاتفاقيات |



- **تسوية الوعاء العقاري:**
 - تحديد التخصيص العمراني للعقار وإنجاز المسح الطبوغرافي
 - مصادقة المجلس الجماعي على المقرر الخاص بتبينة العقار
 - اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي
 - التعاقد على تبينة العقار
- **القيام بالدراسات التقنية:**
 - البطاقة التقنية والتشخيص التقني
 - إجراء الدراسات
 - إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العروض العمومي للأشغال
- **إنجاز الأشغال:**
 - بداية الأشغال
 - إنجاز 50% من الأشغال
 - التسلم المؤقت للأشغال
 - التسلم النهائي للأشغال

بالنسبة للمشاريع المبرمجة في إطار شراكة ولا تستدعي تسوية الوعاء العقاري:

- التصديق على الاتفاقيات
- القيام بالدراسات التقنية
- إنجاز الأشغال

ويتم احتساب النسب المذكورة كالتالي:

- **التصديق على الاتفاقيات:**
 - مرحلة الترافع والتفاوض على المشروع
 - موافقة المجلس الجماعي وتوقيع الاتفاقية



- القيام بالدراسات التقنية:
 - البطاقة التقنية والتشخيص التقني
 - إجراء الدراسات
 - إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العروض العمومي للأشغال

- إنجاز الأشغال:
 - بداية الأشغال
 - إنجاز 50% من الأشغال
 - التسلم المؤقت للأشغال
 - التسلم النهائي للأشغال

بالنسبة للمشاريع الذاتية والتي تستدعي تسوية الوعاء العقاري:

- تسوية الوعاء العقاري
- القيام بالدراسات التقنية
- إنجاز الأشغال

ويتم احتساب النسب المذكورة كالتالي:

- تسوية الوعاء العقاري:
 - تحديد التخصيص العمراني للعقار وإنجاز المسح الطبوغرافي
 - مصادقة المجلس الجماعي على المقرر الخاص بتعبيئة العقار
 - اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي
 - التعاقد على تعبيئة العقار

- القيام بالدراسات التقنية:
 - البطاقة التقنية والتشخيص التقني



20%	- إجراء الدراسات
10%	- إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العروض العمومي للأشغال
40%	• إنجاز الأشغال:
10%	- بداية الأشغال
10%	- إنجاز 50% من الأشغال
15%	- التسلم المؤقت للأشغال
5%	- التسلم النهائي للأشغال

بالنسبة للمشاريع الذاتية التي لا تستدعي تسوية الوعاء العقاري:

40%	• القيام بالدراسات التقنية
60%	• إنجاز الأشغال

ويتم احتساب النسب المذكورة كالتالي:

40%	• القيام بالدراسات التقنية:
10%	- البطاقة التقنية والتشخيص التقني
20%	- إجراء الدراسات
10%	- إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العروض العمومي للأشغال

60%	• إنجاز الأشغال:
15%	- بداية الأشغال

إنجاز 50% من الأشغال -



20%	- التسلم المؤقت للأشغال
10%	- التسلم النهائي للأشغال

بالنسبة لمشاريع الدراسات والمشتريات:

40%	• إعداد البطاقات التقنية والتشخيص
60%	• إنجاز الدراسة أو تسلم المشتريات

منهجية تتبع تقييم برنامج العمل :

حرصاً من رئيس المجلس الجماعي لسلا على حسن تنفيذ برنامج عمل الجماعة وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحييشه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده، تم إعداد التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة لسنة 2020. حيث عقدت مجموعة من اللقاءات الإعدادية مع المصالح الجماعية المعنية بالتتبع التقني والإداري للمشاريع المدرجة في البرنامج، والمكلفين بتتبعه على مستوى مجالس المقاطعات، تم من خلالها متابعة نسبة إنجاز الأشغال وجمع المعلومات حول تقدم الإنجاز ورصد أهم الإكراهات التي تعترض إنجاز البعض منها. كما تم التواصل مع مجموعة من المصالح اللامركزية المعنية بإنجاز مجموعة من المشاريع المسطرة في برنامج العمل. وارتكتز عملية التقييم على منظومة التنقيط التي تم اعتمادها لسنة 2019 والتي تحدد نسبة معينة لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع.

عرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا على مكتب المجلس بتاريخ 06 أبريل 2021، والذي تدارسه وأبدى مجموعة من الملاحظات حول سير بعض المشاريع وتقديمها.

وفي إطار ترسیخ آليات التشاور والمقاربة التشارکية تم عقد اجتماع للهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بتاريخ 09 أبريل 2021 لعرض التقرير ومدارسته بمقر الجماعة "باب بوحاجة" بحضور السيد رئيس المجلس الجماعي، الذي قدم للسادة أعضاء الهيئة عرضاً أبرز فيه المشاريع التي



أنجزت أو شرع في إنجازها أو انطلقت دراستها بالنسبة لكل محور من المحاور الست المكونة للبرنامج ونسب تقدمها وفقاً لمنظومة التنقيط المعتمدة، وبعض الإكراهات التي اعترضت تنفيذ بعض المشاريع. وقد عبر السادة أعضاء الهيئة على أهمية هذه المحطة في تقييم تنفيذ البرنامج وتقاسم المعطيات المتعلقة به من أجل التمكّن من دراسة أثر المشاريع المنجزة في تحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وأبدوا استعدادهم للقيام بدراسات ميدانية وجلسات استماع خاصة في أواسط بعض الفئات الاجتماعية كذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة للتعرف على مدى تحقق الأهداف المتوقعة من المشاريع المنجزة. كما دعا المشاركون إلى استحضار مختلف الإكراهات التي اعترضت إنجاز بعض المشاريع في محطة تحيين البرنامج مستقبلاً والترافع المستمر لتوفير الموارد الكافية وضمان انخراط الشركاء لاستكمال تنفيذ برنامج العمل، خاصة ما يتعلق بمحور التنمية الثقافية والرياضية ودعم التماส克 الاجتماعي، وإعطاء الأسبقية للمرافق المتعلقة بالخدمات الصحية التي أبانت الجائحة عن الحاجة الملحة لتعزيزها وتأهيلها.


وتفعيلاً لأحكام مقتضيات المادة 15 من المرسوم 301.16.2: التي تنص على أن "يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المرسوم. ويتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة"، تم عرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا 2018 – 2023 على اللجان الدائمة في اجتماع عقد بمقر الجماعة بتاريخ 15 مارس 2021؛ حيث ثمن أعضاء اللجن الدائمة هذه المبادرة والأثر الإيجابي، الذي سيحدثه إنجاز مجموعة من المشاريع النوعية والمهمة التي أنجزت أو انطلقت بها الأشغال، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو تعزيز البنية التحتية بالمدينة كتأهيل المدينة العتيقة وبناء وتهيئة سوق الصالحين وتمديد خط الترامواي. كما أبدى السادة أعضاء اللجان الدائمة مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتعثر إنجاز بعض المشاريع خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والمرافق الجماعية التي تقدم خدمات القرب للمواطنين، ودعوا إلى ضرورة العمل على تحيين البرنامج خلال السنة المقبلة ليتلاءم مع المعطيات الحالية سواء على مستوى الحاجيات المستجدة أو الإمكانيات المالية المتوفرة والأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة كورونا ول مختلف الإكراهات الأخرى.



الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة

في إطار سعيه لتنفيذ برنامج عمل الجماعي لسلا بإبرام العديد من الاتفاقيات لإنجاز المشاريع المدرجة، حيث تمت الموافقة على أزيد من 50 اتفاقية أو ملحق اتفاقية أو ملحق تعديلي خاصة بتفعيل وتنزيل المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة.

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
الدورة الاستثنائية بتاريخ 20 نونبر 2019	برنامجه التنمية المندمجه لعمالة سلا للفترة الممتدة بين 2020 و2024 .	-وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) -وزارة إعداد التراب الوطني والتعهير والإسكان وسياسة المدينة -مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة -جامعة سلا -وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء -الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب -وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق -وزارة الشباب والرياضة والثقافة -وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي -وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -وزارة الصحة -المندوبيه الساميه للمياه والغابات ومحاربة التصحر -وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة -وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي -مؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة) - مجلس عمالة سلا	مساهمة جماعة سلا: 454,50 مليون درهم 4365.00 مليون درهم




التكلفة الإجمالية	الشركاء	موضع الاتفاقية	دور المجلس الجماعي
	<ul style="list-style-type: none"> - جماعة بوقنادل - جماعة عامر - جماعة السهول 		
المحور 1: المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والتنمية المستدامة			
1.7 مليار درهم	<p>شركة تراموي الرباط سلا</p> <p>جماعة الرباط</p> <p>جماعة سلا</p>	<p>تمديد خط الترمواي إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله</p>	<p>أعطى جلالة الملك</p>
<p>458 مليون درهم</p> <p>(هذا المبلغ لا يشمل تكاليف الدراسات البالغة 04 ملايين درهم)</p>	<p>وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.</p> <p>ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.</p> <p>عمالة سلا.</p> <p>مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.</p> <p>جماعة سلا.</p> <p>الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.</p>	<p>اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل المداخل إلى الطريق السيار لمدينتي الرباط وسلا</p>	<p>الدورة العادية لشهر فبراير 2019</p>
200 مليون درهم	<p>وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.</p> <p>ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.</p> <p>عمالة سلا.</p> <p>مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.</p> <p>جماعة سلا.</p> <p>جماعة سidi أبي القنادل.</p> <p>جماعة عامر</p>	<p>اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل الشبكة الطرقبية بجهة الرباط سلا القنيطرة.</p>	<p>الدورة العادية لشهر ماي 2019</p>
20.000.000,00 درهم	<p>وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع المياه والغابات.</p> <p>ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة.</p> <p>عمالة سلا.</p> <p>مجلس عمالة سلا.</p> <p>مجلس جماعة سلا.</p> <p>شركة الرباط الجهة للتبيئة.</p>	<p>النسخة المعدلة لاتفاقية شراكة تتعلق بحماية وتنمية وتهيئة الغابة الحضرية "عين الحوالة"</p>	<p>الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020</p>
<p>- تخصيص المقاطع الطرقبية (طريق القنيطرة- طريق عين الحوالة- قنطرة الفداء) على مسافة 4 كم كمسارات خاصة بحافلات النقل العمومي الحضري.</p>	<p>- وزارة الداخلية</p> <p>- ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة</p> <p>- مؤسسة التعاون بين الجماعات "</p> <p>"العاصمة"</p>	<p>اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وتهيئة وصيانة مسارات خاصة بحافلات النقل العمومي الحضري</p>	<p>الدورة العادية لشهر فبراير 2018</p>



التكلفة الإجمالية	الشركاء	موضوع الاتفاقية	دور المجلس الجماعي
	<ul style="list-style-type: none"> - مجلس جماعة الرباط - مجلس جماعة سلا - مجلس جماعة تمارا - شركة الرباط جهة تهيئة 	<ul style="list-style-type: none"> - بعمالات الرباط - سلا - تمارا. 	
المحور 2: تثمين تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة			
900 مليون درهم	<ul style="list-style-type: none"> - وزارة الداخلية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - وزارة إعداد التراب الوطني والتهيئة والإسكان وسياسة المدينة - وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني - وزارة الشباب والرياضة - وزارة الثقافة والاتصال - صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - ولاية جهة الرباط سلا القنطرة - عمالة سلا - المجلس الجهوي للرباط سلا القنطرة - مجلس عمالة سلا - المجلس الجماعي لسلا - مؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة) - شركة الرباط جهة تهيئة. 	<ul style="list-style-type: none"> - اتفاقية إطار تتعلق ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا 2019-2023 	<p>الدورة الاستثنائية بتاريخ 28 نونبر 2018</p>
تلزيم الجماعة بمقتضى هذه الاتفاقية بما يلي:	<ul style="list-style-type: none"> 1- وضع العقار المسمى "الدار الكبيرة" المتواجد بالعنوان التالي: رقم 10، درب شركو، زنة معانة، قساطلة المدينة العتيقة - سلا، والمكون من طابق سفلي وأخر علوي رهن إشارة جمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحقون بسلا. 2- ترميم وإصلاح "الدار الكبيرة" وجعلها قابلة 	<ul style="list-style-type: none"> - اتفاقية شراكة بين جماعة سلا وجمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحقون بسلا، تتعلق بتخصيص "الدار الكبيرة" بالمدينة العتيقة لسلا كمركز للبحث والتكوين في 	<p>الدورة العادية لشهر فبراير 2021</p>




التكلفة الإجمالية	الشركاء	موضع الاتفاقية	دورة المجلس الجماعي
<p>للاستغلال ومتوفرة على كافة المرافق الضرورية.</p> <p>تلتزم الجمعية بمقتضى هذه الاتفاقية بما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- المساهمة المالية في تجهيز المركز وتوفير شروط انطلاق نشاطه في أحسن الظروف؛ 2- تسهيل وتدبير مرافق "الدار الكبيرة" كمركز للبحث والتكوين في تراث الملحقون؛ 3- الحفاظ على المركز ومرافقه؛ 4- وضع الدعامات البيداغوجية الخاصة بالتدريس؛ 5- تعينة الموارد البشرية والمادية؛ 6- إقرار برنامج سنوي خاص بالتكوين؛ 7- التنصيص دائمًا على جماعة سلا كشريك داعم للمشروع 		تراث الملحقون.	
<p>- تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 1.000.000,00 (مليون درهم) لاقتناء دراجات نارية لفائدة مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا.</p> <p>- صيانة مقر الشرطة المتواجد بحي سيدى موسى "كرنيش سلا" بمقاطعة المرسية؛</p> <p>- بناء مقر للشرطة بحي الفروكي بمقاطعة تابريكت؛</p> <p>- وضع المجلس لبقعة أرضية رهن إشارة المصالح الأمنية لبناء مقر للشرطة بمشروع "أبواب سلا" بمقاطعة العيادة؛</p> <p>- مراعاة المعايير الهندسية والتقنية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في عمليات الصيانة والبناء؛</p> <p>- المشاركة في اللجنة المشتركة للتتبع المحدثة بموجب هذه الاتفاقية.</p>	<p>- جماعة سلا.</p> <p>- المديرية العامة للأمن الوطني</p>	<p>تعديل اتفاقية شراكة بين جماعة سلا والمديرية العامة للأمن الوطني لتوفير الدعم المادي واللوجيسيكي ومقرات لفائدة مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا</p>	<p>دورة استثنائية بتاريخ 25 نونبر 2016</p>
<p>وضع المجلس للبنية المتواجدة بمشروع "أبواب سلا" بمقاطعة العيادة، والمخصصة لمكتبة "Bibliothèque" . وذلك رهن إشارة المصالح الأمنية لتخديصها كمقر أمني، وذلك لمدة أربع</p>	<p>- جماعة سلا.</p> <p>- المديرية العامة للأمن الوطني.</p>	<p>اتفاقية شراكة بين جماعة سلا والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تخصيص عقارات لفائدة مصالح</p>	<p>الدورة العادية لشهر فبراير 2020</p>



التكلفة الإجمالية	الشركاء	موضع الاتفاقية دورة المجلس الجماعي
<p>سنوات، في انتظار بناء مقر الشرطة من طرف المصالح الأمنية بالبقةة الأرضية الم موضوعة سابقا رهن إشارة هذه الأخيرة بمشروع "أبواب سلا" مقاطعة العيادة، والمشار إليها بالرمز A1 حسب تصميم التجزئة، والبالغة مساحتها 2598 مترا مربع، وفق ما تم الالتزام به في إطار اتفاقية شراكة مبرمة بين الطرفين ومؤشر عليها بتاريخ 30 دجنبر 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بناء مقر للشرطة بالبقةة الأرضية المتواجدة بشارع باب سبتة (سوق السمك سابقا) بالمدينة العتيقة لسلا، والبالغة مساحتها 301 مترا مربع؛ - مراعاة المعايير الهندسية والتقنية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في عملية البناء؛ - المشاركة في اللجنة المشتركة للتتبع المحدثة بموجب هذه الاتفاقية. 		<p>الأمن الوطني بمدينة سلا.</p>

المحور 3: التنشيط السياحي والاقتصادي ودعم الاستثمار

الدورة الاستثنائية بتاريخ 04 شتنبر 2018	وزارة الداخلية	مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث المجازر البلدية الجديدة لعماليتى الرباط وسلا في صيغتها الجديدة.
<p>267 مليون درهم</p> <ul style="list-style-type: none"> - وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة - ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة - مجلس جماعة الرباط - مجلس جماعة سلا - مجلس جماعة أبي القناديل - مجلس جماعة السهول - مجلس جماعة عامر - مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مجازر الرباط وسلا" - المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية - الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء - وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية 		



التكلفة الإجمالية	الشركاء	موضوع الاتفاقية	دورة المجلس الجماعي
	- شركة الرباط جهة تهيئة		
85 مليون درهم	- جهة الرباط سلا القنيطرة. - جماعة سلا.	اتفاقية شراكة لإحداث منطقة صناعية للتقنيات Technoparc et "الحديثة" "Start up de Salé والشطر الثاني من مشتل المقاولين الشباب بسلا.	الدورة الاستثنائية بتاريخ 17 دجنبر 2020
وضع جزء من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 4350/راء رهن إشارة المشروع (موقع الاستقبال). - المساهمة في التأطير الاجتماعي للحرفيين المستفيدين. - مواكبة عملية التقسيم والتوزيع لمساحة المحلات الخاصة بالحرفيين المستفيدين. - منح جميع الرخص الإدارية من أجل إنجاز منطقة لأنشطة وبناء المحلات التجارية اللازمة لهذا الغرض. - تحمل مصاريف المساهمة المتعلقة بالربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير فيما يخص الجزء الثاني من منطقة الأنشطة. - تحمل مصاريف بناء الجزء الثاني من منطقة الأنشطة الزربية "ZAZ" غير المعنية بعملية نقل المحلات في إطار تحرير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز مشروع تمديد الخط الثاني للطرامواي.	- عمالة سلا - جماعة سلا - شركة الطرامواي الرباط سلا	اتفاقية شراكة من أجل إنجاز منطقة لأنشطة الاقتصادية والخدمانية الواقعة على شارع الزربية بمقاطعة أصرين، يخصص جزء منها لإيواء محلات الأنشطة الحرفية المتواجدة في البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد TF66612 الواقعة داخل مسار الطرامواي.	الدورة الاستثنائية بتاريخ 30 ماي 2018 الدورة العادية لشهر ماي 2019 (موضوع ملحق لهذه الاتفاقية)
83.037.200,00 درهم	- جماعة سلا. - السيد محمد اشمامو منعش عقاري	الملحق الرابع لاتفاقية الشراكة المبرمة سابقا ما بين جماعة سلا والسيد محمد اشمامو منعش عقاري بخصوص إنجاز سكن اجتماعي وتجهيزات عمومية بتايريك	الدورة العادية لشهر فبراير 2018



التكلفة الإجمالية	الشركاء	موضع الاتفاقية	دورة المجلس الجماعي
		الوسط.	
الالتزامات جماعة سلا الالتزامات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكافاءات	-جامعة سلا. -الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكافاءات	اتفاقية تعاون وشراكة إطار بين جماعة سلا والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكافاءات من أجل الهوض بدعم إحداث التعاونيات من طرف الشباب	الدورة العادية لشهر فبراير 2020
يتعلق الأمر بملائمة بعض مقتضيات هذه الاتفاقية مع المستجدات القانونية	جامعة سلا -وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ولاقتصاد الرقمي. -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة. -جمعية المنطقة الصناعية تابريكت سلا.	ملحق ثانى لاتفاقية شراكة المتعلقة بإعادة تأهيل المنطقة الصناعية تابريكت سلا.	الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016
2.000.000,00 درهم.	جامعة سلا. - مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة. -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة. - مجلس عمالة سلا - جمعية صناعي المنطقة الصناعية حي الرحمة - سلا.	اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إعادة تأهيل المنطقة الصناعية حي الرحمة بمدينة سلا	الدورة العادية لشهر ماي 2017

المحور 4: التنمية الثقافية والرياضية ودعم التماسك الاجتماعي

85.000.000,00 درهم	وزارة إعداد التراب الوطني والتعهير و والإسكان وسياسة المدينة. - وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. - عمالة سلا. - جماعة سلا. - العمران الرباط - سلا - القنيطرة.	اتفاقية شراكة من أجل التمويل التكميلي للبرنامج الوطني - مدن بدون صفيف - بجماعة سلا .2022-2020	الدورة الاستثنائية بتاريخ 21 يوليوز .2020
--------------------	---	---	---



دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
الدورة العادية لشهر مאי 2016	اتفاقية تعاون وشراكة من أجل إحداث وتجهيز مسرح بمدينة سلا	وزارة الثقافة. عمالة سلا (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية). جهة الرباط سلا القنيطرة. مجلس عمالة سلا. جماعة سلا. شركة الرباط للتهيئة	50.000.000,00 درهم
الدورة العادية لشهر مאי 2016	اتفاقية تعاون وشراكة من أجل إحداث المركب الثقافي بمقاطعة احصين سلا (من أجل بناء مركز سوسيو ثقافي احصين).	اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. جماعة سلا. اللجنة المحلية للتنمية البشرية لمقاطعة احصين. شركة الرباط للتهيئة	10.000.000,00 درهم
الدورة الاستثنائية بتاريخ 21 يوليوز 2020	اتفاقية شراكة من أجل التمويل التكميلي للبرنامج الوطني - مدن بدون صفيح - بجماعة سلا 2022-2020	وزارة إعداد التراب الوطني والتعهير والإسكان وسياسة المدينة. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. عمالة سلا. جماعة سلا. العمران الرباط - سلا - القنيطرة.	85.000.000,00 درهم
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة بين جماعة سلا ووزارة الثقافة من أجل بناء وتجهيز ثلاث خزانات بمدينة سلا	جماعة سلا. وزارة الثقافة.	10.000.000,00 درهم
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة من أجل إحداث ملعب رياضي للقرب بعشب اصطناعي مزود بالإنارة الكاشفة وحدائق ألعاب بجي الصفاء، بمقاطعة احصين	جماعة سلا. عمالة (اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا). اللجنة المحلية للتنمية البشرية لمقاطعة احصين. المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بسلا: المساهمة في حدود الإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة	1.800.000,00 درهم +
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة من أجل بناء قاعة مغطاة بمقاطعة لمريسة.	جماعة سلا. عمالة (اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا). اللجنة المحلية للتنمية البشرية لمقاطعة	7.000.000,00 درهم




دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
		ميسرة. المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بسلا.	
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق ببناء قاعة مغطاة بمقاطعة تابيركت.	جامعة سلا. عمالة (اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا). اللجنة المحلية للتنمية البشرية لمقاطعة تابيركت. المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بسلا.	6.000.000,00 درهم
الدورة العادية لشهر فبراير 2017	اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز مركز لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بسلا.	جامعة سلا. اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا. مجلس عمالة سلا. المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بسلا.	6.500.000,00 درهم
الدورة الاستثنائية بتاريخ 04 سبتمبر 2018	اتفاقية شراكة بين جامعة سلا ووزارة الشباب والرياضة والرياضة من أجل تهيئة القاعة المغطاة فتح الله البوعرزاوي.	جامعة سلا. وزارة الشباب والرياضة	7.000.000,00 درهم

المحور 5: المشاريع المهيكلة

305 مليون درهم	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ولاية جهة الرباط سلا القنطرة - مجلس جهة الرباط سلا القنطرة - عمالة سلا - جماعة سلا - شركة الرباط الجهة للتهيئة	اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل فضاء سوق الصالحين بتايركت.	الدورة الاستثنائية بتاريخ 13 يوليوز 2017.
----------------	--	---	---

المحور 6: التدبير الجماعي

يعدل البند الخامس من الاتفاقية كما يلي: - البند الخامس: صرف الدعم. يتم صرف الدعم لفائدة المستفيددين بمبلغ 10.000,00 درهم لكل سيارة نقل البضائع عاملة	جامعة سلا. - جمعية التضامن لأصحاب العربات المجرورة بسوق الجملة للخضر والفواكه بسلا	- الملحق الثالث لاتفاقية شراكة بين جامعة سلا وجمعية التضامن لأصحاب العربات المجرورة	الدورة العادية لشهر ماي 2016
--	---	---	------------------------------



دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
	<p>بسوق الجملة، و 5.000,00 درهم لكل دراجة نارية ثلانية العجلات (Triporteurs) عاملة بتراب الجماعة.</p> <p>ليصبح كما يلي :</p> <p> يتم صرف الدعم لفائدة المستفيدين بمبلغ 10.000,00 درهم لكل سيارة نقل البضائع عاملة بسوق الجملة، و 5.000,00 درهم لكل دراجة نارية ثلانية العجلات (Triporteurs) عاملة بتراب الجماعة، ودعم بمبلغ 3.000,00 درهم لفائدة العاملين (العمالة) بسوق الجملة، مع التزام هؤلاء بمساهمة رمزية إضافية بنسبة 10٪ من مبلغ الدعم المخصص لهم، وذلك قصد استبدال عرباتهم اليدوية بعربات حديدية موحدة سهلة التنقل صغيرة الحجم وكبيرة الحمولة مع الالتزام بعدم إخراجها من السوق.</p>		<p>بسوق الجملة للخضر والفاكه سلا</p>
الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018	<p>تلزم جماعة سلا في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - توفير الفضاء اللازم لإيواء الحيوانات موضوع تدخل الجمعية خلال فترة ما بعد عمليات التعقيم والمعالجة. - توفير دعم مالي سنوي قيمته: 400.000,00 درهم (أربعين ألف درهم) ضمن ميزانية الجمعية لتغطية جزء من تكاليف العملية والأدوية. - التعهد بعدم قتل الحيوانات التي تدخل ضمن مشروع عمل الجمعية (التي تحمل شارة الجمعية). - وضع الآليات والموارد البشرية التي تشتمل في مجال الحيوانات الضالة رهن إشارة الجمعية إذا اقتضت الضرورة. 	<p>جماعية سلا. جمعية آذان لحماية الحيوانات</p>	<p>اتفاقية شراكة بين جماعة سلا وجمعية آذان لحماية الحيوانات حول معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة ومحاربة داء السعر</p>
الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019	<p>توفير الاعتمادات المالية الازمة لتنزع ملكية الوعاء العقاري اللازم لإحداث المقبرة.</p> <p>تسبيح المقبرة بحائط وقائي وإقامة حزام أخضر يحيط بها.</p> <p>تزوئ المرافق التابعة للمقبرة.</p>	<p>جماعية سلا جماعية السهول</p>	<p>- اتفاقية شراكة بين جماعة سلا وجماعة السهول من أجل إحداث وتدبير مقبرة من الملك المدعو "اعبيبو 2" ذي</p>



دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
	الرسم العقاري عدد 7268/ر بجماعة السهول		تزييء مماتها. بناء سكن للحارس لضمان تواجده المستمر بالمقبرة. توفير مصدر مائي للمقبرة. وضع ملصق حائطي لتصميم المقبرة بمدخلها يحمل أرقاماً لمماتها وقبورها لتسهيل زيارتها.

اتفاقيات لم تسجل في منظومة المشاريع لكن مضمونها ينسجم مع رؤية برنامج عمل جماعة سلا 2018 – 2023 والتوجهات التنموية

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
الدورة العادية شهر ماي 2017	اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق بالمساهمة في مشروع "بناء المركز الجهوي لطبع الإدمان لجهة الرباط سلا القنيطرة".	جماعة سلا. ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة (اللجنة الجهوية للتنمية البشرية). وزارة الصحة. عمالة سلا (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية). مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. مجلس عمالة سلا. شركة الرباط للهيئة.	24.000.000,00 درهم
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة بين جماعة سلا ووزارة الشباب والرياضة من أجل بناء مركب رياضي بمدينة سلا.	جماعة سلا. وزارة الشباب والرياضة. وزارة الاقتصاد والمالية. عمالة سلا. شركة الرباط الجهة للهيئة.	205.000.000,00 درهم
الدورة الاستثنائية بتاريخ 28 نونبر 2018	ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة رقم 2016/50 ورقم 2018/21 في إطار البرنامج الأفقي برسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشأن مشروع بناء مركب الأميرة للامريم للتأهيل الاجتماعي	ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا جماعة سلا شركة الرباط الجهة للهيئة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا	20.000.000,00 درهم



2.500.000 درهم	كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة؛ مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة مجلس جماعة الرباط مجلس جماعة سلا مجلس جماعة القنيطرة	اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق ببناء وتجهيز مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية صعبة بدون مأوى قار - مركز إدماج - سلا.	الدورة العادية شهر أكتوبر 2019
50.000,00 درهم سنويا	جماعة سلا. جمعية مركز دعم التنمية المحلية CADEL	اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة سلا وجمعية مركز دعم التنمية المحلية CADEL.	الدورة الاستثنائية بتاريخ 28 نونبر 2018
8.000.000 درهم	جماعة سلا. ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة (اللجنة الجهوية للتنمية البشرية). عمالة سلا (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية). مجلس عمالة سلا. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة. مؤسسة التعاون الوطني	اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق بالمساهمة في مشروع "بناء مركز للترويض الطبي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سلا	الدورة الاستثنائية بتاريخ 18 يوليوز 2019 -
الشروط العامة لتدبير وتهيئة وتجهيز وصيانة الشاطئ. الولوج إلى الشاطئ. تخصيص الفضاء. تهيئة وصيانة الشاطئ؛ البيئة والتنمية المستدامة تصميم استغلال و تدبير الشاطئ PUGP حماية وأمن المصطافين	وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء-ممثلة في شخص المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء-جماعة سلا.	الموافقة على اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وجماعة سلا ووكالة تهيئة ضفي أبي رقراق تتعلق بتهيئة وتدبير شاطئ سلا.	الدورة العادية شهر أكتوبر 2019
تخصيص مساهمة مالية سنوية محددة في مبلغ 1.300.000,00 (مليون وثلاثمائة ألف درهم) لفائدة جمعية تدبير مقابر سلا.	- - جماعة سلا جمعية تدبير مقابر سلا	اتفاقية شراكة بين جماعة سلا وجمعية تدبير مقابر سلا تتعلق بتدبير وصيانة المقابر بمدينة سلا	الدورة العادية شهر ماي 2018
- توفير الأماكن لوضع هذه	كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية	اتفاقية الشراكة الخاصة بتعزيز	الدورة العادية



<p>المحطات وتزويدها بوسائل الاشتغال والمحافظة عليها (الكهرباء والاتصال...);</p> <p>- المساهمة في توفير الدعم اللازم لديمومة المشروع.</p>	<p>المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة؛</p> <ul style="list-style-type: none"> - مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة - ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة - مجلس جماعة الرباط - مجلس جماعة سلا - مجلس جماعة القنيطرة 	<p>شبكة رصد جودة الهواء بجهة الرباط - سلا - القنيطرة</p>	<p>لشهر أكتوبر 2019</p>
<p>3.100.000,00 درهم</p>	<p>جماعة سلا</p> <p>وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة</p>	<p>اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الجماعي لمدينة سلا ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في مجال توفير اللوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة سلا</p>	<p>الدورة الاستثنائية بتاريخ 20 نونبر 2019</p>
<p>المساهمة في تحديد الحرف المستهدفة في إطار لجنة الانتقاء الواردة في المادة الخامسة أسفله؛</p> <p>- المشاركة في لجن طلب العروض وللجنة الانتقاء وللجنة التتبع؛</p> <p>- المشاركة في لجنة استلام الخدمات والتجهيزات بعد التوصل بشهادة مطابقة التجهيزات (مسلمة من مكتب خبرة مختص).</p>	<p>وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛</p> <ul style="list-style-type: none"> - عمالة سلا؛ - مجلس عمالة سلا؛ - مجلس جماعة سلا؛ - غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة. 	<p>اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ مشروع مواكبة الحرف المستهدفة عن طريق الدعم التقني والتكوين والمحافظة على الحرف المهددة بالانقراض.</p>	<p>الدورة العادية لشهر فبراير 2019</p>



المحور الأول: المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والتنمية المستدامة

يتضمن المحور الأول المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والتنمية المستدامة وعددها 114 مشروعًا مجمعة في ستة برامج بكلفة إجمالية تقدر بـ 5209.07 مليون درهم، موزعة كالتالي:

البرنامج	عدد المشاريع	تكلفة العقار	تكلفة الأشغال	تكلفة المشروع	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية
بناء وتهيئة الطرق الرئيسية	15	260.25	649	909.15	889.5	19.75
إنجاز المنشآت الفنية	3	25	480	505	295	210
تأهيل أحياي المدينة	82	123.5	742.5	866	866	0
تهيئة مستودعات السيارات	4	12.13	139	151.13	70.73	80.40
تهيئة المساحات الخضراء	6	4.59	170	174.59	120	54.59
تعزيز بنية النقل والتنقل	4	150.76	2452.34	2603.10	2603.10	0
المجموع	114	576.23	4632.84	5209.07	4844.33	364.74

تميزت سنة 2020 وهي السنة الثانية لإنجاز برنامج عمل الجماعة بانتشار جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد الذي عانى منها العالم ومن ضمنها المغرب وأثرت بشكل مباشر على السير العادي لإنجاز المشاريع وتوقف العديد من الأنشطة الحيوية، خاصة خلال الفترة الأولى من إعلان حالة الطوارئ الصحية والتي دامت ثلاثة أشهر متواصلة. كما أن توقف العديد من المرافق والأنشطة التجارية والاقتصادية أثر على حجم المداخيل الجبائية خاصة منها الذاتية، إضافة إلى صدور دورية وزارية تحت الجماعات الترابية على عدم إطلاق مشاريع الهيئة العمرانية والإدارة العمومية والمساحات الخضراء باستثناء تلك التي شرع في تنفيذها قبل بداية فترة الجائحة. وقد أضعفت تداعيات الجائحة قدرة الجماعة والشركاء على الاستجابة لاستحقاقات برنامج العمل. وتعبئته الموارد الازمة لتنفيذ المشاريع.



بالنسبة للمحور الأول، فقد استمر تنفيذ المشاريع التي انطلقت في السنة الأولى من البرنامج والتي بلغت عشرين مشروعًا إضافية إلى الشروع في الدراسات بالنسبة لـ 14 مشروعًا.

ويقدم الجدول التالي عرضاً إجمالياً لمجموع المشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز أو في طور الدراسة أو في طور الترافق للستين الأولتين من البرنامج 2019 و 2020.

السنة	2020			2019		
	المجموع	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المجموع	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية
عدد المشاريع	9	105	114	9	105	114
المشاريع المنجزة	1	4	5	1	3	4
في طور الانجاز	1	10	11	2	7	9
في طور الدراسة	1	11	12	1	7	8
في طور الترافق مع الشركاء	5	79	84	5	86	91
مشاريع الغيت أو أجلت	0	2	2	0	2	2
المجموع	9	105	114	9	105	114

بالمقارنة بين سنتي 2019 و 2020 يظهر أن عدد المشاريع المنجزة انتقل من 4 مشروع إلى 5 مشروعًا، كما شرع في إنجاز 3 مشاريع، وارتفع عدد المشاريع التي في طور الدراسة من 8 إلى 12 مشروعًا بين سنتي 2019 و 2020،




فيما يلي جدول تفصيلي لتقدم كل مشروع بهذا المحور :


البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2022-2023	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال (%)	نسبة الإنجاز (%)
	1.1	تهيئة وتوسيعة طريق القنيطرة (المقطع الواقع بين حي اشمامعو وشارع "د").	باب المرسسة والعبايدة	9	15	24	-	24	الدراسات منجزة (الاتفاقية + الدراسات)	10	30	0	40
	2.1	استكمال تهيئة طريق القنيطرة (المقطع الواقع بين شارع "د" وحدود جماعة عامر).	باب المرسسة والعبايدة	20	65	85	-	85	الدراسات منجزة (الاتفاقية + البطاقة التقنية + إجراء الدراسات)	10	30	0	40
بناء وتهيئة الطرق الرئيسية	3.1	تهيئة طريق مكناس الشطر 3 (المقطع الواقع بين طريق المطار والطريق الالتفافية).	احصين والعبايدة	20	90	110	-	110	في طور الدراسة في اطار اتفاقية مع الشركاء (البطاقة التقنية + إجراء الدراسات)	10	30	0	40
	4.1	تهيئة طريق القاعدة الجوية (المقطع الواقع بين طريق مكناس وسيدي ابراهيم بولجوجل).	بطانة - تابيركت - العبايدة	49,75	47,25	97	-	97	في طور الدراسة في اطار اتفاقية مع الشركاء (البطاقة التقنية + إجراء الدراسات)	10	30	0	40

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة 2018-2021	الكلفة للفترة -2022	التصديق على الاتفاقية	القيام بالدراسات النافية	إنجاز الأشغال (%)	نسبة الإنجاز (%)
	5.1	تهيئة وبناء الطريق الساحلي (المقطع الواقع بين تجزئة سعيد حجي وطريق القنيطرة)،	العيادة	25	50	75	-	75	5	في طور الترافق مع الشركاء	تسوية	5
	6.1	تهيئة طريق سيدى ابراهيم بولعجول (طريق بين ج سلاوج عامر)،	العيادة-عامر	25	50	75	-	75	5	في طور الترافق مع الشركاء	تسوية	5
	7.1	بناء باركواي الجزء الثاني(المقطع الواقع بين الطريق الدائري رقم 2 وطريق الالتفافية)،	احصين	-	152	152	-	152	10	تم إنجاز الشطر الأول من مدارة عين الجوالة إلى مدخل عنق الجمل (الاتفاقية + الدراسات 50+ من الأشغال)		80
	8.1	تهيئة وبناء شارع الزريبة (المقطع الواقع بين المستشفى الاقليمي وطريق الالتفافية رقم 1)،	احصين	40	50	90	-	90	-	تم إنجاز الشطر الأول من المشروع من المستشفى الاقليمي إلى إقامة الصفاء // الجزء الأول من الشطر الثاني الممتد من إقامة الصفاء إلى طريق اوطا احصين تم بناؤه في انتظار الهيئة والجزء الثاني إلى غاية الطريق الدائري رقم 1 في انتظار البناء والتهيئة وتسوية العقار		30

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات التقنية	التصديق على الاتفاقية	حالة تقديم المشروع	الكلفة للفترة -2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
10	0	0	10	تسوية الاتفاقية	-	28,5	28,5	20	8,5	بطانة	بناء طريق الخندق الرابطة بين اقواس بطانة وشارع الحسن الثاني	9.1	
-	-	-	-	المراحل الثانية	11,25	-	11,25	11,25	*	بطانة	تهيئة شارع الشهداء ، حي السلام ، (بين شارع عبد الكريم الخطابي و شارع الأطلس الكبير) ، بطانة	10.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	65	65	35	30	احصين	بناء الطريق الرابطة بين RP4006 (شارع الزربية) و RP4029 (طريق اوطا احصين) اتجاه سلا الجديدة	11.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	50	50	25	25	احصين	بناء الطريق الرابطة بين RP4006 (شارع الزربية) و RP4029 (طريق اوطا احصين) على مستوى جامعة محمد الخامس	12.1	بناء وتهيئة الطرق الرئيسية
50	10	40	-	في طور إنجاز الأشغال	8,5	-	8,5	5	3,5	احصين	بناء الطريق الرابطة بين شارع الزربية ومدار المطار	13.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	20	20	20	-	لمريسة	بناء الطريق المؤدية لمقررة سيدى بنعاشر (المداريات + فتح باب جديد)	14.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	18	18	13,5	4,5	العيادية	بناء الطريق الواقعة بين تجزئة سيدى عبد الله وطريق سيدى ابراهيم بولعجلو.	15.1	




نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات النقنية	التصديق على الاتفاقية	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة 2022-2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
5	0	0	تسوية 5	في طور الترافق مع الشركاء	-	60	60	60	-	لعيادة	إنجاز ممر تحت السكة الحديدية بطريق سيدى براهيم بولعجول	16.1	إنجاز المنشآت الفنية
5	0	0	5	في طور الترافق	-	235	235	220	15	الجامعة	منشآت فنية (2 طريق القبيطرة + طريق مكتناس)	17.1	
20	0	10	10	في طور الدراسة	210	-	210	200	10	الجامعة	منشآت فنية لشارع القاعدة الجوية وشارع الحسن الثاني (2) منشآت الفنية	18.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	45	45	30	15	لعيادة	تهيئة مقطع الطريق الواقع بين شارع القاعدة الجوية والممر العلوي لطريق القنطرة RN1	19.1	تأهيل احياء المدينة
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	30	30	30	-	لعيادة	تهيئة شارع محمد الخامس (الشطر 2)	20.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	76	76	36	40	بطانة - تابريكت	تهيئة شارع عبد الخالق الطريس (المقطع الواقع بين مدار الاسماعلية وشارع عبد الرحيم بوغبید)	21.1	تأهيل احياء المدينة
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	4,5	4,5	3	1,5	لعيادة	بناء مقطع الطريق الواقع بين طريق اريحا وطريق القاعدة الجوية.	22.1	




البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة 2018-2022	التصديق على الاتفاقية	القيام بالداسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	23.1	تهيئة وبناء شارع النصر (المقطع الواقع بين شارع الامانة وشارع سيدى ابراهيم بولعجول).	العيادة	4	12	16	-	تسوية في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0
	24.1	بناء الطريق الواقع بين القاعدة الجوية وطريق الحمرى	العيادة	13	26	39	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0
	25.1	بناء وتهيئة مقطع الطريق الواقع بين شارع محمد الخامس و حي الامل	العيادة	6,5	19	25,5	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0
	26.1	بناء الطريق الرابطة بين شارع القاعدة الجوية وشارع 20 غشت	بطانة		11	11	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0
	27.1	تهيئة شارع مدیونة	بطانة		8	8	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0
	28.1	بناء الطريق المؤدية الى مقبرة سيدى الضباوى محادية لمدرسة إدريس الأزهر	تابيركت	0,5	2	2,5	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0
	29.1	بناء الطريق الرابطة بين شارع محمد الخامس و تجزئة سيدى عبد الله مرورا بجانب مقبرة سيدى الضباوى.تجزئة سيدى عبد الله	تابيركت	4	16	20	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0
	30.1	تهيئة شارع محمد الخامس (المقطع الواقع بين مدار حى كريمة وشارع دال	تابيركت	-	15	15	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة -2022	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية	القيام بالداسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
تأهيل احياء المدينة	31.1	بناء الطريق الواقع بين شارع السلام وشارع 6 نوفمبر	تايركت	2	16	18	18	-	في طور الترافق	تسوية 5	0	0	5
	32.1	تهيئة طريق مهدية (المقطع الواقع بين مركز الحليب وتجزئة شمس).	باب المرسة والعيايدة	3	50	53	53	-	البطاقة التقنية منجزة من طرف المقاطعة الجزء المتعلق بباب لرسة	-	10	0	10
	33.1	تهيئة وبناء شارع النصر (المقطع الواقع بين شارع الامانة وشارع سيدى ابراهيم بولجوجول).	العيايدة	-	8	8	8	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0	5
	34.1	تهيئة وبناء شارع النصر (المقطع الواقع بين شارع الامانة وشارع سيدى ابراهيم بولجوجول).	العيايدة	-	8	8	8	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0	5
	35.1	تهيئة الطريق الواقع بين شارع ابن الهيثم ومدرسة احمد شوقى	العيايدة	-	2	2	2	-	تهيئة الرصيف إلى غاية شارع النصر	-	10	30	40
	36.1	بناء الطريق الواقع بين دوار حلاله و طر 4004.	العيايدة	-	10	10	10	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0	5
	37.1	بناء الطريق الواقع بين طريق اريحا SLA35 و طريق سيدى ابراهيم بولجوجول	العيايدة	-	5	5	5	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0	5
	38.1	بناء شارع الامانة والطريق المحيطة بقطاع حي الرحمة "A".	العيايدة	-	6	6	6	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0	5

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة -2022	التصديق على الاتفاقية	القيام بالداسات التقنية	إنجاز الأشغال (%)	نسبة الإنجاز (%)
	39.1	تهيئة مقطع الطريق الواقع بين السكة الحديدية وشارع النصر بعي الامل	العيادة	-	14	14	14	-	تسوية في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
	40.1	تهيئة شارع ولامس (المقطع الواقع بين شارع مجد الخامس وشارع النصر)	العيادة	-	4,5	4,5	4,5	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
	41.1	بناء الطريق بين شارع اريحة و SLA35	العيادة	-	0,5	0,5	0,5	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
	42.1	بناء الطريق الواقعة بين مستودع الصحة ومدرسة حمزة بن أبي طالب	بطانة	-	1	1	1	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
تأهيل احياء المدينة	43.1	تهيئة شارع الصحراء، المقطع الممتد بين عبد الخالق الطريض الى عبد الكريم الخطابي، بطانة	بطانة	-	8	8	8	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
	44.1	بناء طريق الحزام سكتور 8 ، حي النصر- قرية اولاد موسى	احصين	-	3	3	3	-	مشروع متوقف	-	-	-
	45.1	بناء شارع الامير مولاي رشيد (المقطع الرابط بين قطاع 8 والولجة)- قرية اولاد موسى	احصين	2,5	11,5	14	-	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
	46.1	بناء وتمديد شارع مولاي اسماعيل ، حي الرشاد - قرية	احصين	-	1	1	1	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0



نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات التقنية	التصديق على الاتفاقية	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
			تسوية								اولاد موسى		
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2	2	2	-	احصين	بناء الطريق الرابطة بين شارع مولاي رشيد وشارع حمان الفطواكي - قرية اولاد موسى	47.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	1	1	1	-	احصين	بناء الطريق الواقعة بين G43 وبين مدرسة محمد الحياني ، سكتور 2 قرية اولاد موسى	48.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2	2	2	-	احصين	بناء الطريق الرابطة بين شارع مولاي رشيد وشارع مولاي عبد الحفيظ - قرية اولاد موسى	49.1	
100	60	40	-	مشروع منجز	-	3	3	3	-	احصين	بناء الطريق الرابطة بين تجزئة السلام وهي الامل - قرية اولاد موسى	50.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	1	1	1	-	احصين	بناء الطريق الواقعة بقطاع 5 ، حي النهضة - قرية اولاد موسى	51.1	تأهيل احياء المدينة
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2,5	2,5	2	0,5	احصين	بناء الطريق الواقعة بقطاع 6 ، حي الكفاح (خلف دار الطالبة) - قرية اولاد موسى	52.1	




النسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات النقدية	التصديق على الاتفاقية	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
5	0	0	تسوية 5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2	2	2	-	باب المرسسة	بناء الطريق الواقعة بين تجزئة الغرابلية واقامة ام هاني	53.1	
10	0	10	-	البطاقة التقنية منجزة من طرف المقاطعة الجزء المتعلق بباب المرسسة	-	5	5	4	1	باب المرسسة	بناء مقطع الطريق الرابط بين طريق مهدية والطريق الساحلي	54.1	
10	0	10	-	البطاقة التقنية منجزة من طرف المقاطعة الجزء المتعلق بباب المرسسة	-	1,5	1,5	1	0,5	باب المرسسة	بناء مقطع الطريق الرابط بين تجزئة دادا وتجزئة السلام	55.1	
5	0	0	5	أنجز من طرف الجماعة	-	4	4	4	-	باب المرسسة	بناء مقطع الطريق الرابط بين شارع "السلام" وشارع بلافريج	56.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2,5	2,5	2,5	-	باب المرسسة	بناء مقطع الطريق الواقعة بملحقة الشرف	57.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	4,5	4,5	3	1,5	باب المرسسة	بناء مقطع الطريق الرابط بين مستودع الشاوي والسوق الممتاز كارفور	58.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	3,5	3,5	3	0,5	باب المرسسة	بناء مقطع الطريق المؤدية الى الحي الصناعي - طريق القنيطرة -	59.1	

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات التقنية	التصديق على الاتفاقية	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة 2022-2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
5	0	0	5	تسوية في طور الترافق مع الشركاء	-	1	1	1	-	تابریکت	تهيئة مقطع الطريق الواقع بين المركز الصحي المزرعة ومحكمة الاسرة	60.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	1	1	1	-	تابریکت	تهيئة مقطع الطريق الواقع بين مستودع الاموات ومحكمة الاسرة حي المزرعة (الشطر 2)	61.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	3,5	3,5	3,5	-	تابریکت	تهيئة شارع المصحراء (المقطع الرابط بين حي الروسطال وهي السلام (قطاع 9)	62.1	
50	0	0	5	(الاتفاقية + إنجاز الدراسات) والأشغال في طور إطلاق الصفقة	-	5	5	4	1	تابریکت	اتمام أشغال بناء شارع علي بن أبي طالب إلى سيدى عبد الله	63.1	تأهيل احياء المدينة
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2	2	2	-	تابریکت	اتمام أشغال بناء شارع الحرية (امام إقامة رزق الله ومدرسة سعد بن ابي وقاص)	64.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	3	3	3	-	تابریکت	بناء الطريق الواقع بين اقامة 20 غشت وهي رامس الماء	65.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	1	1	1	-	تابریکت	بناء الطريق الواقع بين اقامة 20 غشت واقامة إياد	66.1	


البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة 2018-2022	الكلفة للفترة -2022	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية	إنجاز الأشغال (%)	نسبة الإنجاز (%)
تأهيل احياء المدينة	67.1	بناء الطريق الرابط بين حي الرحمة قطاع E وتجزئة سيدى عبد الله (امام مدرسة محمد العقاد)	تابيركت	-	4	4	4	-	تسوية 5	في طور الترافق مع الشركاء	0	5
تأهيل احياء المدينة	68.1	بناء الطريق المؤدية الى مقبرة سيدى الضاوي (خلف مدرسة إدريس الأزهري)	تابيركت	0,5	2	2,5	-	2,5	5	في طور الترافق مع الشركاء	0	5
تأهيل احياء المدينة	69.1	تهيئة الطريق المسمى آيت اعمار، حي الانبعاث	تابيركت	-	2	2	2	-	5	في طور الترافق مع الشركاء	0	5
تأهيل احياء المدينة	70.1	تهيئة شارع تاكوريت، حي الانبعاث TA 104 في تصميم الهيئة السابقة	تابيركت	-	1	1	1	-	5	في طور الترافق	0	5
تأهيل احياء المدينة	71.1	بناء الطريق الرابط بين قطاع "الف" وقطاع "واو" غير المنحدر	تابيركت	-	2	2	2	-	5	في طور الترافق مع الشركاء	0	5
تأهيل احياء المدينة	72.1	بناء الطريق الرابط بين قطاع "الف" وقطاع "واو" مرورا بمبني SP06 حي الرحمة	تابيركت	-	1	1	1	-	5	في طور الترافق مع الشركاء	0	5
تأهيل احياء المدينة	73.1	تهيئة شارع 6 نوفمبر	تابيركت	-	20	20	20	-	5	في طور الترافق مع الشركاء	0	5
مساحة خضراء	74.1	شارع المسيرة الخضراء، بطانة		-	1	1	1	-	5	في طور الترافق	0	5

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة 2018-2021	الكلفة للفترة -2022	القيام بالداسات التقنية	التصديق على الاتفاقية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	75.1	مساحة خضراء	بداية مشروع عبد الخالق طريسيابركت	-	2	2	2	-	تسوية	-	في طور اطلاق الصفقة	40
	76.1	مساحة خضراء	تجزئة المستقبل العيادة	-	5	5	5	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
	77.1	مساحة خضراء	سيدي عبدالله العيادة	-	4	4	4	-	في طور الانجاز	-	20	10
	78.1	مساحة خضراء	سيدي عبدالله، العيادة	-	4	4	4	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
	79.1	مساحة خضراء	سيدي عبدالله، العيادة	-	3,5	3,5	3,5	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
	80.1	مساحة خضراء	سيدي عبدالله، العيادة	-	6	6	3,5	2,5	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
تأهيل احياء المدينة	81.1	مساحة خضراء	شارع الحسن الثاني سلا الجديدة احصاين	-	4	4	2	2	الاشغال في طور الانجاز	-	20	10
	82.1	مساحة خضراء	قطاع "أ" تابريكت	-	2,5	2,5	2,5	-	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0
	83.1	مساحة خضراء	الحديقة، العيادة	-	12	12	2	10	في طور الترافق مع الشركاء	5	0	0


نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات النقنية	التصديق على الاتفاقية	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة 2022-2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
5	0	0	5	تسوية في طور الترافق مع الشركاء	-	3,5	3,5	1,5	2	خلف مدرسة عبد الله بن حسون سلا الجديدة - احصاين -	مساحة خضراء	84.1	
60	50	10	-	في طور الإنجاز	-	2	2	1	1	شارع 6 نونبر	مساحة خضراء	85.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	3	3	1,5	1,5	خلف مدرسة سيدي احمد بنعاشر سلا الجديدة - احصاين -	مساحة خضراء	86.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2	2	2	-	شارع 6 نونبر - جزء من المنطقة الخضراء تابيركت 755	ملعب شارع 6 نونبر	87.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2,5	2,5	1,5	1	شارع للأسماء تابيركت	مساحة خضراء	88.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	6	6	4	2	الجي العسكري العيادة	مساحة خضراء	89.1	



نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات النقنية	التصديق على الاتفاقية	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
5	0	0	5	تسوية في طور الترافق مع الشركاء	-	1,5	1,5	0,5	1	شارع الفقيه بن علي الدكالي سلا الجديدة - احصاين	مساحة خضراء	90.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2,5	2,5	2,5	-	شارع محمد الخامس قرية اولاد موسى احصاين (l'ancien PA	مساحة خضراء	91.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	4	4	4	-	سعيد حجي الشبكة المركبة	مساحة خضراء	92.1	تأهيل احياء المدينة
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	2	2	2	-	سعيد حجي إقامة نسيم البحر	مساحة خضراء	93.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	1	1	1	-	متلت طريق القنيطرة سعيد حجي	مساحة خضراء	94.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	-	1,5	1,5	1,5	-	إقامة البشير 1 حديقة البشير	مساحة خضراء	95.1	




البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة -2022	التصديق على الاتفاقية	القيام بالداسات النقنية	إنجاز الأشغال (%)	نسبة الإنجاز (%)
مساحة خضراء وفضاء لألعاب الأطفال	96.1	مساحة خضراء وفضاء لألعاب الأطفال	قطاع الألفة، شارع النصر	-	3	3	-	5	في طور الترافع مع الشركاء	تسوية	5
			لعيادة	-	3	3	-	-			
تهيئة مساحة خضراء	97.1	تهيئة مساحة خضراء	تجزئة سعيد حي باب المرسة	1,5	6	7,5	-	-	أنجز المشروع	40	100
ساحة عمومية	98.1	ساحة عمومية	جوار مدرسة الزبير ابن العوام بباب المرسة	1,5	1,5	3	-	-	أنجز المشروع	40	100
احداث مراحيس عمومية	99.1	احداث مراحيس عمومية	تابريكت- لميسة- بطانة- احصاينالعيادة	-	5	5	-	-	اطلاق الصفة + أنجز مرحاض واحد بسعيد حي	10	25
اعادة هيكلة الاحياء ناقصة التجهيز	100.1	اعادة هيكلة الاحياء ناقصة التجهيز	تابريكت - باب المرسةالعيادة - بطانة - احصاين	-	240	240	240	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	5
مستودع السيارات تحت الأرضي	101.1	مستودع السيارات تحت الأرضي	حي السلام	5,25	45	50,25	-	-	المرحلة الثانية	-	-
			بطانة	-	-	-	-	-			
مستودع السيارات تحت الأرضي	102.1	مستودع السيارات تحت الأرضي	حديقة الفردوس بباب المرسة	3,73	32	35,73	-	5	ألغى	0	0
مستودع السيارات تحت الأرضي	103.1	مستودع السيارات تحت الأرضي	قرب مسجد	3,15	27	30,15	-	-	المرحلة الثانية	-	-



تهيئة
مستودعات
السيارات


نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات التقنية	التصديق على الاتفاقية	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022	الكلفة للفترة 2018-2021	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
-	-	-	-	تأجيل	-	35	35	35	-	سوق الصالحين تايركت	مستودع السيارات تحت الأرضي	104.1	تسيئة المساحات الخضراء
-	0	0	5	المراحل الثانية	8	-	8	8	-	شارع 20 غشت، بطانة	ساحة عمومية	105.1	
5	0	0	5	في طور الترافق مع الشركاء	10	-	10	10	-	شارع المسيرة الخضراء، بطانة	مساحة خضراء	106.1	
95	50	10	-	في طور الانجاز	22	-	22	22	-	زاوية شارع الحسن الثاني و شارع عبد الكريم الخطابي، بطانة	مساحة خضراء	107.1	
20	20	-	-	تم إنجاز الملاعب الرياضية	0	50	50	50	-	بطانة	تهيئة حديقة الحرية ووحدات ملاعب رياضية	108.1	
-	-	-	-	المراحل الثانية	14,59	-	14,59	10	4,59	شارع الزربية قرية اولاد موسى احصاين	ساحة عمومية	109.1	
65	15	40	10	تمت الموافقة على اتفاقية خاصة بغاية عين الحوالة مع المياه والغابات	-	70	70	70	-	بطانة	تهيئة غابات سلا الجديدة وعين الحوالة وسيدي اعميرة	110.1	



البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة -2022	التصديق على الاتفاقية	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال (%)	نسبة إنجاز (%)
	111.1	تمديد خط الطرامواي إلى المستشفى الإقليمي بسلا	المقطع الفاصل بين شارع الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي بسلا	60,76	132,34 1	193,10 1	1193,1	-	10	مشروع منجز	تسوية	100
تعزيز بنية النقل والتنقل	112.1	تمديد خط الطرامواي إلى شارع اوطاخصين	المقطع الفاصل بين المستشفى الإقليمي بسلا وجامعة محمد الخامس بسلا الجديدة	40	500	540	540	-	-	في طور الدراسة		10
	113.1	تمديد خط الطرامواي إلى سلا الجديدة	المقطع الفاصل بين جامعة محمد الخامس بسلا الجديدة وسلا الجديدة	50	750	800	800	-	-	في طور الدراسة		10
	114.1	احداث منظومة مندمجة للتحليل والإدارة الذكية لحركة المرور	غير محدد	-	70	70	70	70	-	تم الشروع في دراسة منظومة المرور المتعلقة بالمدينة العتيقة		10

مشروع: تمديد خط الترامواي إلى المستشفى الإقليمي لسلا

صاحب المشروع: شركة الترامواي الرباط - سلا
موقع المشروع: المقطع الفاصل بين شارع الحسن الثاني ببطانة والمستشفى الإقليمي
بأحصين.(الخط الثاني)
مسافة الخط : 7 كيلومتر
تكلفة المشروع: 1.7 مليار درهم
مساهمة الجماعة: 135 مليون درهم (تكلفة العقار)
تقديم الأشغال: 100 % (مشروع منجز)

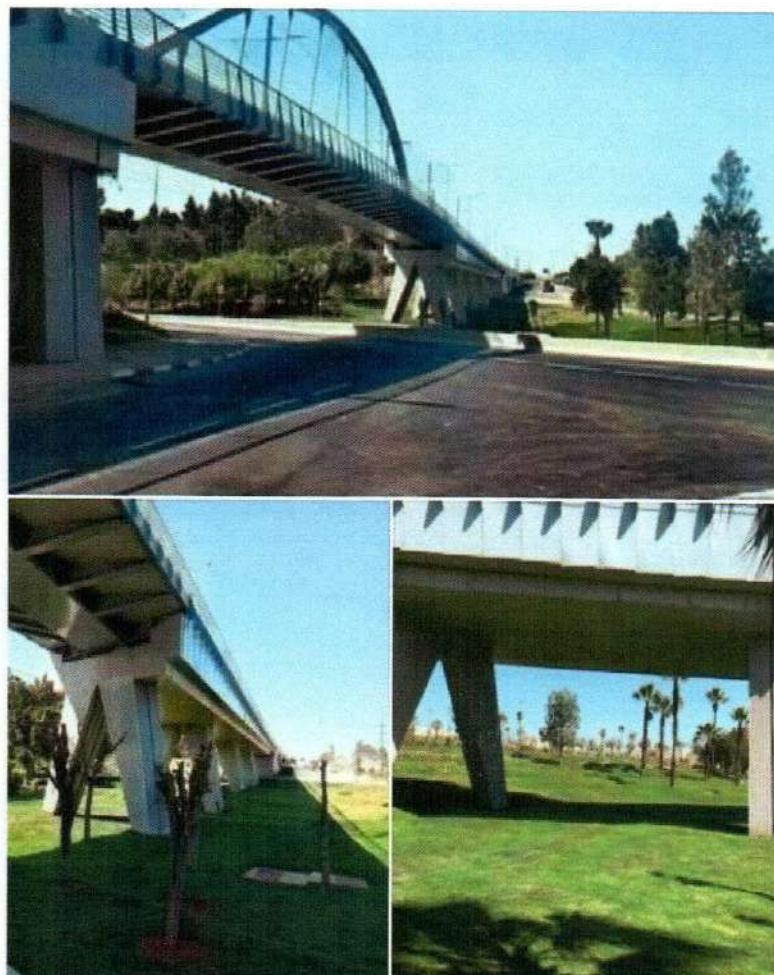

المحور الثاني: تثمين تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة

يتعلق المحور الثاني بـتثمين تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة ويضم 54 مشروعًا موزعة على تسعة برامج بتكلفة مالية تبلغ 802.10 مليون درهم.

البرنامج	عدد المشاريع	كلفة العقار	كلفة الأشغال	كلفة المشروع	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية
ترميم وتأهيل الأسوار والأبواب والبيوت التاريخية	9	1.00	119.5	120.5	70.50	50.00
ترميم وإعادة تأهيل المواقع الدينية والثقافية	8	50.00	50.00	50.00	-	-
تأهيل البنية التحتية الأساسية تأهيل الفضاء العام للمدينة العتيقة	6	5	139.7	144.7	144.7	-
تعزيز بنية الخدمات العامة	10	5.5	69.4	74.9	74.9	-
تعزيز البنية الاقتصادية للمدينة العتيقة	10	7	57.5	64.5	45.5	19.00
ترميم وتأهيل الفنادق	5	9	55	64	64	-
تأهيل المواقع الاجتماعية والاقتصادية	1	30	30	30	30	-
معالجة المباني الآيلة للسقوط	1	187	187	187	187	-
تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة	4	66.5	66.5	66.5	66.5	-
المجموع	54	27.50	774.6	802.10	733.10	69.00

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المحور كان موضوع اتفاقية إطار لتأهيل وتحمين المدينة العتيقة لسلا 2019-2023، والموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدينة مراكش بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والتي بلغت قيمتها 900 مليون درهم بمشاركة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وتروم الاتفاقية الإطار لبرنامج تأهيل وتحمين المدينة العتيقة لسلا (2019/2023) الحفاظ على هوية المدينة العتيقة ومعالمها الأصلية، وتأهيل وإعادة الاعتبار لنسيجها العتيق، وإدماجها في منظومة تنمية تهدف إلى تثمين تراثها المادي واللامادي.

ويتوقع مضمون برامج الاتفاقية على أربع محاور رئيسية:



- تأهيل البنية التحتية وتحسين السير والجولان؛
- ترميم وإعادة تأهيل التراث التاريخي؛
- تعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية؛
- تقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحية.

ويساهم في تمويل هذه الاتفاقية صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ووزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعهير والإسكان وسياسة المدينة ، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، وزارة الثقافة والاتصال ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكون المهني والبحث العلمي ، ومجلس جماعة سلا ، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ، ومؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة) ، ومجلس عمالة سلا.


خلال سنة 2020 استمر إنجاز المشاريع المبرمجة بشكل لم يتأثر كثيراً بظروف الجائحة حيث استمرت الأشغال في مجموع المشاريع المنطلقة كما تم الشروع في إنجاز تلك المبرمجة برسم سنة 2020. وقد التزمت الجماعة بتحويل حصة مساهمتها المالية برسم سنة 2020 والتي بلغت 12 مليون درهم. حيث تم استكمال إنجاز ثلاثة مشاريع في حين بلغ عدد المشاريع المنطلقة 23 ، في حين انتطلقت الدراسة في 10 مشاريع.

السنة	2020			2019		
	المرحلة الثانية	المجموع	المرحلة الاولى	المرحلة الثانية	المجموع	المرحلة الاولى
عدد المشاريع	3	51	54	3	51	54
المشاريع المنجزة	0	4	4	0	2	2
في طور الانجاز	0	18	18	0	23	23
في طور الدراسة	0	12	12	0	12	12
في طور الترافع مع الشركاء	3	15	18	3	14	17
مشاريع متوقفة	0	2	2	0	0	0
المجموع	3	51	54	3	51	54




فيما يلي جدول تفصيلي لتقدم المشاريع المدرجة في هذا المحور:


البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021_2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقديم المشروع 2020	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالداسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020
الأبراج والواجهة الغربية : ترميم الأسوار والأبراج للواجهة البحريّة	1.2	غرب المدينة العتيقة (جهة بحري)	-	13	13	13	-	-	مشروع منجز	10	40	50	100
ترميم الأسوار والأبراج	2.2	السور التاريخي	-	32	32	32	-	-	الأشغال في مراحلها النهائية	10	40	45	95
قناة المياه ببناء الممرات لمرور السيارات وإعادة ترميم قناة المياه	3.2	تابيركت + باب شعفة	-	6	6	6	-	-	في طور الترافق	5	0	0	5
ترميم و إعادة تهيئه الأبواب القديمة: باب معلقة، باب شعفة، باب سبنة	4.2	أسوار المدينة العتيقة	-	3	3	3	-	-	الأشغال في طور الانجاز	10	40	40	90
ترميم و إعادة تهيئه الأبواب القديمة: باب الصنعة ، باب لميسة	5.2	أسوار المدينة العتيقة	-	3	3	3	-	-	إنجاز الدرامة من طرف الوكالة في انتظار الاعلان عن صفقة الأشغال	10	40	0	50
إعادة بناء باب سيدني بوحاجة تجديد القبات ، أشغال كبرى وأشغال ثانوية	6.2	الطريق الساحلي	-	5	5	5	-	-	اقتراح معماري لتجسيم الباب الأصلي لباب بوحاجة	-	10	0	10




البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021_2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقديم المشروع 2020	التصديق على الاتفاقيات وتسوية العقار	القيام بالداسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020	
	7.2	باب الجديد إعادة بناء الباب (ممر السيارات وممر الراجلين)	السور الجنوبي	-	3,5	3,5	3,5	-	10	الدراسة انجزت والأشغال ستنطلق	40	0	50	
	8.2	تحويل الدار الكبيرة الى مركز التكوين والبحث في التراث (أشغال إصلاح وتأهيل الدار)	رقم 10 ، درب شرقو	1	4	5	5	-	-	في طور الافراج من القاطنين (5 أسر) وتمت الموافقة على مشروع المهندس المعماري ومكتب الدراسات بترميمها واعادة تدعيمها	-	40	0	40
	9.2	داربنخضرة - دارالكتاني - دار الصبيحي - دار العلوي - دار الصابوني (2م 135) - دارزنبر (متحف) أشغال التدعيم، إصلاح وتأهيل الدور	سيدي عبد الله بن حسون، زنقة باشا الصبيحي، باب احصين، درب بن الرئيس، سانية حصار، زنقة سيدي عبد الله بن حسون	-	50	50	50	-	5	في طور الترافق	0	0	5	
	10.2	ترميم وإعادة تأهيل المواقع الدينية والثقافية	زنقة الطالعة، قرب المسجد الكبير	-	2	2	2	-	-	في طور الترافق	0	0	5	



البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021_2018	الكلفة للفترة 2023-2022	القيام بالdasات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020	وتسوية العقار وتنمية الأنشطة	التصديق على الاتفاقيات	ال القيام بالdasات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020	
قصبة كناوة أشغال إعادة التأهيل (التجهيز والاتارة العمومية)	11.2	كورنيش سيدى موسى، خارج المدينة العتيقة	-	2	2	2	-	-	الدراسة والأشغال في مراحلها النهائية	10	40	45	95	وتسوية العقار وتنمية الأنشطة	التصديق على الاتفاقيات	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020
تهيئة وتحويل مدرسة لاأسماء الى مركز للاستقبال (ماوى للشباب)	12.2	باب احساين	-	15	15	15	-	-	الدراسة انجزت والأشغال في طور البداية	10	40	15	65	وتسوية العقار وتنمية الأنشطة	التصديق على الاتفاقيات	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020
صومعة المكرجة : إعادة هيكلة المعلمة	13.2	زنقة بورمادة	-	1	1	1	-	-	في طور الترافق	5	0	0	5	وتسوية العقار وتنمية الأنشطة	التصديق على الاتفاقيات	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020
الأضرحة	14.2	* سيدى احمد الطالب، مول الكمرى، * سيدى ابراهيم بن عمران الغازى، مولا نوبة، عبد الله الغود، قاسم الغليض، سيدى لحسن العايdi، * سيدى علي بن أيوب، سيدى احمد حعي	-	7	7	7	-	-	في طور الترافق	5	0	0	5	وتسوية العقار وتنمية الأنشطة	التصديق على الاتفاقيات	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020
الزوايا	15.2	القاديرية ، التيجانية، العيساوية الناصرية، سيدى عبد الله بن شاقور، الغازية، التهامية، المباركية، الصدريقة، الدرقاوية، الكتانية،	-	6	6	6	-	-	في طور الترافق	5	0	0	5	وتسوية العقار وتنمية الأنشطة	التصديق على الاتفاقيات	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020




البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	المقدمة	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقارات (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021_2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقديم المشروع 2020	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالداسات التكنولوجية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020
5	0	0	5	في طور الترافع	-	2	2	2	-		بومسلك بن خضررة سيدي مغيث، الرهيبة لخيار، راس الشجرة البليدة، بوقاع مولاي التهامي، الصف مكتب النيل، باب احسانين، سيدي مشيش، سوق الكبير، درب الشماخ	الكتاتيب القرآنية	16.2	
20	20	-	-	تم اعادة تهيئة مسجد سوق الغزل + تم اطلاق الدراسات بالنسبة لباقي المساجد	-	15	15	15	-		الزرقة، سيد مغيث سيدي الحاج احمد بنعاشر الصديق، سيدي المعطي للا غافلة، زاوية الحنصالية سيدي علي الغرناطي، لاما نانة مولي التهامي، سيدي احمد بنعمار بنعاشر الاندلسي، سوق الغزل، سيدي مشيش، للاشيبة، توهامة سيدي لحسن العايدى	المساجد	17.2	
65	15	40	10	الأشغال في طور الانجاز	-	60	60	60	-		المدينة العتيقة	تهيئة الشوارع والأفرقة بالمدينة العتيقة وترميم الواجهات	18.2	تعزيز البنية التحتية الأساسية تأهيل الفضاء العام



البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقديم المشروع 2020	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020	
للمدينة العتيقة	19.2	تهيئة مو اقف السيارات واقتناء العقارات اللازمة	*الجردة ، ملاحة نساء ، *سيدي عبدالله بن حسون ، *قصاطلة ، *السور	5	8	13	-	-	-	تم انجاز الجردة قصاطلة وال سور	-	10	40	50
للمدينة العتيقة	20.2	تهيئة الحدائق والساحات العمومية	*قصاطلة *الطريق الساحلي للمدينة العتيقة مقابل سيدى عبد الله بن حسون بباب سبتة، ساحة سوق الغزل	-	15	15	15	-	-	انجاز الدراسة	-	40	0	40
للمدينة العتيقة	21.2	تهيئة ساحة سيدى بنعاشر	فضاء سيدى بنعاشر	-	50	50	50	-	-	انجاز الدراسة من طرف الوكالة	10	40	0	50
للمدينة العتيقة	22.2	إعادة تأهيل النافورات العمومية	زناتة ، سانية بوعلو سيدى عبد الله بنحسون المدرسة ، سانية حصار، رأس الشجرة ، درب الخيار ، سوق الغزل ، سيدى امشيش ، سوق الكبير ، الصيف ، سيدى لحسن العيدى ، تبليدة ، سقاية اللبن ، مولا نوبة ، راس الموقف ، الشلالين ، باب احساين ، دار الشرع	-	5	5	5	-	-	في طور الانجاز بعد انجاز الدراسات	10	40	10	60


البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021_2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقديم المشروع 2020	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالداسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020	
	23.2	تأهيل حي الملاح		-	1,7	1,7	1,7	-		انجاز الدراسة من طرف الوكالة الاشغال ستتجز من طرف شركة الرباط التهيئة في اطار الاتفاقية تم فتح الاطرافه	40	10	0	50
تعزيزية الخدمات العامة	24.2	تحويل فندق لاركو لفضاء للتنمية والتنشيط الثقافي (قاعة للعرض، جناح للفن، ورشة التجارب)		2	10	12	12	-		صادقة المجلس على مقرر نزع الملكية ودعوة لجنة التقسيم للانعقاد	0	15	0	15
	25.2	اقتناء وتهيئة فندق الحراري		1	4	5	5	-		في طور الترافع	0	5	0	5
	26.2	تحويل مدرسة ابن تومرت الى مركز ثقافي	مدرسة ابن تومرت	-	14,5	14,5	14,5	14,5	-	في طور الانجاز	20	10	40	70
	27.2	إعادة تأهيل نظارة الأحباس	نظارة الاحباس	-	3,9	3,9	3,9	-		في طور الترافع	0	5	0	5
	28.2	تحويل الملحقة الإدارية الى ورشة لتأهيل المدينة القديمة	الملحقة الإدارية	-	1	1	1	-		في طور الترافع	0	5	0	5
	29.2	بناء مركزين للشرطة	*سوق الكبير*سيدي عبد الله بن حسون	-	1,5	1,5	1,5	-		في طور الترافع	0	5	0	5




البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021_2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقديم المشروع 2020	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالداسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020
	30.2	اقتناء وتهيئة فندق سيدى ايدرو وتحويله الى دار الشباب			2,5	13	15,5	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	31.2	إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية "إصلاح ، ترميم وتهيئة المناطق المحيطة بها"	المدينة العتيقة		-	8	8	-	تأهيل خمسة مؤسسات مع تهيئة المحيط المدرج في المشروع رقم 18	10	40	15	65
	32.2	إعادة تأهيل المؤسسات الصحية بالمدينة العتيقة أشغال الترميم ، تهيئة الفضاءات والجوانب، تجهيز المراكز وإعادة تهيئ المباني	*مركز باب الخميس *مركز باب سبتة *مركز الجردة *مركز الفضاء الصحي		-	5,5	5,5	5,5	تم تهيئة باب سبتة والجردة ومركز الفضاء الصحي	-	40	30	70
	33.2	إعادة تأهيل المؤسسة الصحية بباب الخميس	المدينة العتيقة		-	8	8	8	انجز	-	40	60	100
تعزيز البنية الاقتصادية	34.2	تهيئة ساحة دار الدباغ	المدينة العتيقة		2,5	3	5,5	-	المرحلة الثانية	-	-	-	-
	35.2	تحويل فندق الرحمة القديمة الى سوق للقرب	فندق الرحمة القديمة		2	6	8	-	في طور الدراسة	10	20	0	30



البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	المدينة العتيقة	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021_2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقديم المشروع 2020	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز 2020	
تهيئة فندق بوعودة وتحويله الى مركز لحرف الصناعة التقليدية	36.2	المدينة العتيقة	2	10	12	-	12	2021_2018	2023-2022	في طور الدراسة	10	20	0	30
اعادة تهيئة وتوسيع مركب الصناعة التقليدية والهيئة الخارجية	37.2	المدينة العتيقة	-	6	6	6	6	-	-	في طور الانجاز	10	40	30	80
بناء مقر الشرطة + الوقاية المدنية	38.2	راس الموقف	0,5	2	2,5	2,5	2,5	-	-	إنجاز الدراسة	-	10	0	10
تأهيل سوق الخضارين	39.2	المدينة العتيقة	-	3	3	3	3	-	-	في طور الترافع	5	0	0	5
بناء مركز التكوين متخصص	40.2	المدينة العتيقة	-	13	-	13	13	-	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تحويل فندق بوعلام الى دار المعلمة "البلجة"	41.2	المدينة العتيقة	6	6	6	6	6	-	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تحويل أروقة العرض التي بنيت داخل المدينة القديمة إلى أسواق مغطاة	42.2	باب المرسة	-	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	في طور الترافع	5	0	0	5
احداث فضاء لعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية	43.2	المدينة العتيقة امام مركب الصناعة التقليدية	-	5	5	5	5	-	-	الدراسة انجزت	10	30	0	40



نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات النقنية	التصديق على الاتفاقية العقار وتسوية العقار	تقديم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021_2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
40	أشغال متوقفة	30	10	انجزت الدراسة + انطلاق الأشغال + توقف بسبب وجود آثار	-	8	8	8	-	17، السوق الكبير	تحويل فندق القاعة الى تجهيز القرب (دار المعلمة السلاوية، دار الزربية)	44.2	ترميم وتأهيل الفنادق
60	20	30	10	الأشغال في طور الإنجاز من طرف مجلس العمالة	-	16	16	16	-	17، باب سبتة ، السوق الكبير	تحويل فندق التربعة ومقهى بنعاشر الى تجهيز القرب (المركب الحرف)	45.2	
20	0	0	20	في طور استصدار المرسوم النهائي لتنزيع الملكية	-	10	10	8	2	فندق زنيبر	اقتناء، إعادة التأهيل، وتحويل فندق ازنير الى دار الشباب	46.2	
5	0	0	5	إفراغ القاطنين وهدم البناء الآيلة للسقوط في انتظار بدء إجراءات مسطرة نزع الملكية	-	10	10	8	2	فندق حجي (اسباني)	اقتناء ، إعادة التأهيل، وتحويل فندق حجي الى مركز متعدد الاختصاصات	47.2	
20	10	10	-	في طور الإنجاز التوام ودار الصابون	-	20	20	15	5	المدينة العتيقة	تهيئة 3 فنادق (الأحباب)، الخضارين، دار الصابون، التوام	48.2	
50	10	30	10	تهيئة القبسايرات القيسارية المريعة انجزت + الباقي في طور الإنجاز	-	30	30	30	-	الدهابية، قبسايرية سوق الغزل السوق الكبير الحدادين النجارين	تهيئة المسارات التجارية	49.2	تهيئة الواقع الاجتماعية والاقتصادية



البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقديم المشروع 2020	النقطية وتسوية العقار	القيام بالداسات النقنية	إنجاز الأشغال	نسبة إنجاز 2020
معالجة المباني الآيلة للسقوط	50.2	تدعم وترميم 750 بناية آيلة للسقوط ودعم الإفراج المؤقت	المدينة العتيقة	187	187	187	-	-	620 مشروع في إطار اتفاقية: بناء نم اصلاح 7 بنايات و تم طلب رخص اصلاحها من طرف العمران	10	30	-	40
تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة	51.2	تهيئة المسار السياحي بباب فاس، سidi التركي، سidi لحسن العايدي، سوق الكبير، سوق الغزل، باب احساين، القصاطلة، العقبة، الجامع الكبير	-	33,5	33,5	33,5	-	-	المسار السياحي الشطر الاول 90 الشطر الثاني الدراسه والاشغال في طور الانطلاق	10	20	30	60
تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة	52.2	تمهين موقع دار البارود: تقوية الموقع الاركيولوجي	المدينة العتيقة سلا	10	10	10	-	-	مشروع متوقف بسبب وجود الحفريات	10	30	مشروع متوقف	40
تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة	53.2	تهيئة متحف التسامح بالكنيسة	المدينة العتيقة	10	10	10	-	-	في طور الترافق	5	0	0	5
تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة	54.2	المسار التفسيري للمدينة العتيقة سلا (d'interpretation circuit)	ساحة سوق الغزل	13	13	13	-	-	ادمج مع المشروع 51	-	-	-	-



مشروع ترميم وتأهيل الأسوار والأبواب والبيوت التاريخية

اسم المشروع:



ترميم الأسوار والأبراج للواجهة البحرية - غرب المدينة العتيقة (جهة بحري)

ترميم الأسوار والأبراج - السور التاريخي

ترميم وإعادة تهيئة الأبواب القديمة - باب معلقة، باب شعفة وباب سبطة

التكلفة الإجمالية: 40 مليون درهم

نسبة الإنجاز: 100 %

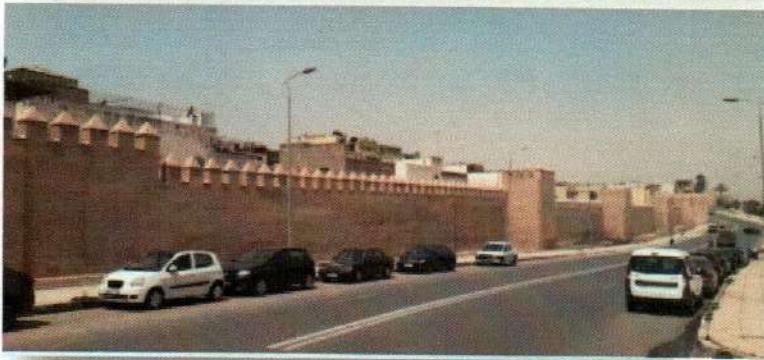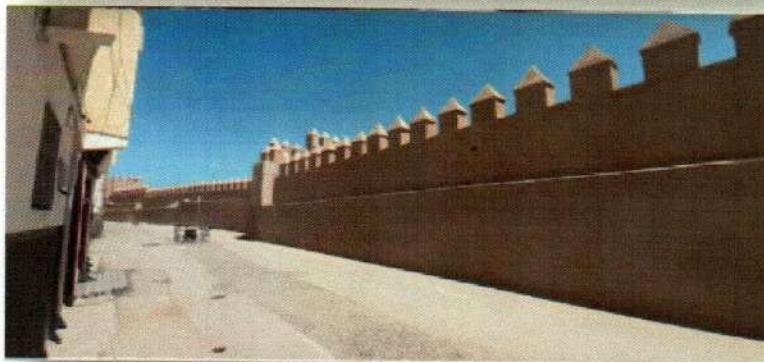

المحور الثالث : التنشيط السياحي والاقتصادي ودعم الاستثمار

تضمن المحور الثالث المتعلق بالتنشيط السياحي والاقتصادي ودعم الاستثمار 35 مشروعًا موزعة على تسعه برامج بتكلفة مالية تقدر بـ 1060 مليون درهم. إذ سيتم العمل على إنجاز 22 مشروعًا في المرحلة الأولى من البرنامج بتكلفة تقدر بـ 718 مليون درهم.

البرامج	عدد المشاريع	تكلفة عبئنة العقار	تكلفة انجاز الأشغال (مليون درهم)	تكلفة المشاريع	الكلفة للفترة 2023-2021	الكلفة للفترة 2018-2020
تطوير المرافق العامة الجماعية	2	12.00	261.00	273.00	0.00	273.00
تمهين العقار الصناعي	2	10.00	64.00	74.00	0.00	74.00
خلق فضاءات خاصة بالأنشطة الاقتصادية	1	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00
إنشاء أوراش الإنتاج والتسويق	4	18.00	34.00	52.00	22.00	30.00
إنشاء المشاريع المدرة للدخل	6	59.00	204.00	263.00	165.00	98.00
تعزيز فضاءات عرض المنتوجات اليدوية	14	24.00	74.00	98.00	59.00	39.00
تنظيم الأنشطة المزعجة والملوئة	3	0.00	40.00	40.00	15.00	25.00
البرنامج الجماعي لدعم التشغيل	2	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
تعزيز المؤهلات السياحية للمدينة	1	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
المجموع	35	123.00	937.00	1060.00	718.00	342.00



بين سنتي 2019 و 2020 لم يعرف هذا المحور تقدما ملمسا حيث انتقل عدد المشاريع المنجزة من 2 إلى 3 في حين بقي عدد المشاريع في طور الإنجاز والمشاريع في طور الدراسة ثابتة.

المرحلة الثانية	المرحلة الاولى	المجموع	2020	المرحلة الثانية	المرحلة الاولى	المجموع	2019	السنة
13	22	35		13	22	35		عدد المشاريع
0	3	3		0	2	2		المشاريع المنجزة
0	4	4		0	4	4		في طور الإنجاز
0	3	3		0	9	9		في طور الدراسة
13	12	25		13	7	20		في طور الترافق مع الشركاء
0	0	0		0	0	0		مشاريع ملغاة
13	22	35		13	22	35		المجموع




الجدول التالي تفصيل لتقديم كل مشروع من مشاريع هذا المحور:

نسبة الإنجاز	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	تقديم الإنجاز	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رمز المشروع	البرنامج
80	20	30	30	تم توقيع الاتفاقية + الأشغال في مراحلها النهائية	-	153	153	153	-	سوق الاحد أبي القنادل	بناء مجذرة	1.3	تطوير المرافق العامة الجماعية
5	0	0	5	تم تخصيصها في تصميم التهيئة الحالي	-	120	120	108	12	سلا الجديدة احصين	بناء المحطة الطرافية	2.3	
5	0	0	5	الاتفاقية في طور المصادقة من طرف المجلس	-	60	60	50	10	طريق القنيطرة	مشتل المقاولين الشباب	3.3	
100	60	40	-	انتهاء الأشغال الابناره + التففيت	-	14	14	14	-	حي الرحمة تايريك	تأهيل الحي الصناعي بتايريك	4.3	تمثين العقار الصناعي
5	0	0	5	في طور الترافق	100	100	200	200	-	تيكنوبوليس	تطوير منطقة حرة	5.3	
5	0	0	5	في طور الترافق	15	-	15	10	5	العيادة - احصاين	ورشتين للباس التقليدي (الطرزو والبلنة ...)	6.3	
5	0	0	5	في طور الترافق	15	-	15	10	5	العيادة - احصاين	ثلاث ورشات للنجارة (الفن والبناء)، النحت على الخشب والمعدن، والمجوهرات	7.3	نشاء أوراش الإنتاج والتسويق
5	0	0	5	في طور الترافق	-	15	15	10	5	العيادة	ثلاث ورشات للخزف والنقوش على الحجر والجص ..	8.3	

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار	الأشغال	المجموع	الكلفة للفترة	الكلفة للفترة	تقديم الانجاز	التصديق على	القيام	إنجاز	نسبة الانجاز
	9.3	إحداث منطقة لأنشطة الاقتصادية و الحرفية	حي مولاي اسماعيل، طريق الزربية، بطانة	3	4	7	-	7	انجز الشطر الاول والشطر الثاني في طور الاشغال النهائية	الاتفاقية تسوية	30	30	95
	10.3	مركب الأنشطة و الحرف المدرة للدخل	قرب سيدى عبد الله العيادة	15	50	65	-	65	في طور الترافق		0	0	5
	11.3	مركب الأنشطة و الحرف المدرة للدخل	تجزئة شمس العيادة	10	25	35	-	35	الاتفاقية ستعرض على المجلس للموافقة في دورة مقبلة		0	0	5
	12.3	مركب الأنشطة و الحرف المدرة للدخل	دوار حالة العيادة	24	70	94	-	94	الاتفاقية ستعرض على المجلس للموافقة في دورة مقبلة		0	0	5
إنشاء المشاريع المدرة للدخل	13.3	مركب الأنشطة و الحرف المدرة للدخل	شارع احصاين، سلا الجديدة - احصاين	10	20	30	-	30	في طور الترافق		0	0	5
	14.3	مركز تكوين الشباب (بحري)	سعید حجي، باب المریسة	-	4	4	-	4	في طور الترافق		0	0	5
	15.3	إعادة هيكلة مركب الولجة للخزافين	ضفة أبي رقراق	-	35	35	-	35	في طور الترافق		0	0	5
تعزيز قضاءات عرض المنتوجات اليدوية	16.3	أماكن العرض خلال المناسبات	باب المریسة - بطانة - تابيركت - العيادة واحصاين	5	10	15	-	15	في طور الترافق		0	0	5

البرنامج	ردم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار	الأشغال	المجموع	الكلفة للفترة	الكلفة للفترة	نقدم الانجاز	التصديق على	إنجاز	القيام	نسبة
اليدوية عرض المنتوجات تعزيز فضاءات	17.3	سوق القرب	شارع الفيدا، قطاع بدر العيادة??	0,63	2	2,63	-	2,63	في طور الترافق	الاتفاقية تسوية	الأشغال	0 0	5
	18.3	سوق القرب	حالة العيادة	0,5	3	3,5	-	3,5	في طور الترافق	5	0 0	5	
	19.3	سوق القرب	لبونطي ، المحيط العيادة	2,13	12	14,13	-	14,13	في طور الترافق	5	0 0	5	
	20.3	سوق القرب	الخروبة بطانة	2	5	7	-	7	+ الدراسة في المرحلة النهائية نزع الملكية في مرحلة استصدار المرسوم النهائي	15	0 10	25	
	21.3	سوق القرب	حي السلام بطانة	1,4	2	3,4	-	3,4	في طور الترافق	5	0 0	5	
	22.3	سوق القرب	حي السلام إضافي بطانة	1	3	4	-	4	في طور الترافق	5	0 0	5	
	23.3	سوق القرب	سيدي عبد الله العيادة	0,84	3	3,84	-	3,84	مشروع منجز	10	50 40	100	
	24.3	سوق القرب	مدخل سلا الجديدة	2	4	6	-	6	عقار معأ	20	0 0	20	
	25.3	سوق القرب ((extension	سلا الجديدة	2	4	6	-	6	الدراسة انجزت	-	0 40	40	
	26.3	سوق القرب (بشراكة مع الخواص)	حي البركة، قطاع 4 ، قرية أولاد موسى - أحصاين-	2	6	8	-	8	في طور الترافق	5	0 0	5	
المlogue تنظيم الأنشطة	27.3	سوق القرب	حي المزرعة تابريكت	1	6	7	-	7	اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص	10	0 0	10	
	28.3	سوق القرب	تابريكت الوسط	1,5	10	11,5	-	11,5	بداية الأشغال في إطار اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص	30	10 -	40	
	29.3	سوق القرب	سوق السهلي	2	4	6	-	6	في طور الترافق	5	0 0	5	
	30.3	تنظيم الأنشطة المزرعة و المlogue	الروسطالتابريكت	-	10	10	-	-	في طور الترافق	5	0 0	5	



نº	إنجاز	القيام	التصديق على	تقديم الإنجاز	الكلفة للفترة	الكلفة للفترة	المجموع	الأشغال	العقار	موقع المشروع	اسم المشروع	رمز المشروع	البرنامج
	0	0	5	في طور الترافق	15	-	15	15		سيدي الضاوي تايريك	تنظيم الأنشطة المزرعة و الملوثة	31.3	تنظيم الأنشطة المزرعة و الملوثة
	0	0	5	في طور الترافق	-	15	15	15	-	لعيادة (المحيط)	تنظيم الأنشطة المزرعة و الملوثة	32.3	
	0	0	5	في طور الترافق	-	5	5	5	-	الجامعة	المبادرة الجماعية لدعم التشغيل الذاتي	33.3	البرنامج الجماعي لدعم التشغيل
	0	0	5	اتفاقية ستعرض على المجلس في دورته المقبلة	-	5	5	5	-	الجامعة	المبادرة الجماعية لدعم التشغيل الذي الجمعيات	34.3	
	0	0	5	في طور الترافق	50	-	50	50	-	قرب محطة القطار	تعزيز البنية الفندقية	35.3	تعزيز المؤهلات السياحية للمدينة



المحور الرابع: التنمية الثقافية والرياضية ودعم التماسك الاجتماعي

المحور الرابع المتعلق بالتنمية الثقافية والرياضية ودعم التماسك الاجتماعي يضم 152 مشروعًا موزعة على ثمانية برامج بتكلفة تصل إلى 1037 مليون درهم، من المنتظر إنجاز 100 مشروع في المرحلة الأولى للبرنامج في إطار شراكات أو موارد ذاتية.

البرامج	عدد المشاريع	تكلفة العقار (ألف درهم)	تكلفة الأشغال (ألف درهم)	تكلفة المشاريع (ألف درهم)	الكلفة للفترة 2023	الكلفة للفترة 2021
تعزيز البنية الثقافية والفنية	23	44.52	197.90	242.42	136.77	105.65
تعزيز البنية الرياضية	26	72.20	168.26	240.46	86.27	154.19
المرافق متعددة التخصصات	16	32.70	131.70	164.40	75.50	88.90
تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط الاجتماعي	16	8.32	67.00	75.32	28.50	46.82
تعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية	10	9.00	45.50	54.50	36.70	17.80
تحسين ظروف السكن	1	-	125.00	125.00	125.00	-
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	39	-	78.08	78.08	72.82	5.26
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	21	2.00	54.96	56.96	40.60	16.36
المجموع	152	168.74	868.40	1037.14	602.16	434.98



بالنسبة للمحور الرابع انتقل عدد المشاريع المنجزة من 8 إلى 10 مشاريع، في حين وصل عدد المشاريع التي هي في طور الإنجاز إلى 10 مشاريعا، و8 مشاريع انطلقت فيها الدراسات.


2020			2019			السنة
المرحلة الثانية	المرحلة الاولى	المجموع	المرحلة الثانية	المرحلة الاولى	المجموع	
52	100	152	52	100	152	عدد المشاريع
0	10	10	0	8	8	المشاريع المنجزة
3	7	10	3	6	9	في طور الإنجاز
0	11	11	0	3	3	في طور الدراسة
49	62	121	49	83	132	في طور الترافق مع الشركاء
0	0	0	0	0	0	مشاريع ملغاة
52	100	152	52	100	152	المجموع




جدول تفصيلي لتقديم المشاريع بهذا المحور:

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقارات (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم الأشغال	القيم بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقيات العقارية	نسبة الانتاج %
	1.4	مجمع سوسيو تربوي ورياضي + ساحة عمومية وفضاء لألعاب الأطفال	شارع محمد الخامس قرية اولاد موسى احصانين	6	30	36	-	36	في طور الترافق	5	0	0
	2.4	مجمع سوسيو تربوي ورياضي + ساحة عمومية وفضاء لألعاب الأطفال	دوار حلالة العيادة	4	24	28	-	28	في طور الترافق	5	0	0
	3.4	مركب سوسيورياسي (صنف C)	حي المحيط العيادة	1,5	5	6,5	-	6,5	في طور الترافق	5	0	0
	4.4	مركب سوسيورياسي (صنف B)	سيدي موسى بوشنيخة بباب المريسة	4,8	3,2	8	-	8	في طور الانجاز	-	30	20
	5.4	مركب سوسيورياسي (صنف B)	سعيد حجي، باب المريسة	2,8	12	14,8	-	14,8	في طور الترافق	5	0	0
	6.4	مركب سوسيورياسي	باب سبتة، طريق المهدية، بباب المريسة	1,5	4	5,5	-	5,5	في طور الترافق	5	0	0
	7.4	مركز سوسيوثافي	قطاع سيدي عبد الله العيادة	0,63	4	4,63	-	4,63	في طور الترافق	5	0	0
	8.4	مركز سوسيوثافي	حي مولاي اسماعيل بطانة	1	4	5	-	5	في طور الترافق	5	0	0
	9.4	مركز سوسيوثافي	زاوية شارع بنكريز وشارع الوطاسيين ، بطانة	1,8	6,5	8,3	-	8,3	في طور الترافق	5	0	0

المراكم متعددة
التخصصات



نº الإنج	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات	التصديق على الاتفاقية	نقدم الأشغال	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون)	الأشغال (مليون)	العقار (مليون)	موقع المشروع	¹ مsum المشروع	رمز المشروع	البرنامج
0	0	5		في طور الترافق	-	7,5	7,5	6	1,5	حي الكفاح، قطاع 6 ، قرية اولاد موسى احصين	مركز سوسيو ثقافي	10.4	المراكم متعددة التخصصات
0	0	5		في طور الترافق	-	7,5	7,5	6,5	1	سلا الجديدة احصين	مركز سوسيو ثقافي	11.4	
0	0	5		في طور الترافق	4,35	-	4,35	4	0,35	دار الحي، سيدى موسى، باب المريرة	مركز سوسيو ثقافي	12.4	
0	0	5		في طور الترافق	8,82	-	8,82	7,5	1,32	حي الشمامو باب المريرة	مركز سوسيو ثقافي (صنف B)	13.4	
0	0	5		في طور الترافق	-	6,5	6,5	6	0,5	سعید حجي باب المريرة	مركز سوسيو ثقافي (صنف B)	14.4	
0	0	5		في طور الترافق	4	-	4	4		العيادة 1 site	مركـب سوسيو ثقافي	15.4	
0	0	5		في طور الترافق	-	9	9	5	4	بجانب مسجد البر، حي الإنبعاث، تابريكت	مركـب متعدد لإختصاصات	16.4	
0	0	5		في طور الترافق	5,94	-	5,94	5,5	0,44	قطاع النهضة شارع الصنوبر العيادة	مكتبة صنف C))	17.4	تعزيز البنية الثقافية والفنية
0	0	5		في طور الترافق	9,08	-	9,08	8	1,08	قرب سيدى عبد الله العيادة	مكتبة صنف B))	18.4	
0	0	5		في طور الترافق	-	4	4	3,5	0,5	سيدى عبد الله الشطر 3 العيادة	مكتبة صنف B))	19.4	
0	0	5		في طور الترافق	-	3,5	3,5	3	0,5	حي السلام اضافي القاعدة الجوية بطنجة	مكتبة صنف C))	20.4	
0	0	5		في طور الترافق	-	20	20	20	-	ضفة ابي رقراق	متـحف مدينة الفنون	21.4	تعزيز البنية



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون دينار)	الأشغال (مليون دينار)	المجموع (مليون دينار)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم الاشغال	القيام بالداسات	إنجاز الأشغال	نسبة الانتاج %
الثقافية والفنية	22.4	مكتبة صنف (B)	سلا الجديدة احصين	1	4,5	5,5	-	5,5	في طور الترافق	5	0	0
	23.4	بناء وتجهيز خزانات بباب شفعة	خارج باب شفعة، بباب المربيسة	0,5	3	3,5	-	3,5	في طور الترافق	5	0	0
	24.4	مكتبة صنف (D)	مجموعة مدارس لمزيري بباب المربيسة	0,15	1,3	1,45	-	1,45	في طور الترافق	5	0	0
	25.4	مكتبة صنف (D)	أمام مسجد الإمام مالك	0,08	0,8	0,88	-	0,88	في طور الترافق	5	0	0
	26.4	مكتبة صنف (C)	ابن تاشفينتابريكت	0,48	4,5	4,98	-	4,98	في طور الترافق	5	0	0
	27.4	مكتبة صنف (C)	تابريكت الوسطى	2,1	16	18,1	-	18,1	في طور الترافق	5	0	0
	28.4	مكتبة رقمية	حي مولاي اسماعيل بطانة	0,5	3	3,5	-	3,5	في طور الترافق	5	0	0
	29.4	مركز ثقافي	قطاع النهضة الحوات طريق القاعة الجوية العيادة	1,2	16,8	18	-	18	في طور الترافق	5	0	0
	30.4	مكتبة صنف (B)	سيدي عبد الله الشطر العيادة 3	0,5	4	4,5	-	4,5	في طور الترافق	5	0	0
	31.4	مركز ثقافي صنف (B)	حي السلام بطانة	1,2	7	8,2	-	8,2	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز البنية الثقافية والفنية	32.4	مركز ثقافي صنف (B)	سيدي عبد الله العيادة	0,7	10	10,7	-	10,7	في طور الترافق	5	0	0
	33.4	مركب التشغيل الثقافي والفنى دار البارود بسلا	تابریكت	4,21	16	20,21	-	20,21	تم الانتهاء من الاشغال	10	40	50
	34.4	بناء وتجهيز خزانة تابريكت تجزئة الياسمين	بناء وتجهيز خزانة	-	3,5	3,5	-	3,5	في طور التسوية الرسم العقاري 20/44243 بمساحة 258 متر مربع	20	0	20



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون)	الأشغال (مليون)	المجموع (مليون)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقطم الاشتغال	القيام بالدراسات	إنجاز الأشغال %	النسبة الاجاز %
تعزيز البنية الرياضية	35.4	مكتبة صنف (B)	شارع الأمير سيدى محمد، قرية أولاد موسى، احصاين	-	3,5	3,5	3,5	-	في طور الترافق	5	0	0
	36.4	مسرح	بطانة	6,06	50	56,06	-	56,06	الاتفاقية + انجاز الدراسات	10	40	0
	37.4	إحداث معهد موسيقي	سلا الجديدة قرب محطة البنزين احصاين	3	6	9	-	9	في طور الترافق	5	0	0
	38.4	قاعة العروض والحفلات	سيدي عبد الله الشطر العيادة 2	0,32	3	3,32	-	3,32	في طور الترافق	5	0	0
	39.4	مدرسة تعليم الفروسية التقليدية + متحف	سيدي احمدية، احصاين	20	5	25	-	25	في طور الترافق	5	0	0
	40.4	قطب رياضي متعدد الاختصاصات	قطاع القدس العيادة	3	12	15	-	15	في طور الترافق	5	0	0
	41.4	ملعب رياضي (4 وحدات)	حي العسكري العيادة	-	4	4	-	4	في طور الترافق	5	0	0
	42.4	ملعب رياضي (2 وحدات)	حي السلام بطانة	1,5	2	3,5	-	3,5	في طور الترافق	5	0	0
	43.4	ملعب رياضي (3 وحدات)	حي الصفاء، قطاع 3، امام اعدادية الإمام مالك، احصاين	3,6	2,4	6	-	6	في طور الترافق	5	0	0
	44.4	ملعب رياضي (3 وحدات)	شارع الزربية تجزئة المعمورة احصاين	3,6	2,4	6	-	6	انجاز ملعب واحد	—	10	10
تعزيز البنية الرياضية	45.4	ملعب رياضي (4 وحدات)	جزء من اعدادية عقبة سيدى موسى باب المريسة	2,8	3	5,8	-	5,8	انجز 2 ملاعب	—	20	30
	46.4	ملعب رياضي + ساحة عمومية	الطريق الساحلي، سيدى موسى باب المريسة	2,88	2	4,88	-	4,88	في طور الترافق	5	0	0



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون)	الأشغال (مليون)	المجموع (مليون)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم الاشتغال	الاتفاقية على الاتساعات	القيام بالادسات	إنجاز الأشغال	% الانجاز
	47.4	ملعب رياضي (2) وحدات	الكورنيش امام اليقطة، باب المريسة	2,64	1,6	4,24	-	4,24	في طور الترافق	5	0	0	5
	48.4	ملعب رياضي (2) وحدات + ساحة عمومية	معلم كوكاكولا سابقا، حي اشماعو، باب المريسة	1,5	2,5	4	-		في طور الترافق	5	0	0	5
	49.4	قاعة مغطاة العيادة		4,8	10	14,8	-		في طور الترافق	5	0	0	5
	50.4	مسبّح مغطى العيادة		3,6	6	9,6	-		في طور الترافق	5	0	0	5
	51.4	ملعب رياضية مختلفة العيادة		4,8	4	8,8	-		في طور الترافق	5	0	0	5
	52.4	ملعب رياضي (2) وحدات	قطاع "E" قرب المسيح البلدي تايريك	1,5	2	3,5	-		في طور الترافق	5	0	0	5
	53.4	ملعب رياضي تايريك	داخل مدرسة الوحدة تايريك	1,2	2	3,2	-		في طور الانجاز	-	-	10	10
	54.4	ملعب رياضي (2) وحدات	شارع واد الرمان و شارع ابن الهيثم حي الانبعاث تايريك	2,4	1,6	4	-		في طور الترافق	5	0	0	5
	55.4	قاعة مغطاة العيادة 2	سيدي عبد الله الشطر	0,75	8	8,75	-	8,75	+ اتفاقية + الدراسات + بداية الأشغال	10	30	20	60
	56.4	قاعة مغطاة القاعدة الجوية العيادة	قطاع النهضة طريق القاعدة الجوية العيادة	3,6	12	15,6	-	15,6	في طور الترافق	5	0	0	5
	57.4	قاعة مغطاة (فنون الحرب)	تجزئة اليسري و الزرقاء، باب المريسة	1,54	10	11,54	-		انجزت	10	40	50	100
	58.4	قاعة لفنون الحرب + دار الشباب	قطاع "C" شارع على ابن أبي طالب تايريك	0,36	3	3,36	-		في طور الترافق	5	0	0	5
	59.4	مسبّح مغطى العيادة	حي المحيط الجزارة	2	10	12	-		في طور الترافق	5	0	0	5
	60.4	ملعب رياضي و مسبّح مغطى	حي السلام الاضافي القاعدة الجوية	2	10	12	-		في طور الترافق	5	0	0	5

تعزيز البنية
الرياضية



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون \$)	الأشغال (مليون \$)	المجموع (مليون \$)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم الاشتغال	التصديق على الاتفاقية	القيام بالداسات	إنجاز الأشغال %	نسبة الانجاز %
تعزيز البنية الرياضية	61.4	مسجد مغطى	ضريح سيدى موسى باب المريسة	1,64	8,38	10,02	-	10,02	في طور الترافق	5	0	0	5
	62.4	قاعة مغطاة	تابريكت الوسطى	1,05	9,88	10,93	-	-	+ اتفاقية + الدراسات + بداية الأشغال	10	40	15	65
	63.4	مسجد في الهواء الطلق	الكورنيش مدرسة المزيري بباب المريسة	1,44	3,5	4,94	-	4,94	في طور الترافق	5	0	0	5
	64.4	بناء مركب للألعاب المائية	الكورنيش بباب المريسة	18	32	50	-	50	في طور الترافق	5	0	0	5
	65.4	تأهيل وتجهيز القاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي	بطانة	-	4	4	4	-	تم الانجاز والتجهيزات	10	40	30	80
	66.4	دار الشباب	شارع النصر، قطاع النهضة - العيادة -	0,6	5	5,6	-	5,6	في طور الترافق	5	0	0	5
تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط الاجتماعي	67.4	دار الشباب	كاريان الواد - العيادة -	0,5	3	3,5	-	3,5	في طور الترافق	5	0	0	5
	68.4	دار الشباب	سيدي عبد الله الشطر العيادة 4	0,44	4,5	4,94	-	4,94	في طور الترافق	5	0	0	5
	69.4	دار الشباب	بطانة	0,77	4	4,77	-	4,77	في طور الترافق	5	0	0	5
	70.4	دار الشباب	حي السلام ، بطانة	-	8	8	-	8	في طور الترافق	5	0	0	5
	71.4	دار الشباب	حي السلام بطانة	0,7	4,5	5,2	-	5,2	في طور الترافق	5	0	0	5
	72.4	دار الشباب و نادي نسوي	سعيد حجي لمريسة	1	3	4	-	4	مشروع متوقف	-	40	-	40
تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط الاجتماعي	73.4	مركز رعاية المكفوفين	قطاع "د" حي الرحمة - تابريكت -	-	4,5	4,5	-	4,5	في طور الانجاز	10	40	30	80
	74.4	مركز تنمية الشباب	قطاع القدس قطعة رقم 58 - العيادة -	0,45	5	5,45	-	5,45	في طور الترافق	5	0	0	5
	75.4	نادي نسوي وحضانة	سيدي عبد الله الشطر العيادة 3	0,5	4,5	5	-	5	في طور الترافق	5	0	0	5



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون)	المجموع (مليون)	الأشغال (مليون)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم الأشغال	القيام بالdasات	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز
	76.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	بطانة	0,77	4,77	4	-	4,77	في طور الترافق	5	0	0
	77.4	نادي نسوي وحضرانة	زاوية شارع بنكريز وشارع الوطاسيين بطانة	0,96	5,96	5	-	5,96	في طور الترافق	5	0	0
	78.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	شارع الشرفاء تجزئة ياسمينة تابريكت	1	4	3	-	4	تبعدة العقار	20	0	0
	79.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	قرب مسجد محمد السادس الفروكي الصغير تابريكت	-	3	3	3	-	في طور الترافق	5	0	0
	80.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	قطاع " DAL " حي الرحمة الجزء المتبقى من (A11PA2017)	0,5	4,5	4	-	4,5	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط الاجتماعي	81.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	تجزئة ابن عمر - باب المرисية	0,13	2,13	2	-	2,13	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية	82.4	مركز إستقبال المسنين	حي مولاي اسماعيل بطانة	2	7	5	-	7	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية	83.4	دار الایتمام	بطانة	4,8	12,8	8	-	12,8	في طور الترافق	5	0	0




البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون دينار)	الأشغال (مليون دينار)	المجموع (مليون دينار)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم الاشتغال	التصديق على الاتفاقية	القيام بالداسات	إنجاز الأشغال	نسبة الاتجاه
30	84.4	مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة	شارع محمد الخامس، تجزئة العوفير، قرية اولاد موسى احصين	0,5	2,5	3	-	-	الدراسة في المرحلة النهائية	-	30	0	30
5	85.4	مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة	شارع المرابطين، قرب مسجد الحجي، تايريك	1	5	6	-	-	في طور الترافع	5	0	0	5
55	86.4	مركز رعاية المعاقين	قرب قاعة لغرابلية باب المريسة	0,7	5	5,7	-	-	في طور الانجاز	-	40	15	40
5	87.4	مركز متعدد الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة	باب المريسة	-	5	5	-	5	في طور الترافع	5	0	0	5
5	88.4	مركز رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	العيادة	-	5	5	-	-	في طور الترافع	5	0	0	5
100	89.4	مركز إيواء الأشخاص المسنين لبورمادة	بورمادة باب المريسة	-	7	7	-	-	انتهت الاشتغال	10	40	50	40
100	90.4	مركز المساعدة الاجتماعية CAS	الطريق الساحلي، سيدى موسى قرب الجوطية، باب المريسة	-	1,5	1,5	-	-	مشروع منجز	10	40	50	40
5	91.4	مركز استقبال وتوجيه الاشخاص في وضعية إعاقة COAPH	طريق الساحلي، سيدى موسى قرب الجوطية، باب المريسة	-	1,5	1,5	-	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	92.4	تحسين ظروف السكن	الجامعة	-	125	125	-	125	في طور التنفيذ	-	-	-	-



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون)	الأشغال (مليون)	المجموع (مليون)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نظام الاشتغال	التصديق على الاتفاقية	القيام بالداسات	إنجاز الأشغال %
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	93.4	مشروع بناء ثانوية العيادة	E15	-	8	8	8	-	في طور الترافق	5	0	0
	94.4	مشروع بناء ثانوية احصين	احصين	-	8	8	8	-	في طور الترافق	5	0	0
	95.4	مشروع بناء مدرسة ابتدائية بـ العيادة		-	7	7	7	-	أنجزت الدراسات الطبوغرافية وراسلت المديرية الإقليمية لسلا الوزارة لرصد اعتمادات اقتناة الوعاء العقاري	10	0	10
	96.4	توسيع مدرسة البحترى	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الدراسات في طور المصادقة	-	0	10
	97.4	توسيع مدرسة خديجة أم المؤمنين	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	98.4	توسيع مدرسة اشبيلية	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	99.4	توسيع إعدادية عبدالعزيز أمين	العيادة	-	0,46	0,46	0,46	-	انتهت أشغال توسيع المؤسسة	-	60	40
	100.4	توسيع الثانوية التأهيلية أحمد شوقي	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	101.4	توسيع الثانوية التأهيلية ابن هاني	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الدراسات في طور المصادقة	-	0	10
	102.4	توسيع الثانوية التأهيلية أم الربيع	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	103.4	توسيع إعدادية عبدالملك السعدي	تابيركت	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	104.4	توسيع الثانوية التأهيلية جمال النرة	باب المريرة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون)	الأشغال (مليون)	المجموع (مليون)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نظام الأشغال	القيام بالdasas	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	105.4	توسيع الثانوية التأهيلية عبد الرحيم بو عبيد	باب المريسة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	106.4	توسيع إعدادية الحزام الأخضر	احصين	-	1,38	1,38	1,38	-	في طور الترافق	5	0	0
	107.4	توسيع الثانوية التأهيلية المنظر الجميل	احصين	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الأشغال في طور الإعداد سيتم الإعلان عن طلب العروض في شهر أبريل	-	40	0
	108.4	توسيع الثانوية التأهيلية محمد السادس	احصين	-	0,46	0,46	0,46	-	في طور الترافق	5	0	0
	109.4	توسيع مدرسة احصين	احصين	-	1,22	1,22	1,22	-	في طور الترافق	5	0	0
	110.4	تعزيز المفكرة بإعدادية العلامة محمد بن علي الدكالي	العيادة	-	2,83	2,83	2,83	-	انتهت أشغال تعويض المفكرة بالمؤسسة	-	60	40
	111.4	تعزيز المفكرة بمدرسة الوديع الاسفي	العيادة	-	1,62	1,62	1,62	-	صفقة الأشغال في طور المصادقة	-	0	40
	112.4	تعزيز المفكرة بمدرسة أبي بكر الصديق	العيادة	-	0,82	0,82	0,82	-	صفقة الأشغال في طور المصادقة	-	0	40
	113.4	احداث مدرسة ابتدائية سعيد حجي	لمريسة	-	7	7	7	-	في طور الترافق	5	0	0
	114.4	مشروع بناء ثانوية العيادة E15	العيادة	-	8	8	8	-	في طور الترافق	5	0	0
	115.4	مشروع بناء ثانوية احصين	احصين	-	8	8	8	-	في طور الترافق	5	0	0
	116.4	توسيع مدرسة البحترى	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الدراسات في طور المصادقة	-	10	0

تعزيز وتأهيل
البنية التعليمية



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار مليون	الأشغال مليون	المجموع مليون	الكلفة للفترة 2018-2021	الكلفة للفترة 2022-2023	نقدم الاشغال	التصديق على الاتفاقية	القيام بالادسات	إنجاز الأشغال %
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	117.4	توسيع مدرسة خديجة أم المؤمنين	العيادة	-	0,92	0,92	-	-	في طور الترافق	5	0	0
	118.4	توسيع مدرسة اشبيلية	العيادة	-	0,92	0,92	-	-	في طور الترافق	5	0	0
	119.4	توسيع إعدادية عبدالعزيز أمين	العيادة	-	0,46	0,46	0,46	-	انتهت أشغال توسيع المؤسسة	-	60	40
	120.4	توسيع إعدادية محمد بن علي الدكالي	العيادة	-	0,46	0,46	0,46	-	في طور الترافق	5	0	0
	121.4	توسيع الثانوية التأهيلية أحمد شوقي	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	122.4	توسيع الثانوية التأهيلية ابن هاني	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الدراسات في طور المصادقة	-	0	10
	123.4	توسيع الثانوية التأهيلية أم الربيع	العيادة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	124.4	توسيع إعدادية عبدالملك السعدي	تابريكت	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	125.4	توسيع الثانوية التأهيلية جمال الذرة	باب المرissa	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	126.4	توسيع الثانوية التأهيلية عبد الرحيم بو عبيد	باب المرissa	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	127.4	توسيع إعدادية الحزام الأخضر	احصين	-	1,38	1,38	1,38	-	في طور الترافق	5	0	0
	128.4	توسيع إعدادية الإمام مالك	احصين	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافق	5	0	0
	129.4	توسيع الثانوية التأهيلية المنظر الجميل	احصين	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الأشغال في طور الإعداد سيتم الإعلان عن طلب العروض في شهر أبريل	-	40	0




البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون دينار)	الأشغال (مليون دينار)	المجموع (مليون دينار)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم الاشتغال	الصادق على الاتفاقية	القيام بالdasas	إنجاز الأشغال %
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	130.4	توسيع الثانوية التأهيلية محمد السادس	احصين	-	0,46	0,46	0,46	-	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	131.4	توسيع مدرسة احصين	احصين	-	1,22	1,22	1,22	-	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	132.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري لتشخيص داء السل (مستوى 1)	ساحة باب الخميس باب المريسة	-	3,76	3,76	3,76	-	انجز	-	60	40
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	133.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري حي الرحمة (مستوى 2)	حي الرحمة تابريكت	-	2,2	2,2	2,2	-	مشروع منجر	-	60	40
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	134.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري ابن سينا (مستوى 1)	شارع محمد حصار سلا الجديدة احصين	-	1,3	1,3	1,3	-	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	135.4	إعادة بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري سidi احمدية (مستوى 1)	Sidi احمدية 28 احصين	-	2,4	2,4	2,4	-	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	136.4	إعادة بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري احصين (مستوى 1)	شارع الزربية 26 احصين	-	3	3	3	-	في طور الترافق	5	0	0
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	137.4	بناء وتجهيز مركز صحي حي الرحمة (مستوى 2)	حي الرحمة تابريكت	-	3	3	3	-	في طور الانجاز	-	30	40
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	138.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري ابن الهيثم (مستوى 2)	العيادة	-	1,6	1,6	1,6	-	في طور الترافق	5	0	0

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون)	الأشغال (مليون)	المجموع (مليون)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم الاشتغال	التصديق على الاتفاقية	القيام بالداسات	إنجاز الأشغال %	نسبة الانتاج %
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	139.4	بناء وتجهيز مركز صحي أبواب سلا	العيادة	-	3,2	3,2	3,2	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	140.4	بناء وتجهيز مركز صحي حي الانبعاث (مستوى 1)	حي الانبعاث تايريك	-	3,4	3,4	3,4	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	141.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري حي مولاي اسماعيل (مستوى 1)	حي مولاي اسماعيل بطانة	-	2	2	2	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	142.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري عبد الرحيم بو عبيد بطانة (مستوى 1)	شارع عبد الرحيم بو عبيد بطانة	-	1,6	1,6	1,6	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	143.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري حي الكفاح قرية اولاد موسى S25 احصين (مستوى 2)	حي الكفاح قرية اولاد موسى 525 احصين	-	1,6	1,6	1,6	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	144.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري العيادة	أرض بمنعاشر العيادة	-	1,6	1,6	1,6	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	145.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري سيدى عبد الله العيادة	سيدي عبد الله العيادة	-	1	1	1	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	146.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري قرية اولاد موسى (مستوى 2)	قرية اولاد موسى احصين	-	2,5	2,5	2,5	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	147.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري سعيد حجي حاجي (مستوى 1)	تجزئة سعيد حجي باب المريسة	-	1,1	1,1	1,1	-	في طور الترافق	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون دينار)	الأشغال (مليون دينار)	المجموع (مليون دينار)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم الاشغال	الصادق على الاتفاقيه	القيام بالداسات	إنجاز الأشغال %	نسبة الانجاز %
	148.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري بسلا الجديدة (مستوى 1)	شارع محمد حصار سلا الجديدة احصين	-	3	3	3	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	149.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري بباب الخميس (مستوى 1) وتحويله الى مركز الترويض الطبي وتقديم العظام وتصحيح النطق ومعدات العظام	شارع 2 مارس باب الخميس باب المريسة	-	8	8	8	-	انجز	-	60	40	100
	150.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري السواني (مستوى 1)	زنقة 2 تجزئة الرباطية سidi موسى بباب S4 المريسة	-	1,3	1,3	1,3	-	في طور الترافق	5	0	0	5
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	151.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري بطانة (مستوى 1)	شارع مديونة S17 بطانة	-	1,4	1,4	1,4	-	في طور الترافق	5	0	0	5
	152.4	مركز صحي متخصص	سلا	-	8	8	6	2	في طور الترافق	5	0	0	5



مشروع: إيواء الأشخاص المسنين لبور مادة

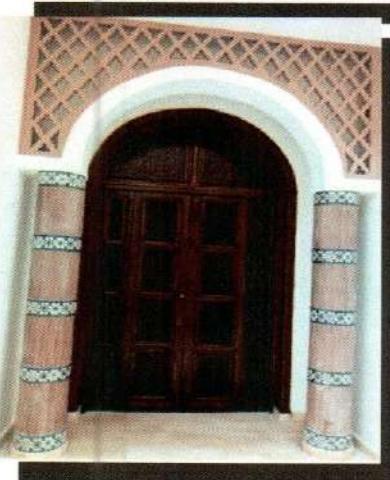

- مركز من طابق تحت أرضي، وطابقين سفلي وعلوي
- الفئة المستهدفة: الأشخاص المسنون - إيواء دار الطالب ومرافق اجتماعية أخرى
- موقع المشروع: لمريسة
- الرسم العقاري: 25610/ر
- مساحة العقار: 954 متر مربع
- تكلفة المشروع: 5200000 درهم
- تقدم الأشغال: 100 % (مشروع منجز)



المحور الخامس: المشاريع المهيكلة

خصص المحور الخامس للمشاريع المهيكلة ويضم 11 مشروعًا موقعة مقسمة على ثلاثة برامج بقيمة مالية تصل إلى 5062 مليون درهم.

البرامج	عدد المشاريع	تكلفة تعبيئة العقار	تكلفة إنجاز الأشغال	تكلفة المشاريع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2020 -2018	الكلفة للفترة 2023 -2021
إنجاز مراكز حضورية جديدة	6	804.24	3108.50	3912.74	668.64	3244.10
إنجاز مراافق كبرى	3	70.00	630.00	700.00	370.00	330.00
تطوير التنقل	2	-	450.00	450.00	450.00	-
المجموع	11	874.24	4188.50	5062.74	1488.64	3574.10

تكتسي المشاريع المهيكلة أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف التنموية المسطرة من طرف المجلس الجماعي في برنامج العمل، وقد تمكنت مدينة سلا من الاستفادة من مشروع مهيكل كبير حضي بالتفاتة مولوية كريمة من خلال إشرافه الشخصي على إعطاء انطلاقة الأشغال به، حيث بلغت الأشغال فيه خلال هذه السنة مراحلها النهائية.

مشروع تهيئة سوق الصالحين بمقاطعة تابريكت يروم النهوض بظروف اشتغال التجار، والعمل على استقرار الباعة المتجولين، والقضاء على البناءيات العشوائية، وتحرير الطرق والفضاءات العمومية، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري.

كما يتوجى هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 23 هكتار، النهوض بالاقتصاد التضامني، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، وتطوير بنية المدينة الاقتصادية والتجارية.

وستهم أشغال التهيئة بناء مركب تجاري (968 محل تجاري)، وإنجاز سوق مركزي (391 محل تجاري)، وتهيئة وتسييق تجزئة سكنية، وإنجاز ملعب للقرب (4 ملاعب لكرة القدم المصغرة، وملعبان لكرة السلة، ومصمار للتزلج)، وأكشاك لبيع الزهور والعصافير، وتهيئة فضاءات خضراء، وأماكن مخصصة لركن السيارات.



وسينجز هذا المشروع، الذي عهد بإنجازه لشركة "الرباط الجهة للهيئة"، في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعمالة سلا عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجماعة سلا.

المرحلة الثانية	2020			2019			السنة
	المرحلة الاولى	المجموع	المرحلة الثانية	المرحلة الاولى	المجموع		
6	5	11	6	5	11	عدد المشاريع	
0	1	1	0	1	1	المشاريع المنجزة	
0	0	0	0	0	0	في طور الانجاز	
0	0	0	0	0	0	في طور الدراسة	
						في طور الترافق مع الشركاء	
6	4	10	6	4	10	الشركاء	
0	0	0	0	0	0	مشاريع ملحة	
6	5	11	6	5	11	المجموع	



فيما يلي جدول تفصيلي لتقدم كل مشروع في هذا المحور:

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقديم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالداسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %		
إنجاز مراكز حضرية جديدة	1.5	مشروع حضري متكملاً "سوق الصالحين"	سوق الصالحين - تابريكت	113,64	305	418,64	-	418,64	إنجاز المشروع	تسوية العقار	الصادقية على	إنجاز الأشغال	30	40	100
	2.5	مشروع حضري متكملاً "حي السلام"	حي السلام - بطانة	49,1	950	999,1	-	999,1	في طور الترافق	تسوية العقار	الصادقية على	إنجاز الأشغال	5	0	5
	3.5	مشروع حضري متكملاً "يوبكر اعمار"	طريق مكناس - بطانة	240	430	670	-	670	في طور الترافق	تسوية العقار	الصادقية على	إنجاز الأشغال	5	0	0
	4.5	مشروع حضري متكملاً "طريق القنيطرة"	طريق القنيطرة - باب المريسة	300	912	212,00 1	-	1212	في طور الترافق	تسوية العقار	الصادقية على	إنجاز الأشغال	5	0	0
	5.5	مشروع حضري متكملاً "حي الرحمة"	حي الرحمة - تابريكت	51,5	55	106,5	-	106,5	في طور الترافق	تسوية العقار	الصادقية على	إنجاز الأشغال	5	0	0
	6.5	مشروع حضري متكملاً "باب سبتة"	باب المريسة	50	456,5	506,5	250	256,5	في طور الترافق	تسوية العقار	الصادقية على	إنجاز الأشغال	5	0	0
	7.5	المركب الرياضي	سيدي احمدية سلا الجديدة - احصاين	20	250	270	-	-	في طور الترافق	تسوية العقار	الصادقية على	إنجاز الأشغال	5	0	0
	8.5	المدينة الدولية للرياضات	سيدي احمدية سلا الجديدة - احصاين	50	280	330	-	330	في طور الترافق	تسوية العقار	الصادقية على	إنجاز الأشغال	5	0	0



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نسبة إنجاز الأشغال (%)	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	نقدم المشروع
5	0	0	5	في طور الترافق	-	100.00	100.00	100.00	-	السلسلة الثالثة ضفة أبي رفاق	تهيئة موقع مدينة الطفل	9.5
5	0	0	5	في طور الترافق	-	200.00	200.00	200.00	-	بين باب بوحاجة بسلا وباب البحر بالرباط	الربط بين المدينتين العتيقتين الرباط وسلا (الجسر خاص برجالين)، تهيئة شارع الجيش الملكي، إعادة تأهيل ساحة باب بوحاجة ()	10.5
5	0	0	5	في طور الترافق	-	250.00	250.00	250.00	-	باب فاس ، طريق القنيطرة	مشروع حضري "باب فاس"	11.5



المحور السادس: التدبير الجماعي

المحور السادس المتعلقة بالتدبير الجماعي يضم 35 مشروعًا لتطوير وتحديث التدبير الجماعي وتأهيل المراقبة الجماعية والبنيات الإدارية، وتعزيز التشاور والتواصل والتعاون. تقدر تكلفته بـ 340 مليون درهم.

البرامج	عدد المشاريع	كلفة تعبئة العقار	كلفة إنجاز الأشغال	كلفة المشاريع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2020-2018	الكلفة للفترة 2023-2021
تطوير وتحديث التدبير الجماعي	10	-	71.10	71.10	35.70	35.40
تأهيل المراقبة الجماعية	9	56.57	57.40	113.97	113.97	0.00
تأهيل المباني الإدارية	13	20.84	127.70	148.54	98.71	49.83
تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة	3	-	7.00	7.00	4.00	3.00
المجموع	35	77.41	263.20	340.61	252.38	88.23

بخصوص هذا المحور انتقل عدد المشاريع التي انطلقت بها الأشغال بين سنتي 2019 و 2020 من مشروع واحد إلى 5 مشاريع، في حين سبعة مشاريع ما زالت الدراسة مستمرة بها.

2020			2019			السنة
المرحلة الثانية	المرحلة الاولى	المجموع	المرحلة الثانية	المرحلة الاولى	المجموع	
14	21	35	14	21	35	عدد المشاريع
0	12	12	0	12	12	المشاريع المنجزة
1	4	5	1	0	1	في طور الانجاز
2	5	7	2	9	11	في طور الدراسة
11	0	11	11	0	11	في طور الترافق مع الشركاء
0	0	0	0	0	0	مشاريع ملغاة
14	21	35	14	21	35	المجموع

فيما يلي جدول تفصيلي لتقديم كل مشروع من المشاريع المتعلقة بهذا المحور:

نسبة الاجاز %	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات النقية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	تقديم المشروع	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رمز المشروع	البرنامج
100	60	40	-	إنجاز المشروع	-	11,05	11,05	10	1,05	طريق القاعدة الجوية العيادة	مقر المقاطعة	1.6	تأهيل المباني الإدارية
10	0	0	10	تم تعبئة العقار	10,7	-	10,7	10	0,7	نهاية الترامواي حي السلام بطانة	مقر المقاطعة	2.6	
30	0	0	30	في طور الإنجاز	14	-	14	10	4	تابريكت الوسطى تابريكت	مقر المقاطعة	3.6	
100	-	-	-	مشروع منجز	-	0,4	0,4	0,2	0,2	مرزوقه - الشرف باب المريسة	مقر المقاطعة	4.6	
100	-	-	-	مشروع منجز	-	0,5	0,5	0,5	-	سوق حي المزرعة تابريكت	ملحقة المقاطعة	5.6	
5	0	0	5	في طور الترافق	-	2,71	2,71	2,5	0,21	قرب إقامة النسيم. قطاع "E" تابريكت	ملحقة المقاطعة	6.6	
5	0	0	5	في طور الترافق	3,36	-	3,36	3	0,36	حي الموحدين تابريكت	ملحقة المقاطعة	7.6	
30	0	30	-	اختبار المهندس المعماري عن طريق المبارأة + التصميم المعمارية جاهزة + العقدة في طور التأشير	14,48	-	14,48	10	4,48	حي كريمة أمام المستودع البلدي تابريكت	المكتب البلدي للصحة	8.6	




تأهيل
المباني
الإدارية

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون دينار)	الأشغال (مليون دينار)	المجموع (مليون دينار)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	التفاقيه تسوية	القيم بالدراسات	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز
تأهيل المباني الإدارية	9.6	مقر الجماعة	باب بوحاجة باب لمريسة	6,26	60	66,26	66,26	-	في طور تسوية العقار مع الفلاحة	10	0	0
	10.6	مقاطعة الشرطة وملحقة المقاطعة	قطاع 6، حي الكفاح ، قرية اولاد موسى احسانين	0,99	6,3	7,29	-	7,29	في طور الترافع	5	0	0
	11.6	مركز الشرطة حي الرحمة سكتور واو	"E" قطاع السانيةتابيريك	-	4	4	4	-	في طور الترافع	5	0	0
	12.6	تأهيل وتوسيع المستودع الجماعي	تابيريك	2,58	10	12,58	12,58	-	انجزت الدراسة + تم إطلاق صفة الاشغال في طور التأشير	-	0	40
	13.6	بناء مستودع العيادة	توسيع المستودع	-	1,2	1,2	1,2	-	إنجاز المشروع	-	40	60
	14.6	تهيئة مقبرة لدفن أموات المسلمين	السهول ؟ سيدني حميده	30	10	40	40	-	تمت الموافقة على اتفاقية بين الجماعة وجماعة السهول لادخال مقبرة مشتركة + في طور اقتناء العقار	10	0	0
تأهيل المرافق الجماعية	15.6	تهيئة مقبرة لدفن أموات المسلمين	عامر	20	10	30	30	-	في طور الترافع مع جماعة عامر لاقتناء العقار	5	0	0



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون)	الأشغال (مليون)	المجموع (مليون)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	التفاقيه تسوية	القيام بالدراسات	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز
	16.6	تهيئة مقبرة لدفن أموات المسلمين "عنق الجمل"	ضفة أبي رراق	-	5	5	-	-	مرحلة تغيير التنطبق للمنطقة المجاورة للمقبرة القائمة تابعة للنفود الترابي لوكالة تهيئة ضفتي أبي رراق + تم وضع جزء من العقار رهن اشارة الجماعة	10	0	0
	17.6	تأهيل المجازر	سيدي موسى لمريسة	-	1,5	1,5	1,5	-	إنجاز المشروع	60	40	100
	18.6	تأهيل سوق الجملة	طريق القبيطرة لمريسة	-	1,5	1,5	1,5	-	في طور البرمجة المالية	0	0	10
	19.6	بناء رحبة الحبوب	طريق القبيطرة لمريسة	-	12,17	12,17	5,6	6,57	مشروع منجز	40	40	100
	20.6	تأهيل المحجز البلدي	لعيادة	-	1,2	1,2	1,2	-	مشروع منجز	40	40	100
	21.6	تأهيل وإعادة هيكلة الأسواق الجماعية	الجماعة	-	20	20	20	-	في طور البرمجة المالية	0	0	10
	22.6	مستودع الحيوانات الضالة	غابة سلا الجدية	-	2,6	2,6	2,6	-	تم ابرام الاتفاقية مع الجمعية وفي طور تسوية العقار مع المياه والغازات	0	0	10
	23.6	شراء السيارات والآليات	جميع مقاطعات جماعة سلا	-	7	7	7	-	المرحلة الثانية من البرنامج	-	-	-
	24.6	شراء السيارات والآليات	الجماعة	-	15	15	15	-	المرحلة الثانية من البرنامج	-	-	-



نسبة الانجاز (%)	الاجاز الشاغل	القيام بالدراسات	التصديق على الاتفاقية تسوية	تقديم المشروع	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون)	الأشغال (مليون)	العقار (مليون)	موقع المشروع	اسم المشروع	رمز المشروع	البرنامج
-	-	-	-	المرحلة الثانية من البرنامج	3,6	2,4	6	6	-	الجامعة	شراء عتاد للتزيين	25.6	
-	-	-	-	المرحلة الثانية من البرنامج	4,8	4,8	9,6	9,6	-	الجامعة	شراء اثاث المكتب	26.6	
10	0	10	-	مخطط السير بالمدينة العتيقة في طور الدراسة	-	2	2	2	-	الجامعة	مخطط السير و الجولان بمدينة سلا	27.6	
40	20	20	-	تم اطلاق الشطر الاول المتعلق بإنجاز اربعة تطبيقات بكلفة 900 ألف درهم	5	5	10	10	-	الجامعة	التطبيقات المعلوماتية	28.6	
40	20	20	-	تم اقتناة الشطر الاول بقيمة 900 ألف درهم	2	4	6	6	-	الجامعة	اقتناء و تثبيت العتاد والشبكات المعلوماتية	29.6	
-	-	-	-	المرحلة الثانية من البرنامج	5	5	10	10	-	الجامعة	تثبيت نظام المعلومات الجغرافي لجماعة سلا	30.6	
-	-	-	-	المرحلة الثانية من البرنامج	3	5	5	-	الجامعة	التدبير الإلكتروني للوثائق GED	تطوير وتحديث التدبير الجماعي	31.6	تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة
100	60	40	-	إنجاز المشروع	0,5	0,5	0,5	-	الجامعة	تأهيل المكتب الصحي وإحداث الشباك الوحيد	تطوير وتحديث التدبير الجماعي	32.6	



البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون)	الأشغال (مليون)	المجموع (مليون)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	نقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية بالدراسات	القيام بالأشغال	إنجاز الأنجاز	نسبة الأنجاز
	33.6	تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة	إعداد أدوات ووسائل التواصل	الجامعة	-	3	3	2	تم انجاز الهوية البصرية ومجموعة من وسائل التواصل	-	10	10	20
	34.6	تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة	مشروع الخميس التشاروي	الجامعة	-	2	2	1	إنجاز المشروع	10	40	50	100
	35.6	تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة	تعزيز التعاون مع المدن الوطنية و الدولية	الجامعة	-	2	2	1	عقد لقاء جهوي ووطني	-	-	-	60



التدبير الجماعي: تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة

وضع آلية تشاركية للتشاور والحوار: الخميس التشاوري لسلا

تنظيم لقاءات عمومية شهرية 17 لقاء

تنظيم لقاء جهوي بشراكة مع وزارة المجتمع المدني



تنظيم أول لقاء وطني للتشاور العمومي (بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

والعلاقات مع البرلمان، رئيس جماعة سلا، رئيس اللجنة الوطنية للحوار، رؤساء وأعضاء عدد

من مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من مختلف ربوع المملكة، بالإضافة عدد

من ممثلي المصالح اللاممركزة للإدارات المركزية وجمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام،

وجمهور من المواطنات والمواطنين)

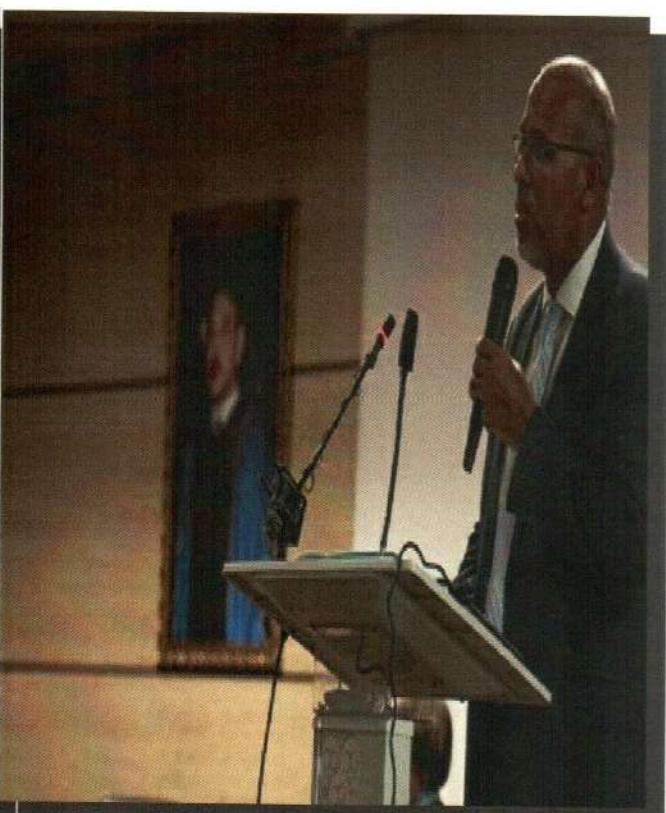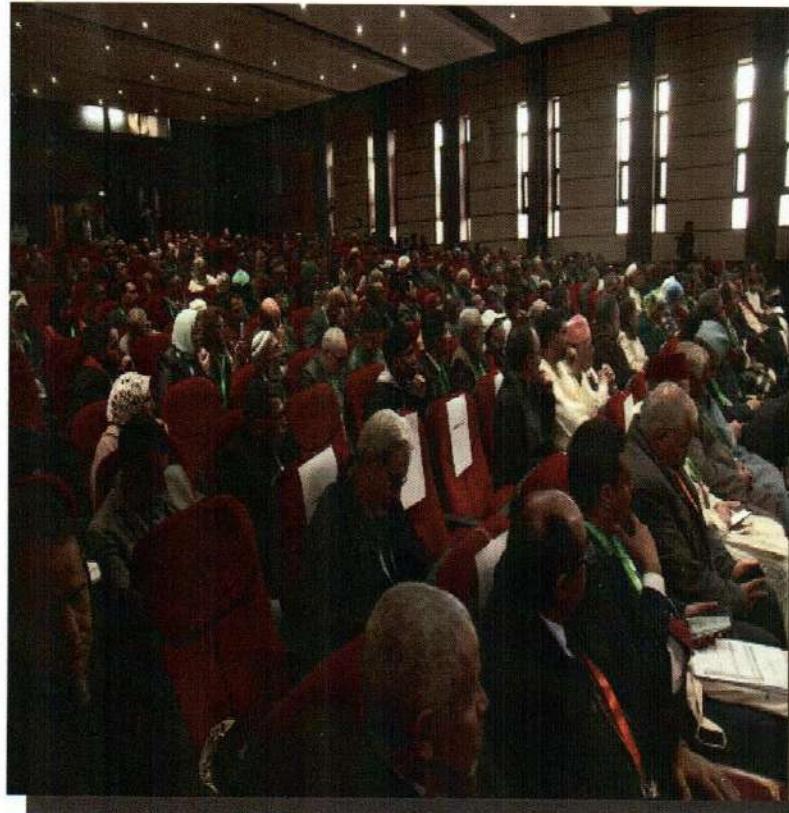


خلاصة تقدم تنفيذ مشاريع برنامج عمل جماعة سلا 2018 - 2023

%	2020	%	2019	السنة
8,73	35	7,23	29	المشاريع المنجزة
11,97	48	11,47	46	في طور الانجاز
11,22	45	10,72	43	في طور الدراسة
67,08	269	70,07	281	في طور الترافع مع الشركاء
0,5	4	0,50	2	مشاريع الغيت أو أجلت
100	401	100	401	المجموع



مقارنة نسبة الإنجاز بين سنتي 2019 و 2020

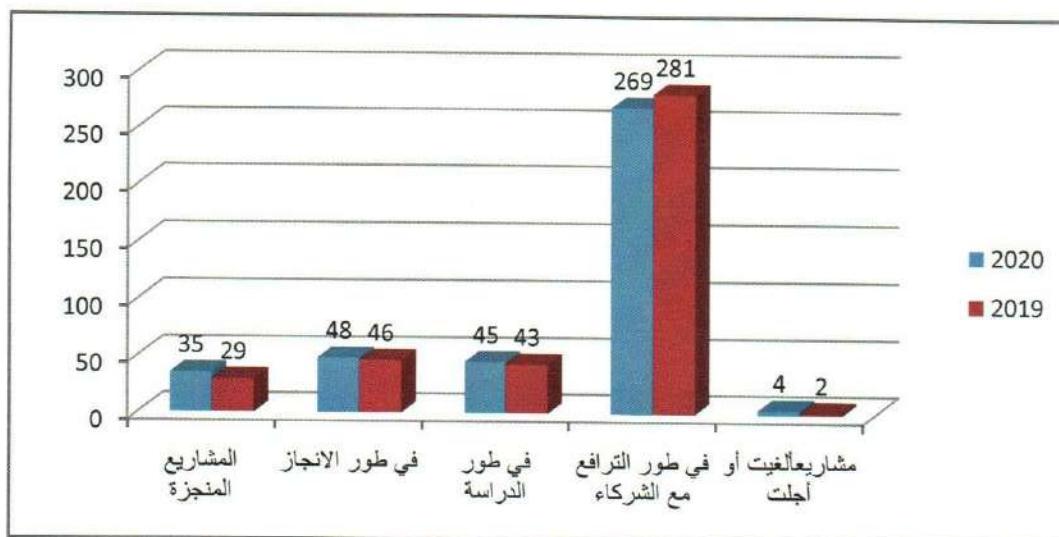

الحصيلة النهائية:

تم إنجاز 35 مشروع بشكل كامل؛

شرع في إنجاز الدراسات بالنسبة لـ 45 مشروعًا؛

بلغت المشاريع التي انطلقت قبل بداية الجائحة واستمرت بها الأشغال 48 مشروعًا؛

لا يزال 269 مشروع في إطار الترافق.



الموارد المالية المعيبة:

حرصت جماعة سلا على تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج وفق إمكاناتها واستحضار وضعيتها المالية، حيث قامت بتحويل مبلغ مساهمتها المقررة برسم سنة 2020 في اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة والمقدرة ب 12 مليون درهم، كما عملت على إنجاز المشاريع الذاتية المبرمجة لهذه السنة، وبرمحت مبلغ 2 مليون درهم لاقتناء الفنادق بالمدينة العتيقة والمدرجة في برنامج عملها قصد ترميمها وإصلاحها أو إعادة تهيئتها وتحويلها لفضاءات للتنشيط الثقافي والفنوي وإبراز الموروث التاريخي للمدينة.

وخصصت الجماعة اعتماداً مالياً للشروع في الدراسات والمساعدة التقنية لهيئة المكتب الجماعي لحفظ الصحة، وهو المرفق الذي خصصت له الجماعة جزء من الدعم المالي الذي حصلت عليه في إطار برنامج دعم الجمعيات لتحسين أدائها برسم سنة 2019، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية بتعاون مع البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية.

وفي إطار حرصها على تدبير أمثل لمرفق المقابر، برمحت الجماعة أزيد من 8 مليون درهم لاقتناء أراضي والقيام بالدراسات اللازمة لذلك تلبية للحاجة الماسة للمدينة لتوفير مقابر جديدة لتأمين دفن الموتى. وتتجدر الإشارة إلى أن الجماعة أبرمت اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات المحلية لتدبير المقابر الحالية.

وفي إطار اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة سلا لبناء مركز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سلا، قامت الجماعة ببرمجة مساهمتها لسنة 2020 بمبلغ مليون درهم لإنجاز المشروع. كما خصصت الجماعة في إطار مساهمتها في مشروع بناء وتجهيز معهد التنشيط الفني والثقافي بتاوريكت، ومشروع حماية وتقديم وتهيئة الغابة الحضرية عين الحوالة بمدينة سلا (الشطر الأول)، اعتماداً مالياً قدره 2 مليون درهم لكل واحد منها، والمشروعان تتولى إنجازهما شركة الرباط الجهة للتهيئة.

عنوان البند	الاعتماد المفتوح	الاعتماد المراد برمجته	الاعتماد النهائي
اقتناء الفنادق بالمدينة العتيقة	2 000 000,00	2 000 000,00	-
أشغال هيئة وضع التلوجيات للاشخاص محدودي الحركة بما فيها مصاريف الدراسة	1 000 000,00	1 000 000,00	-



400 000,00	400 000,00	تهيئة وتجهيز قاعة الرياضة ببطانة
500 000,00	500 000,00	أشغال تهيئة وتجهيز الأسواق بالألواح الشمسية
350 000,00	350 000,00	الدراسات والمساعدة التقنية (مكتب البلدي لحفظ الصحة)
100 000,00	100 000,00	أشغال صيانة غرفة تبريد مستودع الأموات بالمكتب البلدي لحفظ الصحة
8 316 866,37	8 316 866,37	اقتناء وتهيئة أراضي المقابر بما فيها مصاريف الدراسة والتتبع
450 000,00	450 000,00	حفر وتجهيز وتهيئة الآبار
1 500 000,00	1 500 000,00	تهيئة سوق الجملة
1 300 000,00	1 300 000,00	بناء مراكز تجارية
1 400 000,00	1 400 000,00	تهيئة وصيانة الأسواق
7 614 378,94	7 614 378,94	بناء مقرات ادارية وانجاز الاشغال الكبرى لتهيئة وتجهيز البنىآيات الادارية مع مصاريف الدراسة وتتبع الاشغال
1 000 000,00	1 000 000,00	اقتناء السيارات والدراجات النارية (الاتفاقية التي تربط جماعة سلا والمديرية العامة للأمن الوطني
12 000 000,00	12 000 000,00	دفعات لفائدة شركة الرباط الجهة للتهيئة للمشاركة في برنامج تاهيل وتنمية المدينة العتيقة بسلا
2 000 000,00	2 000 000,00	دفعات لفائدة شركة الرباط الجهة للتهيئة للمشاركة في بناء وتجهيز معهد التنشيط الفني و الثقافي بتايريك سلا
2 000 000,00	2 000 000,00	دفعات لفائدة شركة الرباط الجهة للتهيئة اتفاقية شراكة تتعلق بحماية وتقديم وتهيئة الغابة الحضرية عين الحوالة بمدينة سلا 2020-2022 (الشطر الأول)
1 000 000,00	1 000 000,00	دفعات لفائدة مجلس عمالة سلا للمساهمة في بناء مركز تاهيل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سلا
42 931 245,31	42 931 245,31	جهة الرباط سلا القنيطرة المجموع



الإكراهات:

تعتبر عملية تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة جزءاً لا يتجزأ من المسطرة المنصوص عليها في اعتماد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحييئه وتقييمه، إذ يسمح التتبع والتقييم بالحكم على تقدم إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، وتقدير مدى الوصول إلى النتائج والأهداف المتوقعة، والقيام بالتحيين اللازم قصد ملائمة الموارد المتوفرة مع المشاريع المدرجة لبلوغ الأهداف المتوقعة.

كما أن تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة يهدف إلى رصد الإكراهات التي تعيق أو تؤخر تنفيذ المشاريع من جوانب متعددة مالية وإدارية وتقنية، واتخاذ القرارات المتعلقة بكل مشروع في طور الإنجاز أو لم ينطلق بعد، إما بإعادة تقويم الموارد أو مراجعة محتوى المشروع.

وخلال تتبع تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا لسنة 2020 رصدت مجموعة من الإكراهات التي حالت دون السير العادي للمشاريع المدرجة، لعل أهمها ظروف جائحة كورونا التي تعيشها بلادنا منذ مارس 2020 وتداعياتها خاصة في فترة الحجر الصحي التي امتدت لثلاثة أشهر متواصلة مما حال دون التمكن من عقد شراكات مع الجهات الشركية. وكان من بين أهم تأثيرات الجائحة تراجع المداخيل الذاتية بسبب توقف العديد من الأنشطة التجارية والمهنية وتراجع عدد التراخيص المتعلقة بعمليات البناء والتجزئات. كما أن ميزانية الجماعة لسنة 2020 عانت من مشكل تسوية الديون والأحكام المستحقة عن طريق اقتطاعها من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة. يضاف إلى ذلك مشكل تعبئة العقار بسبب تعقد مسطرة تسوية العقار في العديد من المشاريع وتكلفته المرتفعة.





إن أهم ما ميز سنة 2020 انتشار جائحة كورونا في كل بقاع العالم، وظهور أول حالة بالمغرب منذ بداية شهر مارس مما أدى إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الفيروس لعل أهمها إعلان حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس 2020، تلتها فرض الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر. وقد ترتب عن هذه الوضعية توقف العديد من الأنشطة وتقلص حجم العديد منها مع الاقتصر على الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالعيش اليومي للسكان وتركيز الجهد على الأعمال التي لها علاقة مباشرة بالحد من انتشار الوباء.

تراجع النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتقلص حركة المواطنين كان أبرز تداعيات الجائحة، وهو ما انعكس سلباً على السير العادي للشأن المحلي عموماً وعلى الموارد المالية للجماعة بشكل خاص.

فيما يخص تنفيذ برنامج عمل الجماعة ورغم صدور العديد من المراسيم الحكومية والدوريات الوزارية الداعية إلى تركيز الجهد على محاربة الوباء وتأجيل تنفيذ المشاريع التي لم تنطلق بعد خاصة تلك المتعلقة بالبيئة الحضرية والمناطق الخضراء والإنارة العمومية، فإن المشاريع التي انطلقت قبل بداية الجائحة واستمرت بها الأشغال بلغت 48 مشارعاً، تركزت أساساً في المحور الثاني المتعلق بتأهيل المدينة العتيقة والمحور الأول المتعلق بالبنية التحتية والتنقل والمحور السادس المتعلق بالتدبير الجماعي. كما شرع في إنجاز الدراسات بالنسبة لـ 45 مشارعاً وإنجاز 35 مشارعاً بشكل كامل.

وتتجدر الإشارة إلى أن أهم إكراهين اعترضاً تنفيذ برنامج عمل الجماعة هو عدم التمكن من رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع سواء من خلال إبرام الشراكات أو الحصول على قروض مالية، إضافة إلى مشكل تسوية الوعاء العقاري الذي يتميز بتعقد مساطرته القانونية والإدارية وندرته وكلفته المالية.

وبناء على المقتضيات القانونية ذات الصلة، فسيتم العمل على تحيين برنامج عمل الجماعة خلال السنة الثالثة من تنفيذه أي نهاية سنة 2021، وهو ما سيتمكن من إعادة تحديد الأولويات، وتفادي الإكراهات المطروحة على مستوى الانجاز، وكذا توفير مصادر التمويل اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.





الجَمَاعَةُ الْعَلِيَّةُ
toRooUt | θo宦
COMMUNE DE SALE



www.villedesale.ma



[Facebook/جَمَاعَةُ سَلَةِ](#)
