



التقرير السنوي

لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا 2018-2023

برسم سنة 2022

التصميم

3	تقديم.....
5	الإطار المرجعي :
6	منظومة التنقيط:
10	منهجية تتبع تقييم برنامج العمل :
11	الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة.....
23	تقدم تنفيذ البرنامج.....
23	المحور الأول: المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والتنمية المستدامة
45	المحور الثاني: تثمين تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة.....
59	المحور الثالث : التنشيط السياحي والاقتصادي ودعم الاستثمار
64	المحور الرابع: التنمية الثقافية والرياضية ودعم التماسك الاجتماعي.....
83	المحور الخامس: المشاريع المهيكلة
87	المحور السادس: التدبير الجماعي.....
93	خلاصة تقدم تنفيذ مشاريع برنامج عمل جماعة سلا 2018 - 2023.....
95	الموارد المالية المعبئة:
98	الإكراهات:
	خاتمة.....

Erreur ! Signet non défini.

مع نهاية سنة 2022 يكون برنامج عمل جماعة سلا قد أكمل سنته الرابعة،

وإذا كان العالم قد بدأ يخرج في هذه اللحظة من فترة النقاهة والتي حصدت بالفعل نتائج الآثار السلبية لجائحة كورونا كوفيد 19، فإنه قد دخل من جهة أخرى في حالة عدم اليقين بسبب الظروف الدولية الصعبة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم وسط قفزات أسعار المواد البترولية والغذائية، وتعثر سلاسل الإمداد؛

في الوقت الذي كان فيه المغرب يسعى لمواجهة تداعيات الجفاف وآثار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% (خلال السنة المالية 2022)، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5 من الناتج المحلي الإجمالي.

أما على الصعيد المحلي فإن ميزانية جماعة سلا، تكاد تكتسحها النفقات الإجبارية 99.59% بما في ذلك الديون (صندوق التجهيز الجماعي) بنسبة 12.46%، بالإضافة إلى المبالغ المرصودة للمقاطعات الخمس بنسبة تناهز 10%، اعتمادات مالية مهمة تقتطع من ميزانية الجماعة وليس من اختصاص المقاطعات صرفها في إنجاز المشاريع المبرمجة على صعيد الجماعة وإن كان بمجالها الترابي، في حين أن نسبة الباقي استخلاصه وصلت إلى 45.33% من قيمة الصافي من المداخيل المقررة للجماعة.

ورغم كل هذه الإكراهات، فقد استأنفت جماعة سلا تنفيذ جل مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمساحات الخضراء بعد التأجيل الذي عرفته إبان الجائحة مع الحرص على إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي قيد الإنجاز أو المبرمة في إطار اتفاقيات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وقد استحضرت جماعة سلا كل هذه المعطيات في سعيها لتنفيذ برنامج عملها حيث التزمت بالعمل على مواصلة المشاريع التي انطلقت قبل الجائحة، كما قامت بتحويل مساهمتها المالية السنوية بخصوص الاتفاقية المتعلقة بتأهيل المدينة العتيقة والبالغة 37 مليون درهم إلى شركة الرباط الجهة للتهيئة لضمان استمرارية إنجاز المشاريع المبرمجة في سنة 2022 بالمدينة العتيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة سلا استمرت في انخراطها في برنامج دعم الجماعات في تحسين أدائها الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات المحلية بتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية والبنك الدولي، والذي يمتد لمدة خمس سنوات 2019 - 2023. بهدف تعزيز الحكامة الجيدة في الجماعات وضمان انخراطها في منطقتي تطبعة النجاعة والفعالية في الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وللفاعلين الاقتصاديين

من جهة، وتمكين رؤساء مجالس الجماعات المعنية من لوحة للقيادة خاصة بمجالات صلاحياتهم، وتمكين الجماعات المستجيبة للشروط من دعم مالي.

وقد تمكنت الجماعة في هذا الباب من الحصول خلال سنة 2022 على دعم مالي مجموعه 123 مليون درهم تقريبا عن سنتي 2020 و2021 خصصت أجزاء منه لـ:

◀ شركة الرباط التهيئة كمساهمة في برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة بما قدره 50 000 000,00 درهم؛

◀ شركة الرباط التهيئة كمساهمة في إحداث المجازر الجديدة لعمالتي الرباط وسلا بما قدره 20 000 000,00 درهم؛

◀ شركة التنمية المحلية الرباط-سلا-تمارة في إطار اتفاقية الشراكة من أجل إعداد منصة تجارية للمنتوجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط-سلا-تمارة - الشطر الأول بما قدره 20 000 000,00 درهم؛

◀ شركة التهيئة الرباط كمساهمة في اتفاقية الشراكة من أجل معالجة المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء على صعيد جماعات سلا-تمارة-هرهورة والصخيرات - الشطر الثاني بما قدره 2 500 000,00 درهم؛

◀ شركة REDAL عن مشروع تهيئة الطريق الإقليمي رقم 4033 بين الطريق الوطنية رقم 6 وشارع ابن الهيثم - الشطر الثاني بما قدره 1 500 000,00 درهم؛

◀ 350 000,00 درهم في إطار إعداد دراسة تقنية لإعادة بناء المكتب الجماعي لحفظ الصحة في إطار مجهودات الجماعة لمواجهة وتدبير الأخطار خاصة بعد جائحة كورونا التي عرفها العالم.

◀ ...

وتراهن جماعة على قدرة الترافع مع الشركاء والفاعلين لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع.

يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية التي تهدف إلى توفير خدمات القرب للمواطنات والمواطنين. وقد حددت مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة لمدة ست سنوات، وتتبعه وتحينه وكذا تقييمه، ويشرف رئيس الجماعة على هذه المسطرة خلال كل مراحلها.

كما أن القانون التنظيمي للجماعات نص في مادته 272 على أن الجماعة تقوم تحت إشراف رئيسها ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها.

وعملا بالمادتين 14 و15 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده المشار إليه أعلاه، تم إعداد التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة برسم سنة 2022، يتضمن بيانات حول:

-نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج؛

-الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات والصعوبات التي اعترضت إنجازها، مع اقتراح بعض الحلول الكفيلة بتجاوزها.

منظومة التنقيط:

تهدف منظومة التنقيط إلى توضيح وتحديد النسب المئوية المخصصة لكل مرحلة من مراحل المشروع بغرض التمكن من التعرف على نسب تقدم الإنجاز، وتم تحديدها حسب نوعية المشروع وطبيعة المتدخلين فيه، وهي مقسمة كالتالي:

- المشاريع المبرمجة في إطار شراكة وتستدعي تسوية الوعاء العقاري؛
- المشاريع المبرمجة في إطار شراكة ولا تستدعي تسوية الوعاء العقاري؛
- المشاريع الذاتية وتستدعي تسوية الوعاء العقاري؛
- المشاريع الذاتية ولا تستدعي تسوية الوعاء العقاري؛
- مشاريع الدراسات والاقتناءات.

بالنسبة للمشاريع المبرمجة في إطار شراكة وتستدعي تسوية الوعاء العقاري:

- التصديق على الاتفاقيات 10%
- تسوية الوعاء العقاري 20%
- القيام بالدراسات التقنية 30%
- إنجاز الأشغال 40%

ويتم احتساب النسب المذكورة كالتالي:

- التصديق على الاتفاقيات: 10%

5% — مرحلة الترافع والتفاوض على المشروع

5% — موافقة المجلس الجماعي وتوقيع الاتفاقية

- تسوية الوعاء العقاري: 20%

5% — تحديد التخصيص العمراني للعقار وإنجاز المسح الطبوغرافي

5% — مصادقة المجلس الجماعي على المقرر الخاص بتعبئة العقار

5% — اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي

5%	— التعاقد على تعبئة العقار
30%	● القيام بالدراسات التقنية:
10%	— البطاقة التقنية والتشخيص التقني
10%	— إجراء الدراسات
10%	— إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العروض العمومي للأشغال
40%	● إنجاز الأشغال:
10%	— بداية الأشغال
10%	— إنجاز 50% من الأشغال
15%	— التسلم المؤقت للأشغال
5%	— التسلم النهائي للأشغال
	<u>بالنسبة للمشاريع المبرمجة في إطار شراكة ولا تستدعي تسوية الوعاء العقاري:</u>
10%	● التصديق على الاتفاقيات
40%	● القيام بالدراسات التقنية
50%	● إنجاز الأشغال
	ويتم احتساب النسب المذكورة كالتالي:
10%	● التصديق على الاتفاقيات:
5%	— مرحلة الترافع والتفاوض على المشروع
5%	— موافقة المجلس الجماعي وتوقيع الاتفاقية
40%	● القيام بالدراسات التقنية:
10%	— البطاقة التقنية والتشخيص التقني
20%	— إجراء الدراسات

10%	— إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العروض العمومي للأشغال
50%	● إنجاز الأشغال:
15%	— بداية الأشغال
15%	— إنجاز 50% من الأشغال
15%	— التسلم المؤقت للأشغال
5%	— التسلم النهائي للأشغال
	<u>بالنسبة للمشاريع الذاتية والتي تستدعي تسوية الوعاء العقاري:</u>
20%	● تسوية الوعاء العقاري
40%	● القيام بالدراسات التقنية
40%	● إنجاز الأشغال
	ويتم احتساب النسب المذكورة كالتالي:
20%	● تسوية الوعاء العقاري:
5%	— تحديد التخصيص العمراني للعقار وإنجاز المسح الطبوغرافي
5%	— مصادقة المجلس الجماعي على المقرر الخاص بتعبئة العقار
5%	— اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي 5%
5%	— التعاقد على تعبئة العقار
40%	● القيام بالدراسات التقنية:
10%	— البطاقة التقنية والتشخيص التقني
20%	— إجراء الدراسات
10%	— إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العروض العمومي للأشغال
40%	● إنجاز الأشغال:

10%	—	بداية الأشغال
10%	—	إنجاز 50% من الأشغال
15%	—	التسلم المؤقت للأشغال
5%	—	التسلم النهائي للأشغال

بالنسبة للمشاريع الذاتية التي لا تستدعي تسوية الوعاء العقاري:

40%	●	القيام بالدراسات التقنية
60%	●	إنجاز الأشغال
		ويتم احتساب النسب المذكورة كالتالي:
40%	●	القيام بالدراسات التقنية:
10%	—	البطاقة التقنية والتشخيص التقني
20%	—	إجراء الدراسات
10%	—	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العروض العمومي للأشغال

60%	●	إنجاز الأشغال:
15%	—	بداية الأشغال
15%	—	إنجاز 50% من الأشغال
20%	—	التسلم المؤقت للأشغال
10%	—	التسلم النهائي للأشغال

بالنسبة لمشاريع الدراسات والمشتريات:

40%	●	إعداد البطاقات التقنية والتشخيص
60%	●	إنجاز الدراسة أو تسليم المشتريات

حرصا من رئيس المجلس الجماعي لسلا على حسن تتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، تم إعداد التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة 2018-2023 برسم سنة 2022.

حيث تمت مراسلة رؤساء الأقسام المعنية بتتبع التنفيذ، وعقدت بمقر الجماعة "باب بوحاجة"، مجموعة من اللقاءات الإعدادية مع المصالح الجماعية المعنية بالتتبع التقني والإداري للمشاريع المدرجة في البرنامج بحضور رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية والتقنيين التابعين للمقاطعات، حيث تم عرض منظومة المشاريع المتضمنة في برنامج عمل جماعة سلا، ومتابعة نسبة إنجاز الأشغال وجمع المعطيات حول تقدم الإنجاز ورصد أهم الإكراهات التي اعترضت تقدم نسب إنجاز المشاريع والبرامج برسم سنة 2022. وقد ارتكزت عملية التقييم على منظومة التنقيط التي تم اعتمادها للسنوات 2019، 2020 و2021 والتي تحدد نسبة معينة لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع.

كما تم التواصل مع مجموعة من المصالح اللامركزية المعنية بإنجاز مجموعة من المشاريع المسطرة في برنامج العمل.

وتفعيلا لأحكام مقتضيات المادة 15 من المرسوم 2.16.301. التي تنص على أن " يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المرسوم. ويتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة"، تم عرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا 2018 - 2023 على اللجان الدائمة في اجتماعين بمقر جماعة سلا عقدا على التوالي بتاريخ 04 شتنبر 2023 و13 أكتوبر 2023؛ وقد تم الاستماع لمداخلات السادة أعضاء اللجان الدائمة وتمت الإجابة عن مختلف التساؤلات المطروحة مع تقديم الشروحات اللازمة بخصوص مختلف الاستفسارات التي تقدم بها السادة الأعضاء الحاضرين.

وفي نفس السياق تم عرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا 2018 - 2023 على مجلس جماعة سلا في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 بتاريخ 19 أكتوبر 2023 في الجلسة الثانية، وذلك من أجل المداخلة كما نص القانون التنظيمي 113-14. حيث تم إبراز المشاريع التي أنجزت أو شرع في إنجازها أو انطلقت دراستها بالنسبة لكل محور من المحاور الست المكونة للبرنامج ونسب تقدمها وفقا لمنظومة التنقيط المعتمدة، وبعض الإكراهات التي اعترضت تنفيذ بعض المشاريع.

الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة

في إطار سعيه لتنفيذ برنامج عمل الجماعة قام المجلس الجماعي لسلا بإبرام العديد من الاتفاقيات لإنجاز المشاريع المدرجة، حيث تمت الموافقة على أزيد من 50 اتفاقية أو ملحق اتفاقية أو ملحق تعديلي خاصة بتفعيل وتنزيل المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة.

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
الدورة الاستثنائية بتاريخ 20 نونبر 2019	برنامج التنمية المندمجة لعمالة سلا للفترة الممتدة بين 2020 و2024.	-وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) -وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة -مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة -جماعة سلا -وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء -الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب -وكالة تهيئة ضفتي أبي رقرق -وزارة الشباب والرياضة والثقافة - وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر- والرقمي - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - وزارة الصحة - المنذوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر - وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة - وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي - مؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة) - مجلس عمالة سلا - جماعة بوقنادل - جماعة عامر - جماعة السهول	4365.00 مليون درهم مساهمة جماعة سلا: 454,50 مليون درهم
المحور 1: المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والتنمية المستدامة			
أعطى جلالة الملك انطلاقة المشروع 23 دجنبر 2007	تمديد خط الترمواي إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله	شركة تراموي الرباط سلا جماعة الرباط جماعة سلا	1.7 مليار درهم

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
الدورة العادية لشهر فبراير 2019	اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل المدخل إلى الطريق السيار لمدينتي الرباط وسلا	وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة. عمالة سلا. مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. جماعة سلا. الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.	458 مليون درهم (هذا المبلغ لا يشمل تكاليف الدراسات البالغة 04 ملايين درهم)
الدورة العادية لشهر ماي 2019	اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل الشبكة الطرقية بجهة الرباط سلا القنيطرة.	وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة. عمالة سلا. مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. جماعة سلا. جماعة سيدي أبي القنادل. جماعة عامر	200 مليون درهم
الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020	النسخة المعدلة لاتفاقية شراكة تتعلق بحماية وتثمين وتهيئة الغابة الحضرية "عين الحوالة"	وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع المياه والغابات - ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة. عمالة سلا. مجلس عمالة سلا. مجلس جماعة سلا. شركة الرباط الجهة للتهيئة.	20.000.000,00 درهم
الدورة العادية لشهر فبراير 2018	اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وتهيئة وصيانة مسارات خاصة بحافلات النقل العمومي الحضري بعمالات الرباط - سلا - تمارة.	- وزارة الداخلية - ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة - مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" - مجلس جماعة الرباط - مجلس جماعة سلا - مجلس جماعة تمارة - شركة الرباط جهة تهيئة	- تخصيص المقاطع الطرقية (طريق القنيطرة- طريق عين الحوالة- قنطرة الفداء) على مسافة 4 كلم كمسارات خاصة بحافلات النقل العمومي الحضري.
المحور 2: تثمين تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة			
الدورة الاستثنائية بتاريخ 28 نونبر 2018	اتفاقية إطار تتعلق ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا 2019- 2023	وزارة الداخلية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني - وزارة الشباب والرياضة - وزارة الثقافة والاتصال - صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة	900 مليون درهم

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
		<ul style="list-style-type: none"> - عمالة سلا - المجلس الجهوي للرباط سلا القنيطرة - مجلس عمالة سلا - المجلس الجماعي لسلا - مؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة) - شركة الرباط الجهة للتهيئة. 	
الدورة العادية لشهر فبراير 2021	اتفاقية شراكة بين جماعة سلا وجمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحون بسلا، تتعلق بتخصيص "الدار الكبيرة" بالمدينة العتيقة لسلا كمركز للبحث والتكوين في تراث الملحون.	جماعة سلا. جمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحون بسلا.	<p>تلتزم الجماعة بمقتضى هذه الاتفاقية بما يلي:</p> <p>1- وضع العقار المسمى "الدار الكبيرة" المتواجد بالعنوان التالي: رقم 10، درب شركو، زنقة معانة، قساطلة المدينة العتيقة - سلا، والمتكون من طابق سفلي وآخر علوي رهن إشارة جمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحون بسلا.</p> <p>2- ترميم وإصلاح "الدار الكبيرة" وجعلها قابلة للاستغلال ومتوفرة على كافة المرافق الضرورية.</p> <p>تلتزم الجمعية بمقتضى هذه الاتفاقية بما يلي:</p> <p>1- المساهمة المالية في تجهيز المركز وتوفير شروط انطلاق نشاطه في أحسن الظروف؛</p> <p>2- تسيير وتدبير مرافق "الدار الكبيرة" كمركز للبحث والتكوين في تراث الملحون؛</p> <p>3- الحفاظ على المركز ومرافقه؛</p> <p>4- وضع الدعامات البيداغوجية الخاصة بالتدريس؛</p> <p>5- تعبئة الموارد البشرية والمادية؛</p> <p>8- تسطير برنامج سنوي خاص بالتكوين؛</p> <p>6- إقرار برنامج سنوي للتنشيط الثقافي والفني بمقر المؤسسة؛</p> <p>7- التنصيب دائما على جماعة سلا كشريك داعم للمشروع</p>
دورة استثنائية بتاريخ 25 نونبر 2016	تعديل اتفاقية شراكة بين جماعة سلا والمديرية العامة للأمن الوطني لتوفير الدعم المادي واللوجستيكي ومقرات لفائدة مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا	جماعة سلا. المديرية العامة للأمن الوطني	- تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 1.000.000,00 (مليون درهم) لاقتناء دراجات نارية لفائدة مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا.

التكلفة الإجمالية	الشركاء	موضوع الاتفاقية	دورة المجلس الجماعي
<p>- صيانة مقر الشرطة المتواجد بحي سيدي موسى "كرنيش سلا" بمقاطعة المريسة؛</p> <p>- بناء مقر للشرطة بحي الفروي بمقاطعة تابريكت؛</p> <p>- وضع المجلس لبقعة أرضية رهن إشارة المصالح الأمنية لبناء مقر للشرطة بمشروع "أبواب سلا" بمقاطعة العيايدة؛</p> <p>- مراعاة المعايير الهندسية والتقنية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في عمليات الصيانة والبناء؛</p> <p>- المشاركة في اللجنة المشتركة للتتبع المحدثة بموجب هذه الاتفاقية.</p>			
<p>وضع المجلس للبنية المتواجدة بمشروع "أبواب سلا" بمقاطعة العيايدة، والمخصصة لمكتبة "Bibliothèque"، وذلك رهن إشارة المصالح الأمنية لتخصيصها كمقر أمني، وذلك لمدة أربع سنوات، في انتظار بناء مقر الشرطة من طرف المصالح الأمنية بالبقعة الأرضية الموضوعة سابقا رهن إشارة هذه الأخيرة بمشروع "أبواب سلا" بمقاطعة العيايدة، والمشار إليها بالرمز A1 حسب تصميم التجزئة، والبالغة مساحتها 2598 متر مربع، وفق ما تم الالتزام به في إطار اتفاقية شراكة مبرمة بين الطرفين ومؤشر عليها بتاريخ 30 دجنبر 2016؛</p> <p>- بناء مقر للشرطة بالبقعة الأرضية المتواجدة بشارع باب سبتة (سوق السمك سابقا) بالمدينة العتيقة لسلا، والبالغة مساحتها 301 متر مربع؛</p> <p>- مراعاة المعايير الهندسية والتقنية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في عملية البناء؛</p> <p>- المشاركة في اللجنة المشتركة للتتبع المحدثة بموجب هذه الاتفاقية.</p>	<p>-جماعة سلا. - المديرية العامة للأمن الوطني.</p>	<p>اتفاقية شراكة بين جماعة سلا والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تخصيص عقارات لفائدة مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا.</p>	<p>الدورة العادية لشهر فبراير 2020</p>

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
المحور 3: التنشيط السياحي والاقتصادي ودعم الاستثمار			
الدورة الاستثنائية بتاريخ 04 ستمبر 2018	مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث المجازر البلدية الجديدة لعمالتي الرباط وسلا في صيغتها الجديدة.	وزارة الداخلية - وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة - ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة - مجلس جماعة الرباط - مجلس جماعة سلا - مجلس جماعة أبي القناديل - مجلس جماعة السهول - مجلس جماعة عامر - مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مجازر الرباط وسلا" - المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية - الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء - وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية - شركة الرباط جهة تهيئة	267 مليون درهم
الدورة الاستثنائية بتاريخ 17 دجنبر 2020	اتفاقية شراكة لإحداث منطقة صناعية للتقنيات الحديثة "Technoparc et Start up" de Salé والشطر الثاني من مشتل المقاولين الشباب بسلا.	- جهة الرباط سلا القنيطرة. - جماعة سلا.	85 مليون درهم
الدورة الاستثنائية بتاريخ 30 ماي 2018 الدورة العادية لشهر ماي 2019 (موضوع ملحق لهذه الاتفاقية)	اتفاقية شراكة من أجل إنجاز منطقة للأنشطة الاقتصادية والخدمات الواقعة على شارع الزربية بمقاطعة احصين، يخصص جزء منها لإيواء محلات الأنشطة الحرفية المتواجدة في البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد TF66612 الواقعة داخل مسار الطرامواي.	- عمالة سلا - جماعة سلا - شركة الطرامواي الرباط سلا	وضع جزء من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 4350/راء رهن إشارة المشروع (موقع الاستقبال). - المساهمة في التأطير الاجتماعي للحرفيين المستفيدين. - مواكبة عملية التقسيم و التوزيع لمساحة المحلات الخاصة بالحرفيين المستفيدين . - منح جميع الرخص الإدارية من أجل إنجاز منطقة للأنشطة وبناء المحلات التجارية اللازمة لهذا الغرض. - تحمل مصاريف المساهمة المتعلقة بالربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير فيما يخص الجزء الثاني من منطقة الأنشطة. - تحمل مصاريف بناء الجزء الثاني من منطقة الأنشطة الزربية "ZAZ"

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
			غير المعنية بعملية نقل المحلات في إطار تحرير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز مشروع تمديد الخط الثاني للطرامواي.
الدورة العادية لشهر فبراير 2018	الملحق الرابع لاتفاقية الشراكة المبرمة سابقا ما بين جماعة سلا والسيد محمد اشماعو منعش عقاري بخصوص إنجاز سكن اجتماعي وتجهيزات عمومية بتابريكت الوسطى.	جماعة سلا. - السيد محمد اشماعو منعش عقاري	83.037.200,00 درهم
الدورة العادية لشهر فبراير 2020	اتفاقية تعاون وشراكة إطار بين جماعة سلا والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل النهوض بدعم وإحداث التعاوضات من طرف الشباب	-جماعة سلا. -الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات	التزامات جماعة سلا التزامات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016	ملحق ثاني لاتفاقية شراكة المتعلقة بإعادة تأهيل المنطقة الصناعية تابريكت سلا.	جماعة سلا -وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة. -جمعية المنطقة الصناعية تابريكت سلا.	يتعلق الأمر بملائمة بعض مقتضيات هذه الاتفاقية مع المستجدات القانونية
الدورة العادية لشهر ماي 2017	اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إعادة تأهيل المنطقة الصناعية حي الرحمة بمدينة سلا	جماعة سلا. - مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة. -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة. -مجلس عمالة سلا - جمعية صناعية المنطقة الصناعية حي الرحمة- سلا.	2.000.000,00 درهم.
المحور 4: التنمية الثقافية والرياضية ودعم التماسك الاجتماعي			
الدورة الاستثنائية بتاريخ 21 يوليوز 2020.	اتفاقية شراكة من أجل التمويل التكميلي للبرنامج الوطني -مدن بدون صفائح- بجماعة سلا 2020-2022.	وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. - وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. - عمالة سلا. - جماعة سلا. - العمران الرباط- سلا- القنيطرة.	85.000.000,00 درهم
الدورة العادية لشهر ماي 2016	اتفاقية تعاون وشراكة من أجل إحداث وتجهيز مسرح بمدينة سلا	وزارة الثقافة. عمالة سلا (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية). جهة الرباط سلا القنيطرة. مجلس عمالة سلا.	50.000.000,00 درهم

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
		جماعة سلا. -شركة الرباط للتهيئة	
الدورة العادية لشهر ماي 2016	اتفاقية تعاون وشراكة من أجل إحداث المركب الثقافي بمقاطعة احصين سلا (من أجل بناء مركز سوسيو ثقافي احصين).	اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. جماعة سلا. اللجنة المحلية للتنمية البشرية لمقاطعة احصين. -شركة الرباط للتهيئة	10.000.000,00 درهم
الدورة الاستثنائية بتاريخ 21 يوليوز 2020.	اتفاقية شراكة من أجل التمويل التكميلي للبرنامج الوطني -مدن بدون صفوح- بجماعة سلا 2020-2022.	وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. عمالة سلا. جماعة سلا. العمران الرباط- سلا- القنيطرة.	85.000.000,00 درهم
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة بين جماعة سلا ووزارة الثقافة من أجل بناء وتجهيز ثلاث خزانات بمدينة سلا	جماعة سلا. وزارة الثقافة.	10.000.000,00 درهم
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة من أجل إحداث ملعب رياضي للقرب بعشبة اصطناعي مزود بالإضاءة الكاشفة وحديقة ألعاب بحى الصفاء، بمقاطعة احصين	جماعة سلا. عمالة (اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا). اللجنة المحلية للتنمية البشرية لمقاطعة احصين. المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بسلا.	1.800.000,00 درهم + المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بسلا: المساهمة في حدود الإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة من أجل بناء قاعة مغطاة بمقاطعة لمريسة.	جماعة سلا. عمالة (اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا). اللجنة المحلية للتنمية البشرية لمقاطعة لمريسة. المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بسلا.	7.000.000,00 درهم
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق ببناء قاعة مغطاة بمقاطعة تابريكت	جماعة سلا. عمالة (اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا). اللجنة المحلية للتنمية البشرية لمقاطعة تابريكت. المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بسلا.	6.000.000,00 درهم

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
الدورة العادية لشهر فبراير 2017	اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز مركز لرعاية المكفوفين وضعاف البصر - بسلا.	جماعة سلا. اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا. مجلس عمالة سلا. المنذوبية الإقليمية للتعاون الوطني بسلا.	6.500.000,00 درهم
الدورة الاستثنائية بتاريخ 04 ستمبر 2018	اتفاقية شراكة بين جماعة سلا ووزارة الشباب والرياضة من أجل تهيئة القاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي.	جماعة سلا. وزارة الشباب والرياضة	7.000.000,00 درهم
المحور 5: المشاريع المهيكلة			
الدورة الاستثنائية بتاريخ 13 يوليوز 2017.	اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل فضاء سوق الصالحين بتابريكت.	-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة - مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة - عمالة سلا - جماعة سلا - شركة الرباط الجهة للتهيئة	305 مليون درهم
المحور 6: التدبير الجماعي			
الدورة العادية لشهر ماي 2016	- الملحق الثالث لاتفاقية شراكة بين جماعة سلا وجمعية التضامن لأصحاب العربات المجرورة بسوق الجملة للخضر والفواكه بسلا	جماعة سلا. جمعية التضامن لأصحاب العربات المجرورة بسوق الجملة للخضر والفواكه بسلا	يعدل البند الخامس من الاتفاقية كما يلي: - البند الخامس: صرف الدعم. يتم صرف الدعم لفائدة المستفيدين بمبلغ 10.000,00 درهم لكل سيارة نقل البضائع عاملة بسوق الجملة، و5.000,00 درهم لكل دراجة نارية ثلاثية العجلات (Triporteurs) عاملة بتراب الجماعة. ليصبح كما يلي : يتم صرف الدعم لفائدة المستفيدين بمبلغ 10.000,00 درهم لكل سيارة نقل البضائع عاملة بسوق الجملة، و5.000,00 درهم لكل دراجة نارية ثلاثية العجلات (Triporteurs) عاملة بتراب الجماعة، ودعم بمبلغ 3.000,00 درهم لفائدة العاملين (الحمالة) بسوق الجملة، مع التزام هؤلاء بمساهمة رمزية إضافية بنسبة 10٪. من مبلغ الدعم المخصص لهم، وذلك قصد استبدال

التكلفة الإجمالية	الشركاء	موضوع الاتفاقية	دورة المجلس الجماعي
عرباتهم اليدوية بعربات حديدية موحدة سهلة التنقل صغيرة الحجم وكبيرة الحمولة مع الالتزام بعدم إخراجها من السوق.			
تلتزم جماعة سلا في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بما يلي: - توفير الفضاء اللازم لإيواء الحيوانات موضوع تدخل الجمعية خلال فترة ما بعد عمليات التعقيم والمعالجة. - توفير دعم مالي سنوي قيمته: 400.000,00 درهم (أربعمائة ألف درهم) ضمن ميزانية الجماعة لتغطية جزء من تكاليف العملية والأدوية. - التعهد بعدم قتل الحيوانات التي تدخل ضمن مشروع عمل الجمعية (التي تحمل شارة الجمعية). - وضع الآليات والموارد البشرية التي تشتغل في مجال الحيوانات الضالة رهن إشارة الجمعية إذا اقتضت الضرورة.	جماعة سلا. جمعية آذان لحماية الحيوانات	اتفاقية شراكة بين جماعة سلا وجمعية آذان لحماية الحيوانات حول معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة ومحاربة داء السعر	الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018
توفير الاعتمادات المالية اللازمة لنزع ملكية الوعاء العقاري اللازم لإحداث المقبرة. تسييج المقبرة بحائط وقائي وإقامة حزام أخضر محيطها. تهيئ المرافق التابعة للمقبرة. تهيئ ممراتها. بناء سكن للحارس لضمان تواجده المستمر بالمقبرة. توفير مصدر مائي للمقبرة. وضع ملصق حائطي لتصميم المقبرة بمدخلها يحمل أرقاماً لممراتها وقبورها لتسهيل زيارتها.	جماعة سلا جماعة السهول	- اتفاقية شراكة بين جماعة سلا وجماعة السهول من أجل إحداث وتدبير مقبرة من الملك المدعو "اعبيو 2" ذي الرسم العقاري عدد 7268/ر بجماعة السهول	الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019

اتفاقيات لم تسجل في منظومة المشاريع لكن مضمونها ينسجم مع رؤية برنامج عمل جماعة سلا 2018 - 2023
والتوجهات التنموية

دورة المجلس الجماعي	موضوع الاتفاقية	الشركاء	التكلفة الإجمالية
الدورة العادية لشهر ماي 2017	اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق بالمساهمة في مشروع "بناء المركز الجهوي لطب الإدمان لجهة الرباط سلا القنيطرة".	جماعة سلا. ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة (اللجنة الجهوية للتنمية البشرية). وزارة الصحة. عمالة سلا (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية). مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. مجلس عمالة سلا. شركة الرباط للتهيئة.	24.000.000,00 درهم
دورة استثنائية بتاريخ 06 شتنبر 2016	اتفاقية شراكة بين جماعة سلا ووزارة الشباب والرياضة من أجل بناء مركب رياضي بمدينة سلا.	جماعة سلا. وزارة الشباب والرياضة. وزارة الاقتصاد والمالية. عمالة سلا. شركة الرباط الجهة للتهيئة.	205.000.000,00 درهم
الدورة الاستثنائية بتاريخ 28 نونبر 2018	ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقيتي الشراكة رقم 2016/50 ورقم 2018/21 في إطار البرنامج الأفقي برسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشأن مشروع بناء مركب الأميرة للامريم للتأهيل الاجتماعي	ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا جماعة سلا شركة الرباط الجهة للتهيئة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا	20.000.000,00 درهم
الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019	اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق ببناء وتجهيز مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية صعبة بدون مأوى قار - مركز إدماج - سلا.	كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة؛ مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة مجلس جماعة الرباط مجلس جماعة سلا مجلس جماعة القنيطرة	2.500.000 درهم
الدورة الاستثنائية بتاريخ 28 نونبر 2018	اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة سلا وجمعية مركز دعم التنمية المحلية CADEL.	جماعة سلا. جمعية مركز دعم التنمية المحلية CADEL	50.000,00 درهم سنويا

<p>8.000.000 درهم</p>	<p>جماعة سلا. ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة (اللجنة الجهوية للتنمية البشرية). عمالة سلا (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية). مجلس عمالة سلا. أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة. مؤسسة التعاون الوطني</p>	<p>اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق بالمساهمة في مشروع "بناء مركز للترويض الطبي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سلا</p>	<p>الدورة الاستثنائية بتاريخ 18 يوليوز 2019 -</p>
<p>الشروط العامة لتدبير وتهيئة وتجهيز وصيانة الشاطئ. الولوج إلى الشاطئ. تخصيص الفضاء. تهيئة وصيانة الشاطئ: البيئة والتنمية المستدامة تصميم استغلال و تدبير الشاطئ PUGP حماية وأمن المصطافين</p>	<p>-وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء -ممثلة في شخص المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء -جماعة سلا.</p>	<p>الموافقة على اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وجماعة سلا ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق تتعلق بتهيئة وتدبير شاطئ سلا.</p>	<p>الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019</p>
<p>تخصيص مساهمة مالية سنوية محددة في مبلغ 1.300.000,00 (مليون وثلاثمائة ألف درهم) لفائدة جمعية تدبير مقابر سلا.</p>	<p>- جماعة سلا جمعية تدبير مقابر سلا</p>	<p>اتفاقية شراكة بين جماعة سلا وجمعية تدبير مقابر سلا تتعلق بتدبير وصيانة المقابر بمدينة سلا</p>	<p>الدورة العادية لشهر ماي 2018</p>
<p>- توفير الأماكن لوضع هذه المحطات وتزويدها بوسائل الاشتغال والمحافظة عليها (الكهرباء والاتصال...); - المساهمة في توفير الدعم اللازم لديمومة المشروع.</p>	<p>كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة؛ - مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة - ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة - مجلس جماعة الرباط - مجلس جماعة سلا - مجلس جماعة القنيطرة</p>	<p>اتفاقية الشراكة الخاصة بتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة الرباط - سلا- القنيطرة</p>	<p>الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019</p>
<p>3.100.000,00 درهم</p>	<p>جماعة سلا وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة</p>	<p>اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الجماعي لمدينة سلا ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في مجال توفير اللوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة سلا</p>	<p>الدورة الاستثنائية بتاريخ 20 نونبر 2019</p>


<p>المساهمة في تحديد الحرف المستهدفة في إطار لجنة الانتقاء الواردة في المادة الخامسة أسفله؛ - المشاركة في لجن طلب العروض ولجنة الانتقاء ولجنة التتبع؛ - المشاركة في لجنة استلام الخدمات والتجهيزات بعد التوصل بشهادة مطابقة التجهيزات (مسلمة من مكتب خبرة مختص).</p>	<p>وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛ - عمالة سلا؛ - مجلس عمالة سلا؛ - مجلس جماعة سلا؛ - غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة .</p>	<p>اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ مشروع مواكبة الحرف المستهدفة عن طريق الدعم التقني والتكوين والمحافظة على الحرف المهتدة بالانقراض.</p>	<p>الدورة العادية لشهر فبراير 2019</p>
--	--	---	--

المحور الأول: المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والتنمية المستدامة

يتضمن المحور الأول المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والتنمية المستدامة وعددها 114 مشروعاً مجمعة في ستة برامج بكلفة إجمالية تقدر بـ 5209.07 مليون درهم، موزعة كالتالي:

المرحلة الثانية	المرحلة الأولى	كلفة المشروع	كلفة الاشغال	كلفة العقار	عدد المشاريع	البرنامج
19.75	889.5	909.15	649	260.25	15	بناء وتهيئة الطرق الرئيسية
210	295	505	480	25	3	إنجاز المنشآت الفنية
0	866	866	742.5	123.5	82	تأهيل أحياء المدينة
80.40	70.73	151.13	139	12.13	4	تهيئة مستودعات السيارات
54.59	120	174.59	170	4.59	6	تهيئة المساحات الخضراء
0	2603.10	2603.10	2452.34	150.76	4	تعزيز بنية النقل والتنقل
364.74	4844.33	5209.07	4632.84	576.23	114	المجموع

نسبة الإنجاز برسم سنة 2022	2022	2021	وضعية المشروع
38,60%	20	13	مشاريع منجزة
	14	18	في طور الإنجاز
	10	16	في طور الدراسة
	68	65	في طور الترافع
	2	2	الملغاة
	114	114	المجموع

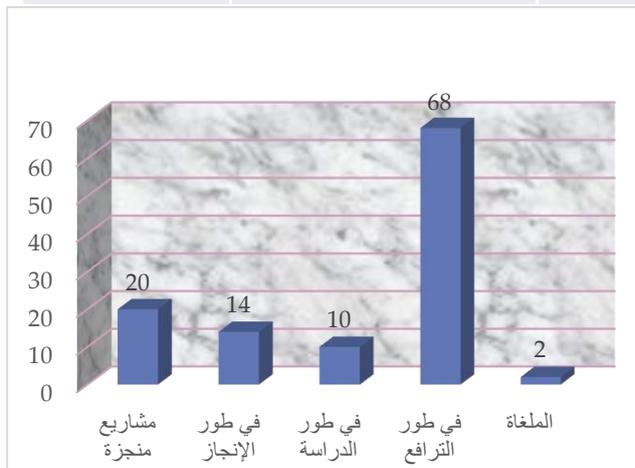

بالمقارنة بين سنتي 2021 و 2022 يظهر أن عدد المشاريع المنجزة انتقل من 13 مشروعاً إلى 20 مشروعاً، كما شرع في إنجاز 14 مشروعاً، وبلغ عدد المشاريع التي في طور الدراسة من 10 مشروعاً في سنة 2022

فيما يلي جدول تفصيلي لتقدم كل مشروع بهذا المحور:

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
بناء وتهيئة الطرق الرئيسية	1.1	تهيئة وتوسعة طريق القنيطرة (المقطع الواقع بين حي اشماعو و شارع "د").	باب المريسة والعيادة	9	15	24	24	-	-	10	30	0	60
	2.1	استكمال تهيئة طريق القنيطرة (المقطع الواقع بين شارع "د" و حدود جماعة عامر).	باب المريسة والعيادة	20	65	85	85	-	-	10	30	0	60
	3.1	تهيئة طريق مكناس الشطر3 (المقطع الواقع بين طريق المطار والطريق الالتفافية).	احصين والعيادة	20	90	110	110	-	مشروع منجز	10	30	0	100
	4.1	تهيئة طريق القاعدة الجوية (المقطع الواقع بين طريق مكناس وسيدي ابراهيم بولعجول).	بطانة - تابريكت - العيادة	49,75	47,25	97	97	-	-	10	30	0	85

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	5.1	تهيئة وبناء الطريق الساحلي (المقطع الواقع بين تجزئة سعيد حجي وطريق القنيطرة)،	العيادة	25	50	75	75	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15
	6.1	تهيئة طريق سيدي ابراهيم بولعجول (طريق بين ج سلا وج عامر)،	العيادة - عامر	25	50	75	75	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15
	7.1	بناء باركواي الجزء الثاني (المقطع الواقع بين الطريق الدائري رقم 2 وطريق الالتفافية)،	احصين	-	152	152	152	-	مشروع منجز	10	40	30	100
	8.1	تهيئة وبناء شارع الزربية (المقطع الواقع بين المستشفى الاقليمي وطريق الالتفافية رقم 1)،	احصين	40	50	90	90	-	تم إنجاز الشطر الأول من المشروع من المستشفى الاقليمي إلى إقامة الصفاء // الجزء الأول من الشطر الثاني الممتد من إقامة الصفاء إلى طريق اوطا احصين تم بناؤه في انتظار التهيئة والجزء الثاني إلى غاية الطريق المدارية رقم 1 في انتظار البناء والتهيئة وتسوية العقار	-	15	15	35

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2022-2023	الكلفة للفترة -2018-2021	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	15.1	بناء الطريق الواقعة بين تجزئة سيدي عبد الله وطريق سيدي ابراهيم بولعجول.	العيادة	4,5	13,5	18	-	18	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15
	16.1	انجاز ممر تحت السكة الحديدية بطريق سيدي براهم بولعجول	لعيادة	-	60	60	-	60	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15
إنجاز المنشآت الفنية	17.1	منشآت فنية (2 طريق القنيطرة + 1 طريق مكناس)	الجماعة	15	220	235	-	235	-	5	0	0	45
	18.1	منشآت فنية لشارع القاعدة الجوية وشارع الحسن الثاني (2 منشآت الفنية)	الجماعة	10	200	210	210	-	-	10	10	0	65
تأهيل احياء المدينة	19.1	تهيئة مقطع الطريق الواقعة بين شارع القاعدة الجوية والممر العلوي لطريق القنيطرة RN1	العيادة	15	30	45	-	45	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15
	20.1	تهيئة شارع محمد الخامس (الشطر 2)	العيادة	-	30	30	-	30	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	5
تأهيل احياء المدينة	21.1	تهيئة شارع عبد الخالق الطريس (المقطع الواقع بين مدار الاسماعلية وشارع عبد الرحيم بوعبيد)	بطانة - تابريكت	40	36	76	-	76	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	22.1	بناء مقطع الطريق الواقعة بين طريق اريحا وطريق القاعدة الجوية.	العيادة	1,5	3	4,5	4,5	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	23.1	تهيئة وبناء شارع النصر (المقطع الواقع بين شارع الامانة وشارع سيدي ابراهيم بولعجول).	العيادة	4	12	16	16	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15
	24.1	بناء الطريق الواقعة بين القاعدة الجوية وطريق الحمري	العيادة	13	26	39	39	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	25.1	بناء وتهيئة مقطع الطريق الواقع بين شارع محمد الخامس و حي الامل	العيادة	6,5	19	25,5	25,5	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15
	26.1	بناء الطريق الرابطة بين شارع القاعدة الجوية وشارع 20 غشت	بطانة		11	11	11	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15
	27.1	تهيئة شارع مديونة	بطانة		8	8	8	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	28.1	بناء الطريق المؤدية الى مقبرة سيدي الضاوي محادية لمدرسة إدريس الأزهر	تابريكت	0,5	2	2,5	2,5	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	29.1	بناء الطريق الرابطة بين شارع محمد الخامس و تجزئة سيدي عبد الله مرورا ب بجانب مقبرة سيدي الضاوي.تجزئة سيدي عبد الله	تابريكت	4	16	20	20	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	30.1	تهيئة شارع محمد الخامس (المقطع الواقع بين مدار حي كريمة وشارع دال	تابريكت	-	15	15	15	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	15
	31.1	بناء الطريق الواقع بين شارع السلام وشارع 6 نونبر	تابريكت	2	16	18	18	-	في طور الترافع	5	0	0	15
	32.1	تهيئة طريق مهدية (المقطع الواقع بين مركز الحليب وتجزئة شمس)،	باب المريسة والعيادة	3	50	53	53	-	البطاقة التقنية منجزة من طرف المقاطعة الجزء المتعلق بباب لمريسة	-	10	0	15
تأهيل احياء المدينة	33.1	تهيئة وبناء شارع النصر (المقطع الواقع بين شارع الامانة وشارع سيدي ابراهيم بولعجول).	العيادة	-	8	8	8	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	5
	34.1	تهيئة وبناء شارع النصر (المقطع الواقع بين شارع الامانة وشارع سيدي ابراهيم بولعجول).	العيادة	-	8	8	8	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	5

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	35.1	تهيئة الطريق الواقعة بين شارع ابن الهيثم ومدرسة احمد شوقي	العيادة	-	2	2	2	-	تهيئة الرصيف إلى غاية شارع النصر	-	10	30	40
	36.1	بناء الطريق الواقعة بين دوار حلاله و ط ر 4004.	العيادة	-	10	10	10	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	37.1	بناء الطريق الواقعة بين طريق اريحا SLA35 و طريق سيدي ابراهيم بولعجول RP4004	العيادة	-	5	5	5	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	38.1	بناء شارع الامانة والطريق المحيطة بقطاع حي الرحمة "A"	العيادة	-	6	6	6	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	39.1	تهيئة مقطع الطريق الواقع بين السكة الحديدية وشارع النصر بحي الامل	العيادة	-	14	14	14	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	40.1	تهيئة شارع ولباس (المقطع الواقع بين شارع محمد الخامس وشارع النصر)	العيادة	-	4,5	4,5	4,5	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
تأهيل احياء المدينة	41.1	بناء الطريق بين شارع اريحة و SLA35	العيادة	-	0,5	0,5	0,5	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	42.1	بناء الطريق الواقعة بين مستودع الصحة ومدرسة حمزة بن ابي طالب	بطانة	-	1	1	1	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	43.1	تهيئة شارع الصحراء، المقطع الممتد بين عبد الخالق الطريس الى عبد الكريم الخطابي، بطانة	بطانة	-	8	8	8	-	مشروع منجز	5	0	0	100
	44.1	بناء طريق الحزام سكتور 8 ، حي النصر - قرية اولاد موسى	احصين	-	3	3	3	-	مشروع متوقف	-	-	-	5
	45.1	بناء شارع الامير مولاي رشيد (المقطع الرابط بين قطاع 8 والولجة) - قرية اولاد موسى	احصين	2,5	11,5	14	14	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	20
	46.1	بناء وتمديد شارع مولاي اسماعيل ، حي الرشاد - قرية اولاد موسى	احصين	-	1	1	1	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	47.1	بناء الطريق الرابطة بين شارع مولاي رشيد وشارع حمان الفطواكي - قرية اولاد موسى	احصين	-	2	2	2	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	48.1	بناء الطريق الواقعة بين G43 وبين مدرسة محمد الحياني ، سكتور 2 قرية اولاد موسى	احصين	-	1	1	1	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022 2023	الكلفة للفترة -2018 2021	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2	2	2	-	احصين	بناء الطريق الرابطة بين شارع مولاي رشيد وشارع مولاي عبد الحفيظ - قرية اولاد موسى	49.1	
100	60	40	-	مشروع منجز	-	3	3	3	-	احصين	بناء الطريق الرابطة بين تجرئة السلام وحي الامل - قرية اولاد موسى	50.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	1	1	1	-	احصين	بناء الطريق الواقعة بقطاع 5، حي النهضة - قرية اولاد موسى	51.1	تأهيل احياء المدينة
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2,5	2,5	2	0,5	احصين	بناء الطريق الواقعة بقطاع 6، حي الكفاح (خلف دار الطالبة) - قرية اولاد موسى	52.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2	2	2	-	باب المريسة	بناء الطريق الواقعة بين تجرئة الغرابلية واقامة ام هاني	53.1	
10	0	10	-	البطاقة التقنية منجزة من طرف المقاطعة الجزء المتعلق بباب لمريسة	-	5	5	4	1	باب المريسة	بناء مقطع الطريق الرابط بين طريق مهدية والطريق الساحلي	54.1	

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022 2023	الكلفة للفترة -2018 2021	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
10	0	10	-	البطاقة التقنية منجزة من طرف المقاطعة الجزء المتعلق بباب لمريسة	-	1,5	1,5	1	0,5	باب المريسة	بناء مقطع الطريق الرابط بين تجزئة دادا وتجزئة السلام	55.1	
100	0	0	5	مشروع منجز	-	4	4	4	-	باب المريسة	بناء مقطع الطريق الرابط بين شارع "السلام" وشارع بلافريج	56.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2,5	2,5	2,5	-	باب المريسة	بناء مقطع الطريق الواقعة بملاحقة الشرف	57.1	
100	0	0	5	مشروع منجز	-	4,5	4,5	3	1,5	باب المريسة	بناء مقطع الطريق الرابط بين مستودع الشاوي والسوق الممتاز كارفور	58.1	
20	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	3,5	3,5	3	0,5	باب المريسة	بناء مقطع الطريق المؤدية الى الحي الصناعي - طريق القنيطرة -	59.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	1	1	1	-	تابريكت	تهيئة مقطع الطريق الواقع بين المركز الصحي المزرعة ومحكمة الاسرة	60.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	1	1	1	-	تابريكت	تهيئة مقطع الطريق الواقع بين مستودع الاموات ومحكمة الاسرة حي المزرعة (الشطر2)	61.1	تأهيل احياء المدينة

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022-2023	الكلفة للفترة -2018-2021	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	3,5	3,5	3,5	-	تابريكت	تهيئة شارع الصحراء (المقطع الرابط بين حي الروسطال وحي السلام (قطاع 9)	62.1	
65	0	0	5	-	-	5	5	4	1	تابريكت	اتهام أشغال بناء شارع علي بن أبي طالب إلى سيدي عبد الله	63.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2	2	2	-	تابريكت	اتهام أشغال بناء شارع الحرية (امام إقامة رزق الله ومدرسة سعد بن ابي وقاص)	64.1	
50	0	0	5	-	-	3	3	3	-	تابريكت	بناء الطريق الواقع بين اقامة 20 غشت وحي راس الماء	65.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	1	1	1	-	تابريكت	بناء الطريق الواقع بين اقامة 20 غشت واقامة إياد	66.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	4	4	4	-	تابريكت	بناء الطريق الرابط بين حي الرحمة قطاع E وتجزئة سيدي عبد الله (امام مدرسة محمد العقاد)	67.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2,5	2,5	2	0,5	تابريكت	بناء الطريق المؤدية الى مقبرة سيدي الضاوي (خلف مدرسة إدريس الأزهر)	68.1	

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	المجموع (مليون الدرهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	69.1	تهيئة الطريق المسمى آيت اعمار ، حي الانبعاث	تابريكت	-	2	2	2	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	70.1	تهيئة شارع تاكوريت ، حي الانبعاث (TA 104 في تصميم التهيئة السابق)	تابريكت	-	1	1	1	-	مشروع منجز	5	0	0	100
	71.1	بناء الطريق الرابط بين قطاع "الف" وقطاع "واو" عبر المنحدر	تابريكت	-	2	2	2	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	72.1	بناء الطريق الرابط بين قطاع "الف" وقطاع "واو" مرورا بمسبح حي الرحمة SP06	تابريكت	-	1	1	1	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	73.1	تهيئة شارع 6 نوفمبر	تابريكت	-	20	20	20	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	20
تأهيل احياء المدينة	74.1	مساحة خضراء	شارع المسيرة الخضراء، بطانة	-	1	1	1	-	مشروع منجز	5	0	0	100
	75.1	مساحة خضراء	بداية شارع عبد الخالق الطريس تابريكت	-	2	2	2	-	مشروع منجز	-	40	0	100
	76.1	مساحة خضراء	تجزئة المستقبل العيادية	-	5	5	5	-	في طور الترافع مع الشركاء	5	0	0	10
	77.1	مساحة خضراء	سيدي عبدالله، العيادية	-	4	4	4	-	في طور الانجاز	-	10	20	30

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022-2023	الكلفة للفترة -2018-2021	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	4	4	4	-	سيدي عبدالله، العيايدة	مساحة خضراء	78.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	3,5	3,5	3,5	-	سيدي عبدالله، العيايدة	مساحة خضراء	79.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	6	6	3,5	2,5	سيدي عبدالله، العيايدة	مساحة خضراء	80.1	
100	20	10	-	مشروع منجز	-	4	4	2	2	شارع الحسن الثاني سلا الجديدة احصاين	مساحة خضراء	81.1	تأهيل احياء المدينة
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2,5	2,5	2,5	-	قطاع "أ" تابريكت	مساحة خضراء	82.1	
100	0	0	5	مشروع منجز	-	12	12	2	10	الحديقة، العيايدة	مساحة خضراء	83.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	3,5	3,5	1,5	2	خلف مدرسة عبد الله بن حسون سلا الجديدة - احصاين -	مساحة خضراء	84.1	
100	50	10	-	مشروع منجز	-	2	2	1	1	شارع 6 نونبر	مساحة خضراء	85.1	

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022 2023	الكلفة للفترة -2018 2021	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	3	3	1,5	1,5	خلف مدرسة سيدي احمد بنعاشر سلا الجديدة - احصاين	مساحة خضراء	86.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2	2	2	-	شارع 6 نونبر - جزء من المنطقة الخضراء - 55تأبريكت	ملعب شارع 6 نونبر	87.1	
100	0	0	5	مشروع منجز	-	2,5	2,5	1,5	1	شارع للا أسماء تأبريكت	مساحة خضراء	88.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	6	6	4	2	الحي العسكري العيايدة	مساحة خضراء	89.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	1,5	1,5	0,5	1	شارع الفقيه بن علي الدكالي سلا الجديدة - احصاين	مساحة خضراء	90.1	

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022 2023	الكلفة للفترة -2018 2021	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2,5	2,5	2,5	-	شارع محمد الخامس قرية اولاد موسى احصاين (G43 selon (l'ancien PA	مساحة خضراء	91.1	تأهيل احياء المدينة
100	0	0	5	مشروع منجز	-	4	4	4	-	سعيد حجي الشبكة المركزية	مساحة خضراء	92.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	2	2	2	-	سعيد حجي إقامة نسيم البحر	مساحة خضراء	93.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	1	1	1	-	تمت طريق القنيطرة سعيد حجي	مساحة خضراء	94.1	
100	0	0	5	مشروع منجز	-	1,5	1,5	1,5	-	إقامة البشير حديقة البشير 1	مساحة خضراء	95.1	
10	0	0	5	في طور الترافع مع الشركاء	-	3	3	3	-	قطاع الألفة، شارع النصر لعيادة	مساحة خضراء و فضاء لألعاب الأطفال	96.1	

البرنامج	رقم المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2022-2023	الكلفة للفترة -2018-2021	حالة تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الإنجاز (%)
	97.1	تهيئة مساحة خضراء	تجزئة سعيد حجي باب المريسة	1,5	6	7,5	-	7,5	مشروع منجز	-	40	60	100
	98.1	ساحة عمومية	جوار مدرسة الزبير ابن العوام باب المريسة	1,5	1,5	3	-	3	مشروع منجز	-	40	60	100
	99.1	احداث مراحيض عمومية	تابريكت- لمريسة-بطانة- احصاينالعيادة	-	5	5	-	5	إطلاق الصفقة + أنجز مرحاض واحد بسعيد حجي	-	10	15	40
	100.1	اعادة هيكلة الاحياء ناقصة التجهيز	تابريكت - باب المريسةالعيادة - بطانة - احصاين	-	240	240	-	240	-	5	0	0	90
	101.1	مستودع السيارات تحت الأرضي	حي السلام	5,25	45	50,25	50,25	-	المرحلة الثانية	-	-	-	-
	102.1	مستودع السيارات تحت الأرضي	حديقة الفردوس باب المريسة	3,73	32	35,73	-	35,73	ألغي	5	0	0	-
	103.1	مستودع السيارات تحت الأرضي	قرب مسجد الشيخ زايد	3,15	27	30,15	30,15	-	المرحلة الثانية	-	-	-	-

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022-2023	الكلفة للفترة -2018-2021	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
100	50	40	10	مشروع منجز	-	1193,1	193,10 1	132,34 1	60,76	المقطع الفاصل بين شارع الحسن الثاني والمستشفى الاقليمي باحصاين	تمديد خط الطرامواي إلى المستشفى الإقليمي لسلا	111.1	تعزيز بنية النقل والتنقل
60	0	10	-	في طور الدراسة	-	540	540	500	40	المقطع الفاصل بين المستشفى الاقليمي باحصاين وجامعة محمد الخامس بسلا الجديدة	تمديد خط الطرامواي إلى شارع اوطاحصين	112.1	
25	0	10	-	في طور الدراسة	-	800	800	750	50	المقطع الفاصل بين جامعة محمد الخامس بسلا الجديدة وسلا الجديدة	تمديد خط الطرامواي إلى سلا الجديدة	113.1	

نسبة الإنجاز (%)	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	حالة تقدم المشروع	الكلفة للفترة -2022-2023	الكلفة للفترة -2018-2021	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
15	0	10	-	تم الشروع في دراسة منظومة المرور المتعلقة بالمدينة العتيقة	-	70	70	70	-	غير محدد	احداث منظومة مندمجة للتحليل والإدارة الذكية لحركة المرور	114.1	

مشروع: تمديد خط الترامواي إلى المستشفى الإقليمي لسلا

- مشروع منجز -

صاحب المشروع: شركة الترامواي الرباط - سلا

موقع المشروع: المقطع الفاصل بين شارع الحسن الثاني ببطانة والمستشفى الإقليمي
باحصين. (الخط الثاني)

مسافة الخط : 7 كيلومتر

تكلفة المشروع: 1.7 مليار درهم

مساهمة الجماعة: 135 مليون درهم (تكلفة العفار)

تقدم الأشغال: 100 % (مشروع منجز)



المحور الثاني: ترميم تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة

يتعلق المحور الثاني بترميم تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة ويضم 54 مشروعاً موزعة على تسعة برامج بتركيبة مالية تبلغ 802.10 مليون درهم.

المرحلة الثانية	المرحلة الأولى	كلفة المشروع	كلفة الأشغال	كلفة العقار	عدد المشاريع	البرنامج
50.00	70.50	120.5	119.5	1.00	9	ترميم وتأهيل الأسوار والأبواب والبيوت التاريخية
-	50.00	50.00	50.00		8	ترميم وإعادة تأهيل المواقع الدينية والثقافية
-	144.7	144.7	139.7	5	6	تأهيل البنية التحتية الأساسية تأهيل الفضاء العام للمدينة العتيقة
-	74.9	74.9	69.4	5.5	10	تعزيز بنية الخدمات العامة
19.00	45.5	64.5	57.5	7	10	تعزيز البنية الاقتصادية
-	64	64	55	9	5	ترميم وتأهيل الفنادق
-	30	30	30		1	تأهيل المواقع الاجتماعية والاقتصادية
-	187	187	187		1	معالجة المباني الآيلة للسقوط
-	66.5	66.5	66.5		4	تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة
69.00	733.10	802.10	774.6	27.50	54	المجموع

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المحور كان موضوع اتفاقية إطار لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا 2019-2023، والموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدينة مراكش بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والتي بلغت قيمتها 900 مليون درهم بشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وتروم الاتفاقية الاطار لبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا (2019/2023) الحفاظ على هوية المدينة العتيقة ومعالمها الأصيلة، وتأهيل وإعادة الاعتبار لنسيجها العتيق، وإدماجها في منظومة تنموية تهدف إلى تثمين تراثها المادي واللامادي.


ويتوزع مضمون برامج الاتفاقية على أربع محاور رئيسية:

- تأهيل البيئة التحتية وتحسين السير والجولان؛
- ترميم وإعادة تأهيل التراث التاريخي؛
- تعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية؛
- تقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحية.

ويساهم في تمويل هذه الاتفاقية صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الثقافة والاتصال، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، ومجلس جماعة سلا، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ومؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة)، ومجلس عمالة سلا.

خلال سنة 2022 استمر انجاز المشاريع المبرمجة، حيث استمرت الأشغال في مجموع المشاريع المنطلقة كما تم الشروع في إنجاز تلك المبرمجة برسم سنة 2022. وقد التزمت الجماعة بتحويل حصة مساهمتها المالية برسم سنة 2022 والتي بلغت 37 مليون درهم. حيث تم استكمال إنجاز ثماني مشاريع في حين بلغ عدد المشاريع المنطلقة 24، في حين انطلقت الدراسة في 3 مشاريع.

نسبة الإنجاز برسم سنة 2022	2022	2021	وضعية المشروع
64,81%	8	5	مشاريع منجزة
	24	27	في طور الإنجاز
	3	5	في طور الدراسة
	18	15	في طور الترافع
	1	1	الملغاة
	54	54	المجموع

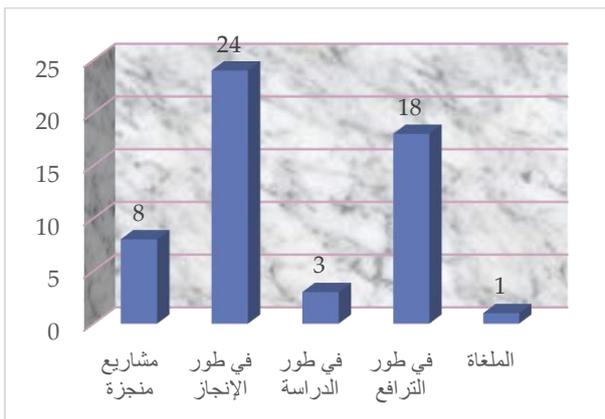

بالنسبة لمحور تثمين المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة فإن عدد المشاريع المنجزة انتقل من 5 مشروع إلى 8 مشروعا، كما شرع في إنجاز 24 مشروع، وبلغ عدد المشاريع التي في طور الدراسة من 3 مشروعا في سنة 2022

فيما يلي جدول تفصيلي لتقدم المشاريع المدرجة في هذا المحور:

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
100	50	40	10	مشروع منجز	-	13	13	13	-	غرب المدينة العتيقة (جهة بحري)	الأبراج و الواجهة الغربية : ترميم الأسوار و الأبراج للواجهة البحرية	1.2	ترميم وتأهيل الأسوار و الأبواب و البيوت التاريخية
100	50	40	10	مشروع منجز	-	32	32	32	-	الصور التاريخي	ترميم الأسوار و الأبراج	2.2	
10	0	0	5	في طور الترافع	-	6	6	6	-	تابريكت + باب شعفة	قناة المياه بناء الممرات لمرور السيارات وإعادة ترميم قناة المياه	3.2	
100	50	40	10	مشروع منجز	-	3	3	3	-	أسوار المدينة العتيقة	ترميم و اعادة تهيئة الأبواب القديمة: باب معلقة، باب شعفة، باب سبتة	4.2	
80	30	40	10	في طور الإنجاز	-	3	3	3	-	أسوار المدينة العتيقة	ترميم و اعادة تهيئة الأبواب القديمة: باب الصنعة ، باب لمريسة	5.2	
10	0	10	-	اقتراح معماري لتجسيم الباب الاصلي لباب بوحاجة	-	5	5	5	-	الطريق الساحلي	اعادة بناء باب سيدي بوحاجة تجديد القببات ، أشغال كبرى وأشغال ثانوية	6.2	

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات النقنية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
50	0	40	10	الدراسة انجزت والاشغال ستنتقل	-	3,5	3,5	3,5	-	السور الجنوبي	باب الجديد إعادة بناء الباب (ممر السيارات وممر الراجلين)	7.2	
40	0	40	-	في طور الافراغ من القاطنين (5 أسر) وتمت الموافقة على مشروع المهندس المعماري ومكتب الدراسات بترميمها واعادة تدعيمها	-	5	5	4	1	رقم 10 ، درب شرقو	تحويل الدار الكبيرة الى مركز للتكوين و البحث في التراث (أشغال إصلاح وتأهيل الدار)	8.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	50	-	50	50	-	سيدي عبد الله بن حسون، زنقة باشا الصبيحي، باب احصين، درب بن الرايس، سانية حصار، زنقة سيدي عبد الله بن حسون	دار بنخضرة - دار الكتاني - دار الصبيحي - دار العلوي - دار الصابونجي (135 م2) - دار زنيبر (متحف) أشغال التدعيم، إصلاح وتأهيل الدور	9.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	2	2	2	-	زنقة الطالعة، قرب المسجد الكبير	المدرسة المرينية إعادة تأهيل وتثمين المعارض المؤقتة والدايمة (أشغال ترميم سطح المأكسة)	10.2	ترميم وإعادة تأهيل المواقع الدينية و الثقافية

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات النقوية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
100	50	40	10	مشروع منجز	-	2	2	2	-	كورنيش سيدي موسى، خارج المدينة العتيقة	قصة كناوة أشغال إعادة التأهيل (التجهيز والانارة العمومية)	11.2	
100	50	40	10	مشروع منجز	-	15	15	15	-	باب احساين	تهيئة و تحويل مدرسة للا أسماء الى مركز للاستقبال (مأوى للشباب)	12.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	1	1	1	-	زنقة بورمادة	صومعة المكرجة : إعادة هيكلة المعلمة	13.2	
15	0	0	5	-	-	7	7	7	-	• سيدي احمد الطالب، مول الكمري، • سيدي ابراهيم بن عمران الغازية، مولا نوبة، عبد الله الغود، قاسم الغليض، سيدي لحسن العايدي،*سيدي علي بن أيوب،سيدي احمد حجي	الأضرحة	14.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	6	6	6	-	القادرية، ، التيجانية، العيساوية الناصرية، سيدي عبد الله بن شاقور، الغازية، التهامية، المباركية، الصديقية، الدرقاوية، الكتانية،	الروايا	15.2	

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
30	30	0	-	في طور الإنجاز	-	2	2	2	-	بومسلك بن خضرة سيدي مغيث، الرهبية لخيار، راس الشجرة البلدة، بوقاع مولاي التهامي، الصف مكتب التيال، باب احساين، سيدي مشيش، سوق الكبير، درب الشماخ	الكتاتيب القرآنية	16.2	
35	35	-	-	تم اعادة تهيئة مسجد سوق الغزل + تم اطلاق الدراسات بالنسبة لباقي المساجد	-	15	15	15	-	الزرقة، سيد مغيث سيدي الحاج احمد بنعاشر الصديق، سيدي المعطي للا الغافلة، زاوية الحنصالية سيدي علي الغرناطي، للا منانة مولي التهامي، سيدي احمد بنعماربنعاشر الاندلسي، سوق الغزل، سيدي مشيش، للاشبهة، توهامة سيدي لحسن العايدي	المساجد	17.2	
100	50	40	10	مشروع منجز	-	60	60	60	-	المدينة العتيقة	تهيئة الشوارع و الأزقة بالمدينة العتيقة و ترميم الواجهات	18.2	تعزيز البنية التحتية الأساسية تأهيل الفضاء العام للمدينة العتيقة

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
95	45	40	10	تم انجاز الجردة قساطلة والسور	-	13	13	8	5	•الجردة ، •للا حسناء ، •سيدي عبدالله بن حسون ، •قساطلة ، •السور	تهيئ مواقع السيارات واقتناء العقارات اللازمة	19.2	
70	30	30	10	-	-	15	15	15	-	• قساطلة •الطريق الساحلي للمدينة العتيقة مقابل سيدي عبد الله بن حسون •باب سبتة، ساحة سوق الغزل	تهيئة الحدائق و الساحات العمومية	20.2	
50	0	40	10	انجاز الدراسة من طرف الوكالة	-	50	50	50	-	فضاء سيدي بنعاشر	تهيئة ساحة سيدي بنعاشر	21.2	
70	20	40	10	في طور الانجاز بعد انجاز الدراسات	-	5	5	5	-	زناتة ، سانية بوعلو سيدي عبد الله بنحسون المدرسة ، سانية حصار، رأس الشجرة ، درب الخيار، سوق الغزل ، سيدي امشيش ، سوق الكبير ، الصف ، سيدي لحسن العيدي ، لبيدة ، سقاية اللبن، مولا نوبة، راس الموقف، الشلالين، باب احساين، دار الشرع	إعادة تأهيل النافورات العمومية	22.2	

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
95	45	40	10	-	-	1,7	1,7	1,7	-		تأهيل حي الملاح	23.2	
15	0	0	15	مصادقة المجلس على مقرر نزع الملكية ودعوة لجنة التقييم للانعقاد	-	12	12	10	2		تحويل فندق لاركو لفضاء للتنمية والتنشيط الثقافي (قاعة للعرض، جناح للفن، ورشة للتجارب)	24.2	تعزيز بنية الخدمات العامة
5	0	0	5	في طور الترافع	-	5	5	4	1		اقتناء و تهيئة فندق الحرارين	25.2	
100	50	40	10	مشروع منجز	-	14,5	14,5	14,5	-	مدرسة ابن تومرت	تحويل مدرسة ابن تومرت الى مركز ثقافي	26.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	3,9	3,9	3,9	-	نظارة الاحباس	إعادة تأهيل نظارة الأحباس	27.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	1	1	1	-	الملحقة الادارية	تحويل الملحقة الإدارية الى ورشة لتأهيل المدينة القديمة	28.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	1,5	1,5	1,5	-	•سوق الكبير •سيدي عبد الله بن حسون	بناء مركزين للشرطة	29.2	

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأعمال	القيام بالدراسات النقوية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
5	0	0	5	في طور الترافع	-	15,5	15,5	13	2,5		اقتناء وتهيئة فندق سيدي ايدر وتحويله الى دار الشباب	30.2	
90	40	40	10	تأهيل خمسة مؤسسات مع تهيئة المحيط المدرج في المشروع رقم 18	-	8	8	8	-	المدينة العتيقة	إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية "إصلاح ، ترميم وتهيئة المناطق المحيطة بها"	31.2	
70	30	40	-	تم تهيئة باب سبتة والجردة ومركز الفضاء الصحي	-	5,5	5,5	5,5	-	•مركز باب الخميس •مركز باب سبتة •مركز الجردة •مركز الفضاء الصحي	إعادة تأهيل المؤسسات الصحية بالمدينة العتيقة أشغال الترميم ، تهيئة الفضاءات والجوانب، تجهيز المراكز وإعادة تهيء المباني	32.2	
100	60	40	-	مشروع منجز	-	8	8	8	-	المدينة العتيقة	اعادة تأهيل المؤسسة الصحية باب الخميس	33.2	
-	-	-	-	المرحلة الثانية	-	5,5	5,5	3	2,5	المدينة العتيقة	تهيئة ساحة دار الدباغ	34.2	تعزيز البنية الاقتصادية
30	0	20	10	في طور الدراسة	-	8	8	6	2	فندق الرحبة القديمة	تحويل فندق الرحبة القديمة الى سوق للقرب	35.2	
30	0	20	10	في طور الدراسة	-	12	12	10	2	المدينة العتيقة	تهيئة فندق بوعودة وتحويله الى مركز لحرف الصناعة التقليدية	36.2	

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات النقية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
95	30	40	10	في طور الانجاز	-	6	6	6	-	المدينة العتيقة	اعادة تهيئة و توسيع مركب الصناعة التقليدية و التهيئة الخارجية	37.2	
10	0	10	_	انجاز الدراسة	-	2,5	2,5	2	0,5	راس الموقف	بناء مقر الشرطة + الوقاية المدنية	38.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	3	3	3	-	المدينة العتيقة	تأهيل سوق الخضارين	39.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	13	_	13	13	-	المدينة العتيقة	بناء مركز التكوين متخصص	40.2	
15	0	0	5	في طور الترافع - بطاقة تقنية	6		6	6		المدينة العتيقة	تحويل فندق بوعلام الى دار المعلمة "البلغة"	41.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	3,5	3,5	3,5	-	باب المريسة	تحويل أروقة العرض التي بنيت داخل المدينة القديمة إلى أسواق مغطاة	42.2	
40	0	30	10	الدراسة انجزت	-	5	5	5	-	المدينة العتيقة امام مركب الصناعة التقليدية	احداث فضاء لعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية	43.2	
90	50	30	10	انجزت الدراسة + انطلاق الاشغال + استئناف الأشغال بعد التوقف	-	8	8	8	-	17، السوق الكبير	تحويل فندق القاعة الى تجهيز القرب (دار المعلمة السلاوية، دار الزربية)	44.2	ترميم وتأهيل الفنادق

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
70	30	30	10	الاشغال في طور الانجاز من طرف مجلس العمالة	-	16	16	16	-	17، باب سبتة ، السوق الكبير	تحويل فندق التريبعة ومقهى بنعاشر الى تجهيز القرب (المركب الحرفي)	45.2	
20	0	0	20	في طور استصدار المرسوم النهائي لنزع الملكية	-	10	10	8	2	فندق زنيبر	اقتناء، إعادة التأهيل، وتحويل فندق ازنيبر الى دار الشباب	46.2	
5	0	0	5	إفراغ القاطنين وهدم البناية الآيلة للسقوط في انتظار بدء اجراءات مسطرة نزع الملكية	-	10	10	8	2	فندق حجي (اسباني)	اقتناء ، إعادة التأهيل، وتحويل فندق حجي الى مركز متعدد الإختصاصات	47.2	
90	20	40	30	في طور الانجاز التوام ودار الصابون	-	20	20	15	5	المدينة العتيقة	تهيئة 3 فنادق (الأحباس) الخضارين، دار الصابون، التوام	48.2	
65	25	30	10	تهيئة القيساريات القيسارية المربعة انجزت + الباقي في طور الانجاز	-	30	30	30	-	الدهابية، قيسارية سوق الغزل السوق الكبير الحدادين النجارين	تهيئة المسارات التجارية	49.2	تهيئة المواقع الاجتماعية والاقتصادية
45	5	30	10	مشروع في إطار اتفاقية: 620 بناية تم اصلاح 7 بنايات و 10 تم طلب رخص اصلاحها من طرف العمران	-	187	187	187	-	المدينة العتيقة	تدعيم و ترميم 750 بناية آيلة للسقوط و دعم الإفراغ المؤقت	50.2	معالجة المباني الآيلة للسقوط

نسبة الإنجاز 2020	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنية	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	تقدم المشروع 2020	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021 _ 2018	المجموع) مليون درهم (درهم)	الأشغال) مليون درهم (العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رقم المشروع	البرنامج
90	40	40	10	-	-	33,5	33,5	33,5	-	باب فاس، سيدي التري، سيدي لحسن العايدي، سوق الكبير، سوق الغزل، باب احساين، القساطلة، العقبة، الجامع الكبير	تهيئة المسار السياحي	51.2	تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة
40	مشروع متوقف	30	10	مشروع متوقف بسبب وجود الحفريات	-	10	10	10	-	المدينة العتيقة سلا	تثمين موقع دار البارود: تقوية الموقع الاركيولوجي	52.2	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	10	10	10	-	المدينة العتيقة	تهيئة متحف التسامح بالكنيسة	53.2	
-	-	-	-	ادمج مع المشروع 51	-	13	13	13	-	ساحة سوق الغزل	المسار التفسيري للمدينة العتيقة سلا (d'interprétation	54.2	

مشروع ترميم وتأهيل الأسوار والأبواب والبيوت التاريخية

- مشروع منجز -

اسم المشروع:

ترميم الأسوار والأبراج للواجهة البحرية - غرب المدينة العتيقة (جهة بحري)

ترميم الأسوار والأبراج - السور التاريخي

ترميم وإعادة تهيئة الأبواب القديمة - باب معلقة، باب شعفة وباب سبتة

التكلفة الإجمالية: 40 مليون درهم

نسبة الإنجاز: 100 %




المحور الثالث : التنشيط السياحي والاقتصادي ودعم الاستثمار

تضمن المحور الثالث المتعلق بالتنشيط السياحي والاقتصادي ودعم الاستثمار 35 مشروعاً موزعة على تسعة برامج بتكلفة مالية تقدر بـ 1060 مليون درهم. إذ سيتم العمل على إنجاز 22 مشروعاً في المرحلة الأولى من البرنامج بتكلفة تقدر بـ 718 مليون درهم.

البرامج	عدد المشاريع	كلفة تعبئة العقار	كلفة إنجاز الأشغال	كلفة المشاريع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2020 - 2018	الكلفة للفترة 2023 - 2021
تطوير المرافق العامة الجماعية	2	12.00	261.00	273.00	273.00	0.00
تثمين العقار الصناعي	2	10.00	64.00	74.00	74.00	0.00
خلق فضاءات خاصة بالأنشطة الاقتصادية	1	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00
إنشاء أورش الإنتاج والتسويق	4	18.00	34.00	52.00	22.00	30.00
إنشاء المشاريع المدرة للدخل	6	59.00	204.00	263.00	165.00	98.00
تعزيز فضاءات عرض المنتوجات اليدوية	14	24.00	74.00	98.00	59.00	39.00
تنظيم الأنشطة المزعجة والملوثة	3	0.00	40.00	40.00	15.00	25.00
البرنامج الجماعي لدعم التشغيل	2	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
تعزيز المؤهلات السياحية للمدينة	1	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
المجموع	35	123.00	937.00	1060.00	718.00	342.00

وضعية المشروع	2021	2022	نسبة الإنجاز برسم سنة 2022
مشاريع منجزة	4	4	42,86%
في طور الإنجاز	2	2	
في طور الدراسة	9	9	
في طور الترافع	19	19	
الملغاة	1	1	
المجموع	35	35	

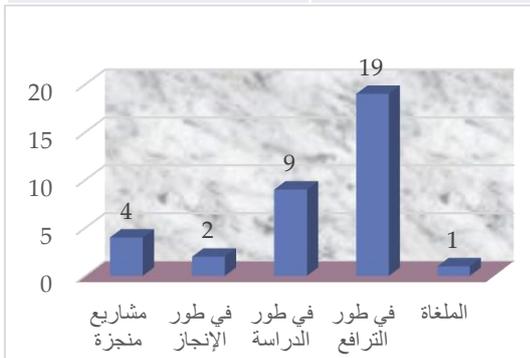

بين سنتي 2021 و2022 بقي عدد المشاريع المنجزة والمشاريع في طور الإنجاز والمشاريع في طور الدراسة ثابتاً.

الجدول التالي تفصيل لتقدم كل مشروع من مشاريع هذا المحور:

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الانجاز	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالاداسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز
تطوير المرافق العامة الجماعية	1.3	بناء مجزرة	سوق الاحد أبي القنادل	-	153	153	153	-	مشروع منجز	30	30	40	100
	2.3	بناء المحطة الطرقية	سلا الجديدة احصين	12	108	120	120	-	تم تخصيصها في تصميم التهيئة الحالي	5	0	0	5
تتمين العقار الصناعي	3.3	مشتل المقاولين الشباب	طريق القنيطرة	10	50	60	60	-	الاتفاقية في طور المصادقة من طرف المجلس	5	0	0	5
	4.3	تأهيل الحي الصناعي بتابريكت	حي الرحمة تابريكت	-	14	14	14	-	مشروع منجز	-	40	60	100
خلق فضاءات خاصة بالأنشطة الاقتصادية	5.3	تطوير منطقة حرة	تيكنوبوليس	-	200	200	200	100	في طور الترافع	5	0	0	5
إنشاء أورش الإنتاج والتسويق	6.3	ورشتين للباس التقليدي (الطرزو البلغة , , , , ,)	العيادة - احصاين	5	10	15	-	15	في طور الترافع	5	0	0	5
	7.3	ثلاث ورشات للنجارة (الفن والبناء)، النحت على الخشب والمعدن، والمجوهرات	العيادة - احصاين	5	10	15	-	15	في طور الترافع	5	0	0	5
	8.3	ثلاث ورشات للخزف والنقش على الحجر والجص , , ,	العيادة	5	10	15	-	15	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2018-2021	الكلفة للفترة 2022-2023	تقدم الانجاز	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالداستات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز
	9.3	إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية و الحرفية	حي مولاي اسماعيل، طريق الزربية، بطانة	3	4	7	7	-	مشروع منجز	30	30	35	100
	10.3	مركب الأنشطة و الحرف المدرة للدخل	قرب سيدي عبد الله - العيايدة	15	50	65	65	-	في طور الترافع	5	0	0	5
إنشاء المشاريع المدرة للدخل	11.3	مركب الأنشطة و الحرف المدرة للدخل	تجزئة شمس - العيايدة	10	25	35	35	-	الاتفاقية ستعرض على المجلس للموافقة في دورة مقبلة	5	0	0	5
	12.3	مركب الأنشطة و الحرف المدرة للدخل	دوار حلالة - العيايدة	24	70	94	94	94	الاتفاقية ستعرض على المجلس للموافقة في دورة مقبلة	5	0	0	5
	13.3	مركب الأنشطة و الحرف المدرة للدخل	شارع احصاين، سلا الجديدة - احصاين	10	20	30	30	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	14.3	مركز تكوين الشباب (بحري)	سعيد حجي، باب المريسة	-	4	4	4	4	في طور الترافع	5	0	0	5
	15.3	إعادة هيكلة مركب الوجلة للخزافين	ضفة ابي رقرق	-	35	35	35	-	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الانجاز	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز
تعزيز فضاءات عرض المنتوجات اليدوية	16.3	أماكن العرض خلال المناسبات	باب لمريسة - بطانة - تابريكت - العيايدة واحصاين	5	10	15	-	15	في طور الترافع	5	0	0	5
	17.3	سوق القرب	شارع الفيدا , قطاع بدر العيايدة ??	0,63	2	2,63	-	2,63	في طور الترافع	5	0	0	5
	18.3	سوق القرب	حالة العيايدة	0,5	3	3,5	3,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	19.3	سوق القرب	لبونطي , المحيط العيايدة	2,13	12	14,13	-	14,13	في طور الترافع	5	0	0	5
	20.3	سوق القرب	الخروبة بطانة	2	5	7	7	-	الدراسة في المرحلة النهائية + نزع الملكية في مرحلة استصدار المرسوم النهائي	15	10	0	25
تعزيز فضاءات عرض المنتوجات اليدوية	21.3	سوق القرب	حي السلام بطانة	1,4	2	3,4	-	3,4	في طور الترافع	5	0	0	5
	22.3	سوق القرب	حي السلام إضافي بطانة	1	3	4	4	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	23.3	سوق القرب	سيدي عبد الله العيايدة	0,84	3	3,84	-	3,84	مشروع منجز	10	40	50	100
	24.3	سوق القرب	مدخل سلا الجديدة	2	4	6	6	-	عقار معبأ	20	0	0	20
	25.3	سوق القرب (extension)	سلا الجديدة	2	4	6	6	-	الدراسة انجزت	-	40	0	40
	26.3	سوق القرب (بشراكة مع الخواص)	حي البركة , قطاع 4 , قرية اولاد موسى - احصاين-	2	6	8	8	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	27.3	سوق القرب	حي المزرعة تابريكت	1	6	7	7	-	اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص	10	0	0	10


البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الانجاز	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز
	28.3	سوق القرب	تابريكت الوسطى	1,5	10	11,5	11,5	-	بداية الاشغال في اطار اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص	30	-	10	40
	29.3	سوق القرب	سوق السهلي	2	4	6	6	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تنظيم الأنشطة المزعجة والملوثة	30.3	تنظيم الأنشطة المزعجة و الملوثة	الروستالتابريكت	-	10	10	10	10	في طور الترافع	5	0	0	5
تنظيم الأنشطة المزعجة و الملوثة	31.3	تنظيم الأنشطة المزعجة و الملوثة	سيدي الضاوي تابريكت	-	15	15	15	15	في طور الترافع	5	0	0	5
	32.3	تنظيم الأنشطة المزعجة و الملوثة	لعيادة (المحيط)	-	15	15	15	-	في طور الترافع	5	0	0	5
البرنامج الجماعي لدعم التشغيل	33.3	المبادرة الجماعية لدعم التشغيل الذاتي	الجماعة	-	5	5	5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	34.3	المبادرة الجماعية لدعم التشغيل لدى الجمعيات	الجماعة	-	5	5	5	-	اتفاقية ستعرض على المجلس في دورته المقبلة	5	0	0	5
تعزيز المؤهلات السياحية للمدينة	35.3	تعزيز البنية الفندقية	قرب محطة القطار	-	50	50	50	50	في طور الترافع	5	0	0	5

المحور الرابع: التنمية الثقافية والرياضية ودعم التماسك الاجتماعي

حول الرابع المتعلق بالتنمية الثقافية والرياضية ودعم التماسك الاجتماعي يضم 152 مشروعاً موزعة على ثمانية برامج بتكلفة تصل إلى 1037 مليون درهم.

البرامج	عدد المشاريع	كلفة تعبئة العقار	كلفة انجاز الأشغال	كلفة المشاريع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2020 - 2018	الكلفة للفترة 2023 - 2021
تعزيز البنية الثقافية والفنية	23	44.52	197.90	242.42	136.77	105.65
تعزيز البنية الرياضية	26	72.20	168.26	240.46	86.27	154.19
المراكز متعددة التخصصات	16	32.70	131.70	164.40	75.50	88.90
تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط الاجتماعي	16	8.32	67.00	75.32	28.50	46.82
تعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية	10	9.00	45.50	54.50	36.70	17.80
تحسين ظروف السكن	1	-	125.00	125.00	125.00	-
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	39	-	78.08	78.08	72.82	5.26
تعزيز وتأهيل البنية الصحية	21	2.00	54.96	56.96	40.60	16.36
المجموع	152	168.74	868.40	1037.14	602.16	434.98

وضعية المشروع	2021	2022	نسبة الإنجاز برسم سنة 2022
مشاريع منجزة	14	18	25%
في طور الإنجاز	15	14	
في طور الدراسة	5	6	
في طور الترافع	117	113	
الملغاة	1	1	
المجموع	152	152	

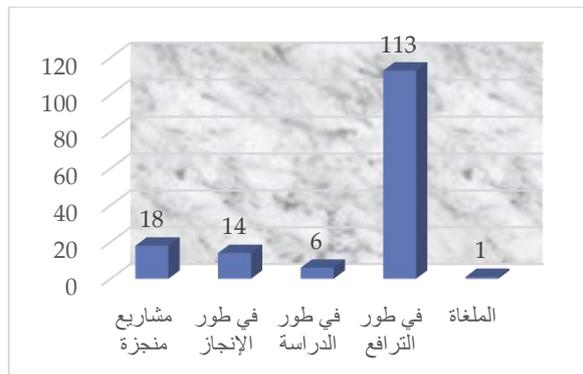

بالنسبة للمحور الرابع انتقل عدد المشاريع المنجزة من 14 إلى 18 مشروع، في حين وصل عدد المشاريع التي هي في طور الإنجاز إلى 14 مشروعاً، وانطلقت الدراسات في 6 مشاريع.

جدول تفصيلي لتقدم المشاريع بهذا المحور:

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
المراكز متعددة التخصصات	1.4	مجمع سوسيو تربوي ورياضي + ساحة عمومية وفضاء لالعباب الاطفال	شارع محمد الخامس قرية اولاد موسى احصاين	6	30	36	-	36	في طور الترافع	5	0	0	5
	2.4	مجمع سوسيو تربوي ورياضي + ساحة عمومية وفضاء لالعباب الاطفال	دوار حلالة العيايدة	4	24	28	28	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	3.4	مركب سوسيو رياضي (صنف C)	حي المحيط العيايدة	1,5	5	6,5	6,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	4.4	مركب سوسيو رياضي (صنف B)	سيدي موسى بوشنيخة باب المريسة	4,8	3,2	8	-	8	مشروع منجز	-	30	70	100
	5.4	مركب سوسيو رياضي (صنف B)	سعيد حجي، باب المريسة	2,8	12	14,8	-	14,8	في طور الترافع	5	0	0	5
	6.4	مركب سوسيو رياضي	باب سبتة، طريق المهديّة، باب المريسة	1,5	4	5,5	5,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	7.4	مركز سوسيو ثقافي	قطاع سيدي عبد الله العيايدة	0,63	4	4,63	-	4,63	في طور الترافع	5	0	0	5
	8.4	مركز سوسيو ثقافي	حي مولاي اسماعيل بطانة	1	4	5	5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	9.4	مركز سوسيو ثقافي	زاوية شارع بنكرير وشارع الوطاسيين ، بطانة	1,8	6,5	8,3	-	8,3	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية على تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %	
	10.4	مركز سوسيوثقافي	حي الكفاح , قطاع 6 , قرية اولاد موسى احصين	1,5	6	7,5	7,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
المراكز متعددة التخصصات	11.4	مركز سوسيوثقافي	سلا الجديدة احصين	1	6,5	7,5	7,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	12.4	مركز سوسيوثقافي	دار الحي، سيدي موسى، باب المريسة	0,35	4	4,35	4,35	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	13.4	مركز سوسيوثقافي (صنف B)	حي اشماعو باب المريسة	1,32	7,5	8,82	8,82	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	14.4	مركز سوسيوثقافي (صنف B)	سعيد حجي باب المريسة	0,5	6	6,5	6,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	15.4	مركب سوسيوثقافي	site 1 العيادة		4	4	4	4	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	16.4	مركب متعدد الإختصاصات	بجانب مسجد البر، حي الإنبعث، تابريكت	4	5	9	9	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	17.4	مكتبة صنف C))	قطاع النهضة شارع الصنوبر العيادة	0,44	5,5	5,94	5,94	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
تعزيز النبيلة الثقافية والفنية	18.4	مكتبة صنف B))	قرب سيدي عبد الله العيادة	1,08	8	9,08	9,08	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	19.4	مكتبة صنف B))	سيدي عبد الله الشطر 3 العيادة	0,5	3,5	4	4	-	في طور الترافع	5	0	0	5	

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	20.4	مكتبة صنف ((C	حي السلام اضافي القاعدة الجوية بطانة	0,5	3	3,5	3,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	21.4	متحف مدينة الفنون	ضفة ابي رقرق	-	20	20	20	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	22.4	مكتبة صنف (B)	سلا الجديدة احصين	1	4,5	5,5	5,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	23.4	بناء وتجهيز خزانات بباب شعفة	خارج باب شعفة، باب المريسة	0,5	3	3,5	3,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	24.4	مكتبة صنف (D)	مجموعة مدارس لمزبيري باب المريسة	0,15	1,3	1,45	1,45	1,45	في طور الترافع	5	0	0	5
	25.4	مكتبة صنف (D)	أمام مسجد الإمام مالك	0,08	0,8	0,88	0,88	0,88	في طور الترافع	5	0	0	5
	26.4	مكتبة صنف (C)	ابن تاشفينتابريكت	0,48	4,5	4,98	4,98	4,98	في طور الترافع	5	0	0	5
	27.4	مكتبة صنف (C)	تابريكت الوسطى	2,1	16	18,1	18,1	18,1	في طور الترافع	5	0	0	5
	28.4	مكتبة رقمية	حي مولاي اسماعيل بطانة	0,5	3	3,5	3,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	29.4	مركز ثقافي	قطاع النهضة الحوات طريق القاعدة الجوية العيايدة	1,2	16,8	18	18	18	في طور الترافع	5	0	0	5
	30.4	مكتبة صنف (B)	سيدي عبد الله الشطر 3 العيايدة	0,5	4	4,5	4,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	31.4	مركز ثقافي صنف (B)	حي السلام بطانة	1,2	7	8,2	8,2	8,2	في طور الترافع	5	0	0	5
	32.4	مركز ثقافي صنف (B)	سيدي عبد الله العيايدة	0,7	10	10,7	10,7	10,7	في طور الترافع	5	0	0	5
	33.4	مركب التنشيط الثقافي والفني دار البارود بسلا	تابريكت	4,21	16	20,21	20,21	-	مشروع منجز	10	40	50	100

تعزيز البنية الثقافية والفنية

تعزيز البنية الثقافية والفنية

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية على تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	34.4	بناء وتجهيز خزانة	تجزئة الياسمين تابريكت	-	3,5	3,5	3,5	-	في طور التسوية الرسم العقاري 20/44243 بمساحة 258 متر مربع	20	0	0	20
	35.4	مكتبة صنف (B)	شارع الأمير سيدي محمد، قرية اولاد موسى، احصاين	-	3,5	3,5	3,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	36.4	مسرح	بطانة	6,06	50	56,06	56,06	-	-	10	40	10	60
	37.4	إحداث معهد موسيقي	سلا الجديدة قرب محطة البنزين احصاين	3	6	9	9	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	38.4	قاعة العروض والحفلات	سيدي عبد الله الشطر 2 العيادة	0,32	3	3,32	3,32	3,32	في طور الترافع	5	0	0	5
	39.4	مدرسة لتعليم الفروسية التقليدية+متحف	سيدي اميدة، احصاين	20	5	25	25	25	في طور الترافع	5	0	0	5
تعزيز البنية الرياضية	40.4	قطب رياضي متعدد الاختصاصات	قطاع القدس العيادة	3	12	15	15	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تعزيز البنية الرياضية	41.4	ملعب رياضي (4 وحدات)	حي العسكري العيادة	-	4	4	4	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تعزيز البنية الرياضية	42.4	ملعب رياضي (2 وحدات)	حي السلام بطانة	1,5	2	3,5	3,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	43.4	ملعب رياضي (3 وحدات)	حي الصفاء، قطاع 3، امام اعدادية الإمام مالك، احصاين	3,6	2,4	6	-	6	في طور الترافع	5	0	0	5
	44.4	ملعب رياضي (3 وحدات)	شارع الزربية تجزئة المعمورة احصاين	3,6	2,4	6	-	6	انجاز ملعب واحد	-	10	40	50
	45.4	ملعب رياضي (4 وحدات)	جزء من اعدادية عقبة سيدي موسى باب المريسة	2,8	3	5,8	5,8	-	مشروع منجز	10	40	50	100
	46.4	ملعب رياضي + ساحة عمومية	الطريق الساحلي، سيدي موسى باب المريسة	2,88	2	4,88	-	4,88	في طور الترافع	5	0	0	5
	47.4	ملعب رياضي (2 وحدات)	الكورنيش امام اليقظة، باب المريسة	2,64	1,6	4,24	-	4,24	في طور الترافع	5	0	0	5
	48.4	ملعب رياضي (2 وحدات + ساحة عمومية)	معمل كوكاكولا سابقا، حي اشماعو، باب المريسة	1,5	2,5	4	4	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	49.4	قاعة مغطاة	العيادة	4,8	10	14,8	-	14,8	في طور الترافع	5	0	0	5
	50.4	مسبح مغطى	العيادة	3,6	6	9,6	-	9,6	في طور الترافع	5	0	0	5
	51.4	ملاعب رياضية مختلفة	العيادة	4,8	4	8,8	-	8,8	في طور الترافع	5	0	0	5
تعزيز البنية الرياضية	52.4	ملعب رياضي (2 وحدات)	قطاع "E" قرب المسبح البلدي تابريكت	1,5	2	3,5	3,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	53.4	ملعب رياضي	داخل مدرسة الوحدة تابريكت	1,2	2	3,2	-	3,2	مشروع منجز	-	-	-	100

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018 2021	الكلفة للفترة -2022 2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	54.4	ملعب رياضي (2 وحدات)	شارع واد الرمان و شارع ابن الهيثم حي الانبعاث تابريركت	2,4	1,6	4	-	4	في طور الترافع	5	0	0	5
	55.4	قاعة مغطاة	سيدي عبد الله الشطر 2 العيادة	0,75	8	8,75	-	8,75	مشروع منجز	10	30	50	100
	56.4	قاعة مغطاة	قطاع النهضة طريق القاعدة الجوية العيادة	3,6	12	15,6	-	15,6	في طور الترافع	5	0	0	5
	57.4	قاعة مغطاة (فنون الحرب)	تجزئة اليسري و الزرقاء، باب المريسة	1,54	10	11,54	11,54	-	مشروع منجز	10	40	50	100
	58.4	قاعة لفنون الحرب + دار الشباب	قطاع "C" شارع علي ابن أبي طالب تابريركت	0,36	3	3,36	-	3,36	في طور الترافع	5	0	0	5
	59.4	مسبح مغطى	حي المحيط الجزيرة العيادة	2	10	12	12	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	60.4	ملعب رياضي و مسبح مغطى	حي السلام الاضافي القاعدة الجوية	2	10	12	12	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	61.4	مسبح مغطى	ضريح سيدي موسى باب المريسة	1,64	8,38	10,02	-	10,02	في طور الترافع	5	0	0	5
	62.4	قاعة مغطاة	تابيريركت الوسطى	1,05	9,88	10,93	10,93	-	مشروع منجز	10	40	50	100
تعزيز البنية الرياضية	63.4	مسبح في الهواء الطلق	الكورنيش مدرسة المزييري باب المريسة	1,44	3,5	4,94	-	4,94	في طور الترافع	5	0	0	5
	64.4	بناء مركب للالعاب المائية	الكورنيش باب المريسة	18	32	50	-	50	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	65.4	تأهيل و تجهيز القاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي	بطانة	-	4	4	4	-	مشروع منجز	10	40	50	100
تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط الاجتماعي	66.4	دار الشباب	شارع النصر , قطاع النهضة - العيايدة -	0,6	5	5,6	-	5,6	في طور الترافع	5	0	0	5
	67.4	دار الشباب	كاربان الواد - العيايدة -	0,5	3	3,5	3,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	68.4	دار الشباب	سيدي عبد الله الشطر 4 العيايدة	0,44	4,5	4,94	-	4,94	في طور الترافع	5	0	0	5
	69.4	دار الشباب	بطانة	0,77	4	4,77	-	4,77	في طور الترافع	5	0	0	5
	70.4	دار الشباب	حي السلام ، بطانة	-	8	8	-	8	في طور الترافع	5	0	0	5
	71.4	دار الشباب	حي السلام بطانة	0,7	4,5	5,2	-	5,2	في طور الترافع	5	0	0	5
تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط الاجتماعي	72.4	دار الشباب و نادي نسوي	سعيد حجي لمريسة	1	3	4	4	-	مشروع متوقف	-	40	-	40
	73.4	مركز رعاية المكفوفين	قطاع "د" حي الرحمة - تابريكت -	-	4,5	4,5	4,5	-	مشروع منجز	10	40	50	100
	74.4	مركز تنمية الشباب	قطاع القدس قطعة رقم 58 - العيايدة -	0,45	5	5,45	-	5,45	في طور الترافع	5	0	0	5
	75.4	نادي نسوي وحضانة	سيدي عبد الله الشطر 3 العيايدة	0,5	4,5	5	5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	76.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	بطانة	0,77	4	4,77	-	4,77	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية على تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط الاجتماعي	77.4	نادي نسوي وحضانة	زاوية شارع بنكريير وشارع الوطاسيين بطانة	0,96	5	5,96	-	5,96	في طور الترافع	5	0	0	5
	78.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	شارع الشرفاء تجزئة ياسمينية تابريكت	1	3	4	4	-	تعبئة العقار	20	0	0	20
	79.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	قرب مسجد محمد السادس الفروكي الصغير تابريكت	-	3	3	3	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	80.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	قطاع "دال" حي الرحمة الجزء المتبقي من (A11PA2017)	0,5	4	4,5	4,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	81.4	مركز اجتماعي للمرأة و الطفل	تجزئة ابن عمر- باب المريسة	0,13	2	2,13	2,13	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	82.4	مركز إستقبال المسنين	حي مولاي اسماعيل بطانة	2	5	7	7	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	83.4	دار الايتام	بطانة	4,8	8	12,8	12,8	-	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	84.4	مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة	شارع محمد الخامس , تجزئة العوفير، قرية اولاد موسى احصين	0,5	2,5	3	3	-	الدراسة في المرحلة النهائية	-	30	0	30
	85.4	مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة	شارع المرابطين، قرب مسجد الحيحي، تابريكت	1	5	6	6	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	86.4	مركز رعاية المعاقين	قرب قاعة لغرابلية باب المريسة	0,7	5	5,7	5,7	-	-	-	40	45	95
	87.4	مركز متعدد الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة	باب المريسة	-	5	5	5	5	في طور الترافع	5	0	0	5
	88.4	مركز رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	العيادة	-	5	5	5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	89.4	مركز إيواء الأشخاص المسنين لبورمادة	بورمادة باب المريسة	-	7	7	7	-	مشروع منجز	10	40	50	100
	90.4	مركز المساعدة الاجتماعية CAS	الطريق الساحلي، سيدي موسى قرب الجوطية، باب المريسة	-	1,5	1,5	1,5	-	مشروع منجز	10	40	50	100
تعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية	91.4	مركز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة COAPH	لطريق الساحلي، سيدي موسى قرب الجوطية، باب المريسة	-	1,5	1,5	1,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
تحسين ظروف السكن	92.4	إعادة إيواء و إسكان أسرة 3114	الجماعة	-	125	125	125	-	مشروع منجز	-	-	-	100
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	93.4	مشروع بناء ثانوية العيايدة	العيايدة E15	-	8	8	8	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	94.4	مشروع بناء ثانوية احصين	احصين	-	8	8	8	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	95.4	مشروع بناء مدرسة ابتدائية بلعيايدة		-	7	7	7	-	أنجزت الدراسات الطبوغرافية وراستت المديرية الاقليمية لسلا الوزارة لرصد اعتمادات اقتناء الوعاء العقاري	-	10	0	10
	96.4	توسيع مدرسة البحري	العيايدة	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الدراسات في طور المصادقة	-	10	0	10
	97.4	توسيع مدرسة خديجة أم المومنين	العيايدة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	98.4	توسيع مدرسة اشبيلية	العيايدة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	99.4	توسيع إعدادية عبدالعزيز أمين	العيايدة	-	0,46	0,46	0,46	-	مشروع منجز	-	100	60	40
	100.4	توسيع الثانوية التأهيلية أحمد شوقي	العيايدة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	101.4	توسيع الثانوية التأهيلية ابن هاني	العيايدة	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الدراسات في طور المصادقة	-	10	0	10
	102.4	توسيع الثانوية التأهيلية أم الربيع	العيايدة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %	
	103.4	توسيع إعدادية عبدالملك السعدي	تابريكت	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	104.4	توسيع الثانوية التأهيلية جمال الذرة	باب المريسة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	105.4	توسيع الثانوية التأهيلية عبد الرحيم بوعبيد	باب المريسة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	106.4	توسيع إعدادية الحزام الأخضر	احصين	-	1,38	1,38	1,38	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	107.4	توسيع الثانوية التأهيلية المنظر الجميل	احصين	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الأشغال في طور الإعداد سيتم الإعلان عن طلب العروض في شهر أبريل	-	40	0	40	
	108.4	توسيع الثانوية التأهيلية محمد السادس	احصين	-	0,46	0,46	0,46	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	109.4	توسيع مدرسة احصين	احصين	-	1,22	1,22	1,22	-	في طور الترافع	5	0	0	5	
	110.4	تعويض المفكك بإعدادية العلامة محمد بن علي الدكالي	العيادة	-	2,83	2,83	2,83	-	مشروع منجز	2,83	-	40	60	100
	111.4	تعويض المفكك بمدرسة الوديع الاسفي	العيادة	-	1,62	1,62	1,62	-	صفقة الأشغال في طور المصادقة	1,62	-	40	0	40
	112.4	تعويض المفكك بمدرسة أبي بكر الصديق	العيادة	-	0,82	0,82	0,82	-	صفقة الأشغال في طور المصادقة	0,82	-	40	0	40

تعزيز وتأهيل البنية التعليمية

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية على تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	113.4	احداث مدرسة ابتدائية سعيد حجي	لمريسة	-	7	7	7	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	114.4	مشروع بناء ثانوية العيادية	العيادية E15	-	8	8	8	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	115.4	مشروع بناء ثانوية احصين	احصين	-	8	8	8	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	116.4	توسيع مدرسة البحري	العيادية	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الدراسات في طور المصادقة	-	10	0	10
	117.4	توسيع مدرسة خديجة أم المومنين	العيادية	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	118.4	توسيع مدرسة اشبيلية	العيادية	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	119.4	توسيع إعدادية عبدالعزيز أمين	العيادية	-	0,46	0,46	0,46	-	مشروع منجز	-	100	60	40
	120.4	توسيع إعدادية محمد بن علي الدكالي	العيادية	-	0,46	0,46	0,46	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	121.4	توسيع الثانوية التأهيلية أحمد شوقي	العيادية	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تعزيز وتأهيل البنية التعليمية	122.4	توسيع الثانوية التأهيلية ابن هاني	العيادية	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الدراسات في طور المصادقة	-	10	0	10
	123.4	توسيع الثانوية التأهيلية أم الربيع	العيادية	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	124.4	توسيع إعدادية عبدالملك السعدي	تابريكت	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	125.4	توسيع الثانوية التأهيلية جمال الذرة	باب المريسة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية على تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	126.4	توسيع الثانوية التأهيلية عبد الرحيم بوعبيد	باب المريسة	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	127.4	توسيع إعدادية الحزام الأخضر	احصين	-	1,38	1,38	1,38	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	128.4	توسيع إعدادية الامام مالك	احصين	-	0,92	0,92	0,92	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	129.4	توسيع الثانوية التأهيلية المنظر الجميل	احصين	-	0,92	0,92	0,92	-	صفقة الأشغال في طور الإعداد سيتم الإعلان عن طلب العروض في شهر أبريل	-	40	0	40
	130.4	توسيع الثانوية التأهيلية محمد السادس	احصين	-	0,46	0,46	0,46	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	131.4	توسيع مدرسة احصين	احصين	-	1,22	1,22	1,22	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تعزيز و تأهيل البنية التعليمية	132.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري لتشخيص داء السل (مستوى 1)	ساحة باب الخميس باب المريسة	-	3,76	3,76	3,76	-	مشروع منجز	-	40	60	100
	133.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري حي الرحمة (مستوى 2)	حي الرحمة تابريكت	-	2,2	2,2	2,2	-	مشروع منجز	-	40	60	100

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	134.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري ابن سينا (مستوى 1)	شارع محمد حصار سلا الجديدة احصين	-	1,3	1,3	1,3	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	135.4	إعادة بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري سيدي احميدة (مستوى 1)	سيدي احميدة S28 احصين	-	2,4	2,4	-	2,4	في طور الترافع	5	0	0	5
	136.4	إعادة بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري احصين (مستوى 1)	شارع الزربية S26 احصين	-	3	3	3	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	137.4	بناء وتجهيز مركز صحي حي الرحمة (مستوى 2)	حي الرحمة تابريكت	-	3	3	3	-	في طور الانجاز	-	40	30	70
	138.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري ابن الهيثم (مستوى 2)	العيادة	-	1,6	1,6	1,6	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	139.4	بناء وتجهيز مركز صحي أبواب سلا	العيادة	-	3,2	3,2	3,2	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	140.4	بناء وتجهيز مركز صحي حي الانبعاث (مستوى 1)	حي الانبعاث تابريكت	-	3,4	3,4	3,4	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تعزيز و تأهيل البنية الصحية	141.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري حي مولاي اسماعيل (مستوى 1)	حي مولاي اسماعيل بطانة	-	2	2	2	-	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية وتسوية العقار	القيام بالداستات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	142.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري عبد الرحيم بوعبيد (مستوى 1)	شارع عبد الرحيم بوعبيد بطانة	-	1,6	1,6	1,6	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	143.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري حي الكفاح (مستوى 2)	حي الكفاح قرية اولاد موسى S25 احصين	-	1,6	1,6	1,6	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	144.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري العيادة	أرض بنعاشر العيادة	-	1,6	1,6	1,6	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	145.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري سيدي عبد الله	سيدي عبد الله العيادة	-	1	1	1	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	146.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري قرية اولاد موسى (مستوى 2)	قرية اولاد موسى احصين	-	2,5	2,5	2,5	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	147.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري سعيد حجي (مستوى 1)	تجزئة سعيد حجي باب المريسة	-	1,1	1,1	1,1	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	148.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري بسلا الجديدة (مستوى 1)	شارع محمد حصار سلا الجديدة احصين	-	3	3	3	-	في طور الترافع	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة -2018-2021	الكلفة للفترة -2022-2023	تقدم الأشغال	التصديق على الاتفاقية على التسوية العقار	القيام بالداستات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
تعزيز و تأهيل البنية الصحية	149.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري باب الخميس (مستوى 1) وتحويله الى مركز الترويض الطبي وتقويم العظام وتصحيح النطق ومعدات العظام	شارع 2 مارس باب الخميس باب المريسة	-	8	8	-	8	مشروع منجز	-	40	60	100
	150.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري السواني (مستوى 1)	زقة 2 تجزئة الرباطية سيدي موسى S4 باب المريسة	-	1,3	1,3	1,3	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	151.4	تهيئة وتجهيز المركز الصحي الحضري بطانة (مستوى 1)	شارع مديونة S17 بطانة	-	1,4	1,4	1,4	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	152.4	مركز صحي متخصص	سلا	2	6	8	8	-	في طور الترافع	5	0	0	5

مركز إيواء الأشخاص المسنين لبورمادة

- مشروع منجز -



المحور الخامس: المشاريع المهيكلة

خصص المحور الخامس للمشاريع المهيكلة ويضم 11 مشروعا مقسمة على ثلاثة برامج بقيمة مالية تصل إلى 5062 مليون درهم.

البرامج	عدد المشاريع	كلفة تعبئة العقار	كلفة انجاز الأشغال	كلفة المشاريع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2018-2020	الكلفة للفترة 2021-2023
إنجاز مراكز حضرية جديدة	6	804.24	3108.50	3912.74	668.64	3244.10
إنجاز مرافق كبرى	3	70.00	630.00	700.00	370.00	330.00
تطوير التنقل	2	-	450.00	450.00	450.00	-
المجموع	11	874.24	4188.50	5062.74	1488.64	3574.10

تكتسي- المشاريع المهيكلة أهمية كبرى في تحقيق الأهداف التنموية المسطرة من طرف المجلس الجماعي في برنامج العمل، وقد تمكنت مدينة سلا من الاستفادة من مشروع مهيكلي كبير حضي- بالتفاته مولوية كريمة من خلال إشرافه الشخصي على إعطاء انطلاقة الأشغال به، مشروع تهيئة سوق الصالحين بمقاطعة تابريكت الذي يروم النهوض بظروف اشتغال التجار، والعمل على استقرار الباعة المتجولين، والقضاء على البنايات العشوائية، وتحرير الطرق والفضاءات العمومية، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري، والذي بلغت الأشغال فيه خلال هذه السنة مراحلها النهائية.


كما توخى هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 23 هكتار، النهوض بالاقتصاد التضامني، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع، وتطوير بنية المدينة الاقتصادية والتجارية.

وقد همت أشغال التهيئة بناء مركب تجاري (968 محلا تجاريا)، وإنجاز سوق مركزي (391 محلا تجاريا)، وتهيئة وتسويق تجزئة سكنية، وإنجاز ملاعب للقرب (4 ملاعب لكرة القدم المصغرة، وملعبان لكرة السلة، ومضمار للتزلج)، وأكشاك لبيع الزهور والعصافير، وتهيئة فضاءات خضراء، وأماكن مخصصة لركن السيارات.

وقد عهد بإنجاز هذا المشروع لشركة "الرباط الجهة للتهيئة"، في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعمالة سلا عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجماعة سلا.

بخصوص هذا المحور لم تتغير نسب إنجاز المشاريع به نظرا لارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع المهيكلة، وضعف تعبئة الموارد المالية بجماعة سلا.

نسبة الإنجاز برسم سنة 2022	2022	2021	وضعية المشروع
9,09%	1	1	مشاريع منجزة
	0	0	في طور الإنجاز
	0	0	في طور الدراسة
	10	10	في طور الترافع
	0	0	الملغاة
	11	11	المجموع

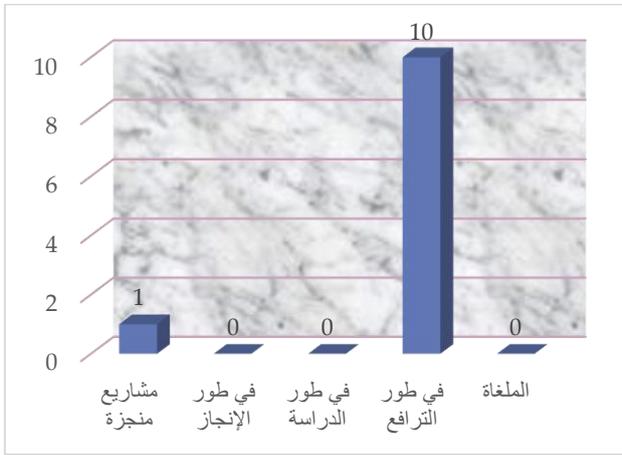

بالنسبة للمحور الخامس بين سنتي 2021 و2022 بقي عدد المشاريع المنجزة والمشاريع في طور الإنجاز والمشاريع في طور الدراسة ثابتا

فيما يلي جدول تفصيلي لتقدم كل مشروع في هذا المحور:

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية على تسوية العقار	القيام بالاداسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
إنجاز مراكز حضرية جديدة	1.5	مشروع حضري متكامل " سوق الصالحين"	سوق الصالحين - تابريكت	113,64	305	418,64	418,64	-	مشروع منجز	30	30	40	100
	2.5	مشروع حضري متكامل "حي السلام"	حي السلام - بطانة	49,1	950	999,1	-	999,1	في طور الترافع	5	0	0	5
	3.5	مشروع حضري متكامل "بوبكر اعمار"	طريق مكناس - بطانة	240	430	670	-	670	في طور الترافع	5	0	0	5
	4.5	مشروع حضري متكامل "طريق القنيطرة"	طريق القنيطرة - باب المريسة	300	912	212,00 1	-	1212	في طور الترافع	5	0	0	5
	5.5	مشروع حضري متكامل "حي الرحمة"	حي الرحمة - تابريكت	51,5	55	106,5	-	106,5	في طور الترافع	5	0	0	5
	6.5	مشروع حضري متكامل "باب سبتة"	باب المريسة	50	456,5	506,5	250	256,5	في طور الترافع	5	0	0	5
	7.5	المركب الرياضي	سيدي احמידة سلا الجديدة - احصاين	20	250	270	270	-	في طور الترافع	5	0	0	5
إنجاز مرافق كبرى	8.5	المدينة الدولية للرياضات	سيدي احמידة سلا الجديدة - احصاين	50	280	330	-	330	في طور الترافع	5	0	0	5


نسبة الانجاز %	إنجاز الأشغال	القيام بالداسات التقنية	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	تقدم المشروع	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون الدرهم)	الأشغال (مليون الدرهم)	العقار (مليون الدرهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رمز المشروع	البرنامج
5	0	0	5	في طور الترافع	-	100.00	100.00	100.00	-	السلسلة الثالثة ضفة ابي رقرق	تهيئة موقع مدينة الطفل	9.5	
5	0	0	5	في طور الترافع	-	200.00	200.00	200.00	-	بين باب بوحاجة بسلا وباب البحر بالرباط	الربط بين المدينتين العتيقتين الرباط وسلا (الجسر خاص براجلين، تهيئة شارع الجيش الملكي , إعادة تأهيل ساحة باب بوحاجة)	10.5	تطوير التنقل
5	0	0	5	في طور الترافع	-	250.00	250.00	250.00	-	باب فاس , طريق القنيطرة	مشروع حضري "باب فاس"	11.5	

المحور السادس: التدبير الجماعي

المحور السادس المتعلق بالتدبير الجماعي يضم 35 مشروعاً لتطوير وتحديث التدبير الجماعي وتأهيل المرافق الجماعية والبنى التحتية الإدارية، وتعزيز التشاور والتواصل والتعاون. تقدر تكلفته بـ 340 مليون درهم.

البرامج	عدد المشاريع	كلفة تعبئة العقار	كلفة انجاز الأشغال	كلفة المشاريع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2020 -2018	الكلفة للفترة 2023 -2021
تطوير وتحديث التدبير الجماعي	10	-	71.10	71.10	35.70	35.40
تأهيل المرافق الجماعية	9	56.57	57.40	113.97	113.97	0.00
تأهيل المباني الإدارية	13	20.84	127.70	148.54	98.71	49.83
تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة	3	-	7.00	7.00	4.00	3.00
المجموع	35	77.41	263.20	340.61	252.38	88.23

المشروع وضعية	2021	2022	2022 سنة برسم الإنجاز نسبة
منجزة مشاريع	12	12	77,14
الإنجاز طور في	5	8	
الدراسة طور في	6	7	
الترافع طور في	11	8	
الملغاة	1	0	
المجموع	35	35	

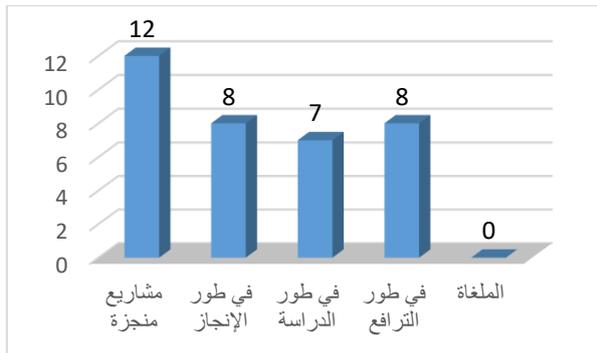

بخصوص هذا المحور انتقل عدد المشاريع التي انطلقت بها الأشغال بين سنتي 2021 و2022 من 5 مشاريع إلى 8 مشاريع، في حين 7 مشاريع مازالت الدراسة مستمرة بها.

فيما يلي جدول تفصيلي لتقدم كل مشروع من المشاريع المتعلقة بهذا المحور:

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنيّة	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
تأهيل المباني الإدارية	1.6	مقر المقاطعة	طريق القاعدة الجوية العيايدة	1,05	10	11,05	11,05	-	مشروع منجز	-	40	60	100
	2.6	مقر المقاطعة	نهاية الترامواي حي السلام بطانة	0,7	10	10,7	10,7	-	تم تعبئة العقار	10	0	0	10
	3.6	مقر المقاطعة	تابريكت الوسطى تابريكت	4	10	14	14	-	في طور الإنجاز	30	0	0	30
	4.6	مقر المقاطعة	مرزوقة - الشرف باب المريسة	0,2	0,2	0,4	0,4	-	مشروع منجز	-	-	-	100
	5.6	ملحقة المقاطعة	سوق حي المزرعة تابريكت	-	0,5	0,5	0,5	-	مشروع منجز	-	-	-	100
	6.6	ملحقة المقاطعة	قرب إقامة النسيم . قطاع "E" تابريكت	0,21	2,5	2,71	2,71	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	7.6	ملحقة المقاطعة	حي الموحدين تابريكت	0,36	3	3,36	3,36	-	في طور الترافع	5	0	0	5
	8.6	المكتب البلدي للصحة	حي كريمة أمام المستودع البلدي تابريكت	4,48	10	14,48	14,48	-	اختيار المهندس المعماري عن طريق المباراة + التصاميم المعمارية جاهزة + العفدة في طور التأشير	-	30	0	30

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	9.6	مقر الجماعة	باب بوحاجة باب لمريسة	6,26	60	66,26	66,26	-	في طور تسوية العقار مع الفلاحة	10	0	0	10
	10.6	مقاطعة الشرطة وملحقة المقاطعة	قطاع 6، حي الكفاح ، قرية اولاد موسى احصاين	0,99	6,3	7,29	-	7,29	في طور الترافع	5	0	0	5
	11.6	مركز الشرطة حي الرحمة سكتور واو	قطاع "E" ،السنابيلتأبريكت	-	4	4	4	-	في طور الترافع	5	0	0	5
تأهيل المباني الإدارية	12.6	تأهيل وتوسيع المستودع الجماعي	تأبريكت	2,58	10	12,58	12,58	-	انجزت الدراسة + تم إطلاق صفقة الاشغال في طور التأشير	-	40	0	40
	13.6	بناء مستودع العيادية	توسيع المستودع	-	1,2	1,2	1,2	-	مشروع منجز	-	40	60	100
تأهيل المرافق الجماعية	14.6	تهيئة مقبرة لدفن أموات المسلمين	السهول ؟ سيدي حميدة	30	10	40	40	-	تمت الموافقة على اتفاقية بين الجماعة وجماعة السهول لإحداث مقبرة مشتركة + في طور اقتناء العقار	10	0	0	10
	15.6	تهيئة مقبرة لدفن أموات المسلمين	عامر	20	10	30	30	-	في طور الترافع مع جماعة عامر لاقتناء العقار	5	0	0	5

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	16.6	تهيئة مقبرة لدفن أموات المسلمين "عنق الجمل"	ضفة أبي رقرق	-	5	5	5	-	مرحلة تغيير التطبيق للمنطقة المجاورة للمقبرة القائمة تابعة للنفوذ الترابي لوكالة تهيئة ضفتي ابي رقرق + تم وضع جزء من العقار رهن اشارة الجماعة	10	0	10	
	17.6	تأهيل المجازر	سيدي موسى لمريسة	-	1,5	1,5	1,5	-	مشروع منجز	-	40	60	100
	18.6	تأهيل سوق الجملة	طريق القنيطرة لمريسة	-	1,5	1,5	1,5	-	في طور البرمجة المالية	10	0	0	10
	19.6	بناء رحبة الحبوب	طريق القنيطرة لمريسة	6,57	5,6	12,17	12,17	-	مشروع منجز	20	40	40	100
	20.6	تأهيل المحجز البلدي	لعيادة	-	1,2	1,2	1,2	-	مشروع منجز	-	40	60	100
	21.6	تأهيل و إعادة هيكلة الأسواق الجماعية	الجماعة	-	20	20	20	-	في طور البرمجة المالية	10	0	0	10
	22.6	مستودع الحيوانات الضالة	غابة سلا الجديدة	-	2,6	2,6	2,6	-	تم ابرام الاتفاقية مع الجمعية وفي طور تسوية العقار مع المياه والغابات	10	0	0	10
	23.6	شراء السيارات والآليات	جميع مقاطعات جماعة سلا	-	7	7	7	4	المرحلة الثانية من البرنامج	-	-	-	5
	24.6	شراء السيارات والآليات	الجماعة	-	15	15	15	5	في طور الإنجاز	-	-	-	75


نسبة الانجاز %	إنجاز الأشغال	القيام بالدراسات التقنيّة	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	تقدم المشروع	الكلفة للفترة 2023-2022	الكلفة للفترة 2021-2018	المجموع (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	العقار (مليون درهم)	موقع المشروع	اسم المشروع	رمز المشروع	البرنامج
5	-	-	-	المرحلة الثانية من البرنامج	3,6	2,4	6	6	-	الجماعة	شراء عتاد للتزيين	25.6	
5	-	-	-	المرحلة الثانية من البرنامج	4,8	4,8	9,6	9,6	-	الجماعة	شراء أثاث المكاتب	26.6	
10	0	10	-	مخطط السير بالمدينة العتيقة في طور الدراسة	-	2	2	2	-	الجماعة	مخطط السير و الجولان بمدينة سلا	27.6	
40	20	20	-	تم إطلاق الشطر الأول المتعلق بإنجاز اربعة تطبيقات بكلفة 900 ألف درهم	5	5	10	10	-	الجماعة	التطبيقات المعلوماتية	28.6	
100	20	20	-	مشروع منجز	2	4	6	6	-	الجماعة	اقتناء و تثبيت العتاد والشبكات المعلوماتية	29.6	
30	-	-	-	المرحلة الثانية من البرنامج	5	5	10	10	-	الجماعة	تثبيت نظام المعلومات الجغرافي لجماعة سلا	30.6	
-	-	-	-	المرحلة الثانية من البرنامج	3	5	5	-	الجماعة	التدبير الإلكتروني للوثائق GED	تطوير وتحديث التدبير الجماعي	31.6	
100	60	40	-	مشروع منجز	0,5	0,5	0,5	-	الجماعة	تأهيل المكتب الصحي وإحداث الشباك الوحيد	تطوير وتحديث التدبير الجماعي	32.6	

البرنامج	رمز المشروع	اسم المشروع	موقع المشروع	العقار (مليون درهم)	الأشغال (مليون درهم)	المجموع (مليون درهم)	الكلفة للفترة 2021-2018	الكلفة للفترة 2023-2022	تقدم المشروع	التصديق على الاتفاقية تسوية العقار	القيام بالدراسات التقنية	إنجاز الأشغال	نسبة الانجاز %
	33.6	تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة	إعداد أدوات ووسائل التواصل	الجماعة	-	3	3	2	تم انجاز الهوية البصرية ومجموعة من وسائط التواصل	-	10	40	50
	34.6	تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة	مشروع الخميس التنشوري	الجماعة	-	2	2	1	مشروع منجز	10	40	50	100
	35.6	تعزيز التشاور والتواصل والتعاون والشراكة	تعزيز التعاون مع المدن الوطنية و الدولية	الجماعة	-	2	2	1	عقد لقاء جهوي و وطني	-	-	-	60

خلاصة تقدم تنفيذ مشاريع برنامج عمل جماعة سلا 2018 - 2023

6م	5م	4م	3م	2م	1م	
12	1	18	4	8	20	المنجزة
8	0	14	2	24	14	في طور الإنجاز
7	0	6	9	3	10	في طور الدراسة
8	10	113	20	18	68	في طور الترافع
0	0	1	0	1	2	الملغاة
35	11	152	35	54	114	مجموع مشاريع المحور



مقارنة بين نسب الإنجاز حسب محاور برنامج عمل جماعة سلا 2018 - 2023

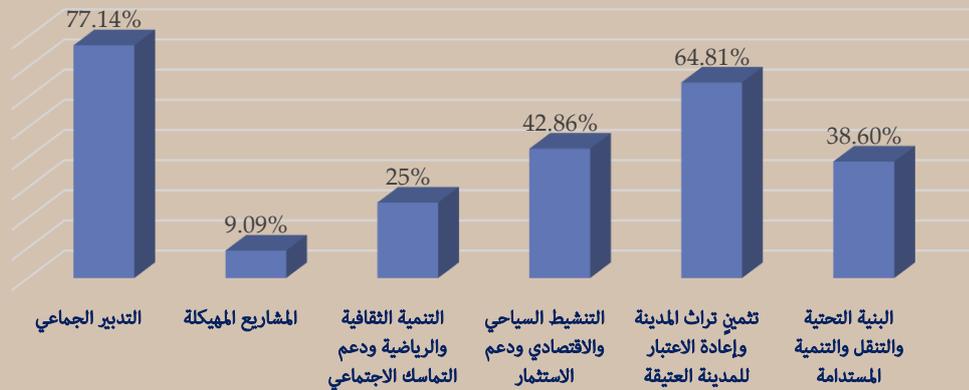

الحصيلة النهائية:

%	المجموع	وضعية المشاريع
15,71	63	المنجزة
15,46	62	في طور الإنجاز
8,73	35	في طور الدراسة
59,10	237	في طور الترافع
1,00	4	الملغاة
100	401	مجموع مشاريع المحور

النسب المئوية لتقدم تنفيذ مشاريع برنامج عمل جماعة سلا 2018-2023 برسم سنة 2022

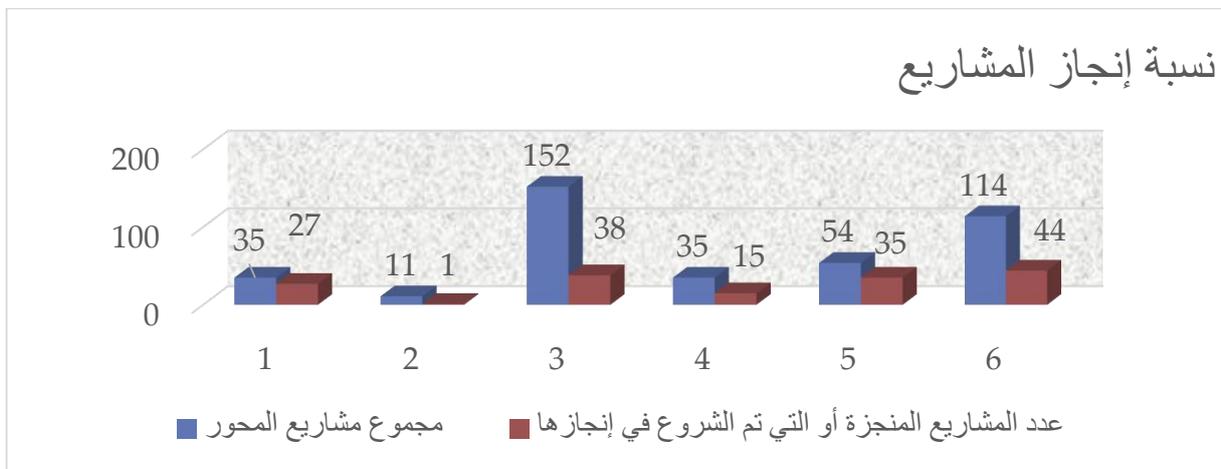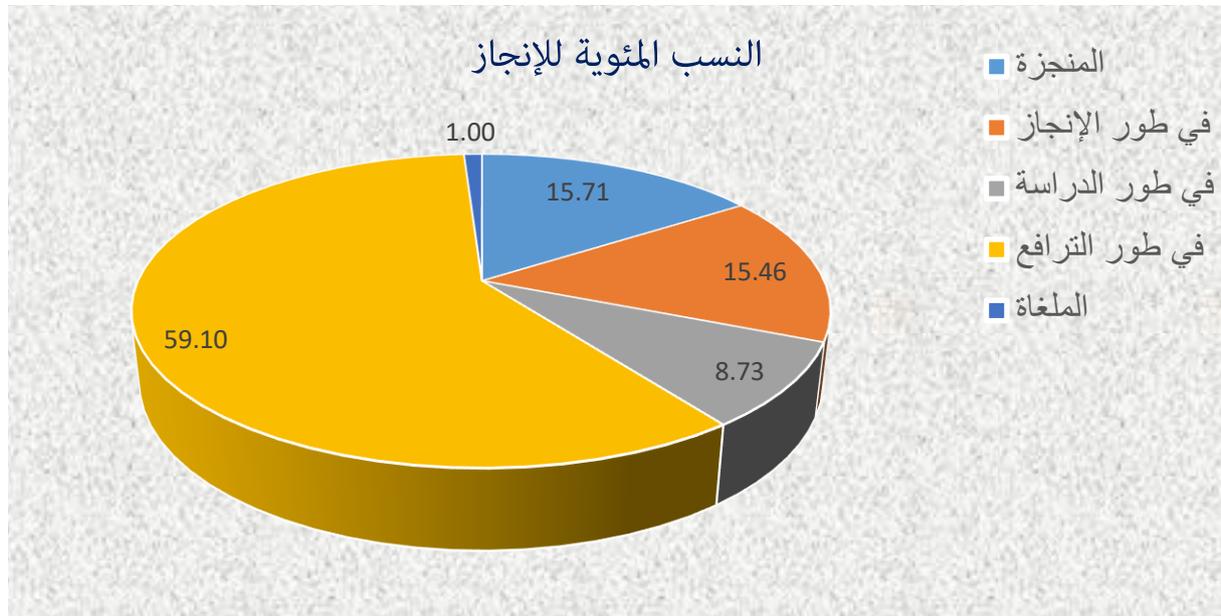

نسبة إنجاز المشاريع

حرصت جماعة سلا على تعبئة وتحويل الموارد المالية اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج وفق إمكانياتها واستحضار وضعيتها المالية حيث:

قامت بتحويل مبلغ مساهمتها المقررة برسم سنة 2022 في اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة والمقدرة ب 37 مليون درهم، كما عملت على إنجاز المشاريع الذاتية المبرمجة لهذه السنة،

وقامت بتحويل أكثر من 2 مليون درهم لاقتناء الفنادق بالمدينة العتيقة بالإضافة إلى 2 مليون درهم بنايات بالمدينة العتيقة والمدرجة في برنامج عملها قصد ترميمها وإصلاحها أو إعادة تهيئتها وتحويلها لفضاءات للتنشيط الثقافي والفني وإبراز الموروث التاريخي للمدينة.

وخصصت الجماعة اعتمادا ماليا قدره 350 000,00 درهم للشروع في الدراسات والمساعدة التقنية واعتماد بقيمة 6 661 602,00 درهم لتهيئة المكتب الجماعي لحفظ الصحة،

وفي إطار حرصها على تدبير أمثل لمرفق المقابر، برمجت الجماعة 8 316 866,37 درهم لاقتناء أراضي والقيام بالدراسات اللازمة لذلك تلبية للحاجة الماسة للمدينة لتوفير مقابر جديدة لتأمين دفن الموتى.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة أبرمت اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات المحلية لتدبير المقابر الحالية بما قدره 2 300 000,00 درهم.

وفي إطار اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة سلا لبناء مركز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سلا، قامت الجماعة بتحويل اعتماد قدره 1 مليون درهم في إطار مساهمتها لسنة 2022 لإنجاز المشروع؛

كما قامت الجماعة بتحويل في إطار مساهمتها في مشروع بناء وتجهيز معهد التنشيط الفني والثقافي - تابريكت ما قدره 4 مليون درهم؛

واعتمادا ماليا قدره 4 مليون درهم لمشروع حماية وتقييم وتهيئة الغابة الحضرية عين الحوالة بمدينة سلا (الشرط الأول)، والمشروعان تتولى إنجازهما شركة الرباط الجهة للتهيئة.

وفي إطار تنفيذ مشروع تهيئة الطريق الإقليمية رقم 4033 بين الطريق الوطنية رقم 6 وشارع ابن الهيثم، تم تحويل مبلغ 13 500 000,00 درهم إلى شركة الرباط الجهة للتهيئة وكذا مبلغ 6 000 000,00 درهم إلى شركة ريزال؛

كما تم تحويل مبلغ 22 000 000,00 درهم إلى شركة الرباط الجهة للتهيئة في إطار مشروع إحداث المجازر الجديدة على التوالي.

عنوان البند	الالتزام المعبأ برسم سنة 2022	الاعتماد المتوفر النهائي
اقتناء أراضي لتوسعة شارع الزربية	49000000,00	49000000,00
اقتناء الفنادق بالمدينة العتيقة	2060000,00	2060000,00
اقتناء الفنادق بالمدينة العتيقة	2000000,00	2000000,00
الدراسات و المساعدة التقنية (المكتب البلدي لحفظ الصحة)	1100000,00	1100000,00
تهيئة المكتب البلدي لحفظ الصحة	6661602,00	6661602,00
اقتناء و تهيئة اراضي المقابر بما فيها مصاريف الدراسة و التتبع	8 316 866,37	8 316 866,37
بناء مقرات ادارية و انجاز الاشغال الكبرى لتهيئة و تجهيز البنايات الادارية مع مصاريف الدراسة و تتبع الاشغال	16818458,33	16818458,33
برنامج تأهيل و تثمين المدينة العتيقة بسلا	37000000,00	37000000,00
تهيئة الطريق الإقليمي رقم 4033 بين الطريق الوطني رقم 6 وشارع ابن الهيثم؛	19500000,00	19500000,00
بناء و تجهيز معهد التنشيط الفني و الثقافي - تابريكت سلا	4000000,00	4000000,00
إحداث المجازر الجديدة لعمالتي الرباط وسلا؛	22000000,00	22000000,00
اتفاقية شراكة تتعلق بحماية و تقييم و تهيئة الغابة الحضرية عين الحوالة بمدينة سلا 2020-2022 (الشطر الاول)	4000000,00	4000000,00
بناء مركز تأهيل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سلا جهة الرباط سلا القنيطرة	1 000 000,00	1 000 000,00
اقتناء سيارات ودرجات نارية وآليات	7246931,00	7246931,00
اقتناء تجهيزات مكتبية وسمعية بصرية	2850911,00	2850911,00
اقتناء و تثبيت العتاد والشبكات المعلوماتية	3226818,00	3226818,00
برنامج مندمج (عتاد تنظيم ورقمنة الأرشيف)	2000000,00	2000000,00
تثبيت نظام المعلومات الجغرافي لجماعة سلا	2000000,00	2000000,00
المجموع	190781586,70	190781586,70

الإكراهات:

تعتبر عملية تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة جزءاً لا يتجزأ من المسطرة المنصوص عليها في اعتماد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتعيينه وتقييمه، إذ يسمح التتبع والتقييم بالحكم على تقدم إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، والتحقق من مدى الوصول إلى النتائج والأهداف المتوقعة، والقيام بالتعيين اللازم قصد ملائمة الموارد المتوفرة مع المشاريع المدرجة لبلوغ الأهداف المتوخاة.

كما أن تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة يهدف إلى رصد الإكراهات التي تعيق أو تؤخر تنفيذ المشاريع من جوانب متعددة مالية وإدارية وتقنية، واتخاذ القرارات المتعلقة بكل مشروع في طور الإنجاز أو لم ينطلق بعد، إما بإعادة تقويم الموارد أو مراجعة محتوى المشروع.

وخلال تتبع تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا لسنة 2022 رصدت مجموعة من الإكراهات التي حالت دون السير العادي للمشاريع المدرجة، والتي يمكن التمييز فيها بين الذاتية والموضوعية، ولعل أهمها:

■ أثر الإكراهات الذاتية السابقة التي تم رصدها برسم السنوات 2019، 2020 و2021 في تنفيذ مشاريع برنامج عمل جماعة سلا 2018-2023.

■ بالإضافة إلى ضعف تعبئة الموارد المالية والانشغال بإعداد برنامج عمل جماعة سلا الجديد 2022 - 2028،

■ في حين أن 60 مشروعا ضمن برنامج عمل جماعة سلا 2018-2023 أي نسبة 15% تقريبا هي مشاريع متعلقة من حيث الإنجاز بالمصالح الخارجية بشكل تام (المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية).

■ بالإضافة إلى مشكل تعبئة العقار بسبب تعقد مسطرة تسوية العقار في العديد من المشاريع وتكلفته المرتفعة.


إذا اعتبرنا أن نقط الضعف تتمثل في الإكراهات الذاتية وكذا الموضوعية فإن تقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا 2018-2023 قد أبان على نقط أخرى يمكن وصفها بنقط القوة وهي كالتالي:

■ رغم الإكراهات الذاتية والموضوعية سالفة الذكر، فإن حصيلة نهائية لتنفيذ مشاريع برنامج عمل جماعة سلا 2018-2023 قد وصلت إلى 39.90 بالمئة من المشاريع المنجزة، أو التي تم الشروع في إنجازها، والتي يمكن أن تصل إلى 41.64 بالمئة إذا تم إهمال نسب تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمصالح اللامركزية للإدارة المركزية ونعني هنا بشكل مباشر (مشاريع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ومشاريع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية).

■ وفي إطار الاستمرارية في أداء الجماعة، قام المجلس الحالي بالسهر على تتمة إنجاز مجموعة من المشاريع التي كانت في طور الإنجاز، بل أكثر من هذا قام ببرمجة مجموعة من المشاريع التي لم يكن بالإمكان إنجازها خلال الولاية السابقة والمتضمنة في برنامج عمل جماعة سلا 2018-2023 بسبب بعض الإكراهات المذكورة سابقا، وتمت إعادة برمجتها في برنامج عمل جماعة سلا 2022-

2028

عمر السنتيوي
رئيس جماعة سلا





جماعة سلا
toX0oUt | 0oHo
COMMUNE DE SALÉ



www.villedesale.ma



Facebook/جماعة سلا
